

ABRIL 2025

Seguimiento de inversiones

REPORTE N° 8



PREMIO 2025
BUENAS PRÁCTICAS
EN GESTIÓN PÚBLICA

*Inversiones para la mejora
del bienestar de los usuarios*

 **Sunass**
El regulador del agua potable

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES N°8

Presidente Ejecutivo de la Sunass:
Mauro Gutiérrez Martínez

Gerente General:
Manuel Fernando Muñoz Quiroz

Documento elaborado por la Dirección de Regulación Económica de la Sunass

Revisado por:

Sandro Alejandro Huamaní Antonio
Director de la Dirección de Regulación Económica

Rogelio Rivas Gutierrez
Subdirector de la Subdirección de Regulación Tarifaria

Juan Carlos Loayza Quispe
Subdirector de la Subdirección de Determinación de Estructura de Mercado

Equipo de trabajo:

Equipo de la Subdirección de Regulación Tarifaria

Heber Baldeón Paucar
José Carlos Ricci Rojas
Norma Rotta Arcos

Equipo de la Subdirección de Determinación de Estructura de Mercado

Reinaldo Aguilar Pinares
Miuler Blas Benites
William Cahuana Espinoza
Paulo Delgado Novoa
Miluska Gómez Alvarado
Jennifer Mescoco Pumayalli
Rosana Ricapa Navarro
Julio Rosas Reyna
Yuli Yupanqui Quispe

Editado por:

© Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass
Avenida Bernardo Monteagudo 210-216 Magdalena, Lima - Perú
<https://www.gob.pe/sunass>

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	9
2.	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	11
3.	CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS.....	15
3.1	Clasificación de las empresas prestadoras en la ejecución de inversiones	15
3.2	Calificación del desempeño de las empresas prestadoras en la ejecución de inversiones	18
4.	EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS INVERSIONES TOTALES 2016-2025	23
4.1.	Inversiones totales de Sedapal	23
4.2.	Inversiones totales de las empresas prestadoras (sin Sedapal)	25
4.3.	Inversiones totales de las empresas prestadoras según tamaño	27
5.	EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES TOTALES EN EL 2025.....	33
5.1	Sedapal.....	33
5.2	Empresas Prestadoras Grandes 1	34
5.3	Empresas Prestadoras Grandes 2	35
5.4	Empresas Prestadoras Medianas.....	37
5.5	Empresas Prestadoras Pequeñas.....	39
6.	EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL ESTUDIO TARIFARIO EN EL 2025.....	42
6.1	Sedapal.....	42
6.2	Empresas Prestadoras Grandes 1	50
6.3	Empresas Prestadoras Grandes 2	69
6.4	Empresas Prestadoras Medianas.....	102
6.5	Empresas Prestadoras Pequeñas.....	135
7.	CONCLUSIONES.....	167
8.	ANEXOS.....	170
8.1	Metodología para la calificación de las empresas prestadoras	170
8.2	Tablas detalladas sobre la programación y ejecución Inversiones Totales por empresa con datos del Sistema de Contabilidad Regulatoria.....	172

Índice de Gráficos

GRÁFICO 1. NIVELES DE ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	13
GRÁFICO 2. CLASIFICADOR DE EMPRESAS PRESTADORAS	15
GRÁFICO 3. CLASIFICADOR DE EMPRESAS GRANDES (G1) Y SEDAPAL S.A.	16
GRÁFICO 4. CLASIFICADOR DE EMPRESAS GRANDES (G2)	16
GRÁFICO 5. CLASIFICADOR DE EMPRESAS MEDIANAS (M)	17
GRÁFICO 6. CLASIFICADOR DE EMPRESAS PEQUEÑAS (P)	17
GRÁFICO 7. CANTIDAD DE EMPRESAS PRESTADORAS SEGÚN ESCENARIO	18
GRÁFICO 8. CANTIDAD DE EMPRESAS PRESTADORAS SEGÚN ESCENARIO	21
GRÁFICO 9. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (FBK) DE SEDAPAL: PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	24
GRÁFICO 10. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (FBK) DE SEDAPAL: PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA	24
GRÁFICO 11. EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE SEDAPAL.....	25
GRÁFICO 12. EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE SEDAPAL SIN RPI Y RINCONADA.....	25
GRÁFICO 13. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS:	26
GRÁFICO 14. NIVEL DE EJECUCIÓN AGREGADO DE INVERSIONES DE EMPRESAS DE SANEAMIENTO.....	26
GRÁFICO 15. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 1 (G1)	27
GRÁFICO 16. NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LAS EMPRESAS GRANDES 1 (G1).....	27
GRÁFICO 17. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 2 (G2)	28
GRÁFICO 18. NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LAS EMPRESAS GRANDES 2 (G2).....	28
GRÁFICO 19. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS MEDIANAS (M)	29
GRÁFICO 20. EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LAS EMPRESAS MEDIANAS (M).....	29
GRÁFICO 21. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS (P)	30
GRÁFICO 22. NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS (P)	30
GRÁFICO 23. PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA	31
GRÁFICO 24. NÚMERO DE INVERSIONES (FBK) REPORTADAS POR SEDAPAL.....	34
GRÁFICO 25. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS EMPRESAS GRANDES 1 (G1)	35
GRÁFICO 26. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS EMPRESAS GRANDES 2 (G2)	36
GRÁFICO 27. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS (M)	38
GRÁFICO 28. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS EMPRESAS PEQUEÑAS (M).....	39
GRÁFICO 29. SEDAPAL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	43
GRÁFICO 30. SEDAPAR - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	50
GRÁFICO 31. EPS GRAU - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	56
GRÁFICO 32. SEDALIB - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	59
GRÁFICO 33. EPSEL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	63
GRÁFICO 34. EPS TACNA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	64
GRÁFICO 35. SEDACUSCO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	66
GRÁFICO 36. EPS SAN MARTIN - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	70
GRÁFICO 37. SEDALORETO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	73
GRÁFICO 38. SEDACHIMBOTE - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	75
GRÁFICO 39. SEDA AYACUCHO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	79
GRÁFICO 40. SEDACAJ - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	81
GRÁFICO 41. EMAPA CAÑETE - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	83
GRÁFICO 42. EMAPICA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	85
GRÁFICO 43. SEMAPACH - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	88
GRÁFICO 44. SEDA HUANUCO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	91
GRÁFICO 45. EMSAPUNO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	93
GRÁFICO 46. AGUA TUMBES - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	95
GRÁFICO 47. SEDA JULIACA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	97
GRÁFICO 48. SEDAMHUANCAYO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	99
GRÁFICO 49. EPS BARRANCA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	103
GRÁFICO 50. EPS MOYOBAMBA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	105
GRÁFICO 51. EMAPA HUARAL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	107
GRÁFICO 52. EMUSAP ABANCAY - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	109
GRÁFICO 53. EPS ILO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	111
GRÁFICO 54. EPS MOQUEGUA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	113
GRÁFICO 55. EMPSSAPAL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	115

GRÁFICO 56. EPS MANTARO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	117
GRÁFICO 57. EPS MARAÑON - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	120
GRÁFICO 58. EMAPISCO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	122
GRÁFICO 59. EMAPAT - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	124
GRÁFICO 60. EMAPACOP - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	127
GRÁFICO 61. AGUAS DE LIMA NORTE - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	129
GRÁFICO 62. EPS SELVA CENTRAL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	131
GRÁFICO 63. EPS CHAVIN - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	133
GRÁFICO 64. EMUSAP - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	136
GRÁFICO 65. EMSAPA YAULI LA OROYA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	138
GRÁFICO 66. EPS RIOJA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	140
GRÁFICO 67. EMAPAB - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	142
GRÁFICO 68. EPS SIERRA CENTRAL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	144
GRÁFICO 69. EMSAPA CALCA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	146
GRÁFICO 70. EPSSMU - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	148
GRÁFICO 71. EMAPAVIGS - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	150
GRÁFICO 72. EMAQ - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	152
GRÁFICO 73. EPS HUANCANELICA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	154
GRÁFICO 74. EMAPA PASCO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	156
GRÁFICO 75. EMSAP CHANKA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	158
GRÁFICO 76. EPS AGUAS DEL ALTIPLANO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	160
GRÁFICO 77. EMAPA Y - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	162
GRÁFICO 78. EPS NOR PUNO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET	164

Índice de Tablas

TABLA 1. LISTADO DE RESOLUCIONES DE REVISIÓN PERIÓDICA	11
TABLA 2. LISTADO DE RESOLUCIONES DE REVISIÓN EXCEPCIONAL.....	12
TABLA 3. CANTIDAD DE EMPRESAS PRESTADORAS SEGÚN ESCENARIO	18
TABLA 4. UMBRALES PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	18
TABLA 5. CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS.....	19
TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	20
TABLA 7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIONES (FBK) DE SEDAPAL	33
TABLA 8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 1 (G1).....	34
TABLA 9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 1 (G1).....	35
TABLA 10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 2 (G2).....	36
TABLA 11. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 2 (G2).....	37
TABLA 12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS MEDIANAS (M)	37
TABLA 13. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS MEDIANAS (M)	38
TABLA 14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS (P)	39
TABLA 15. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS (P)	40
TABLA 16. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE SEDAPAL S.A.....	49
TABLA 17. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE SEDAPAR S.A.	53
TABLA 18. MATRIZ DE RIESGOS EN INVERSIONES ANALIZADO POR SEDAPAR S.A.	54
TABLA 19. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE GRAU S.A.....	58
TABLA 20. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE SEDALIB S.A.	61
TABLA 21. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE TACNA S.A.,.....	65
TABLA 22. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE SEDACUSCO S.A.....	68
TABLA 23. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SAN MARTÍN S.A.	72
TABLA 24. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SEDACHIMBOTE S.A.,.....	78
TABLA 25. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SEDA AYACUCHO S.A.,.....	80
TABLA 26. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SEDACAJ S.A., ...	82
TABLA 27. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS EMAPICA S.A., ...	87
TABLA 28. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SEMAPACH S.A.	89
TABLA 29. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SEDAM HUANCAYO S.A., ...	102
TABLA 30. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS EMUSAP ABANCAY S.A.,.....	110
TABLA 31. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS ILO S.A.,.....	112
TABLA 32. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS MOQUEGUA S.A.,.....	114
TABLA 33. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS MANTARO S.A.....	119
TABLA 34. UMBRALES DEL CLASIFICADOR DE EMPRESAS PRESTADORAS	170
TABLA 35. CÁLCULO DEL SCORE DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS	171

Índice de Imágenes

IMAGEN 1. ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE POR SEDAPAL	44
IMAGEN 2. PROYECTO COLLIQUE EN ZONAS DE COMAS Y CARABAYLLO EJECUADO POR SEDAPAL	44
IMAGEN 3. PTAR PACHACUTEC EJECUTADO POR SEDAPAL	45
IMAGEN 4. CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE BOMBEO EN EL PROYECTO NUEVA RINCONADA DE SEDAPAL	47
IMAGEN 5. CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN EL PROYECTO NUEVA RINCONADA DE SEDAPAL	47
IMAGEN 6. LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y REDES EN EL PROYECTO NUEVA RINCONADA DE SEDAPAL	48
IMAGEN 7. COLECTORES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL PROYECTO NUEVA RINCONADA DE SEDAPAL	48
IMAGEN 8. PLANO DE SECTORIZACIÓN EN EL PROYECTO SOCABAYA, SABANDIA Y CHARACATO DE SEDAPAR	51
IMAGEN 9. PLANO DE INTERVENCIÓN EN SOCABAYA EJECUTADO POR SEDAPAR	52
IMAGEN 10. PTAP PIURAY EJECUTADO POR SEDACUSCO	67
IMAGEN 11. LÍNEA DE INTERCONEXIÓN SISTEMA VILCANOTA EJECUTADO POR SEDACUSCO	68
IMAGEN 12. CREACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO TUBULAR N°4 AL RESERVORIO R-IV DE SEDACHIMBOTE	76
IMAGEN 13. POZO TUBULAR DE SEDACHIMBOTE	77
IMAGEN 14. CÁMARAS DE BOMBEO EN UE AGUA TUMBES	96
IMAGEN 15. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) POR SEDAM HUANCAYO	100
IMAGEN 16. CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO SEDAM HUANCAYO	101
IMAGEN 17. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN SEDAM HUANCAYO	101
IMAGEN 18. INSTALACIÓN DE GRIFOS CONTRA INCENDIO EN EPS PASCO	157
IMAGEN 19. RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE EPS CHANKA	159



1. INTRODUCCIÓN

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) presenta el Reporte de Seguimiento de Inversiones con información actualizada a diciembre de 2025. Este documento tiene como objetivo principal informar, de manera clara y transparente, cómo avanzan las inversiones que realizan las empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas del país.

Estas inversiones son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, ampliar la cobertura y garantizar que los servicios de agua y saneamiento sean sostenibles en el tiempo. Para lograrlo, es necesario vigilar de cerca cómo se está utilizando el presupuesto destinado a estos fines, y asegurar que se cumpla con lo establecido en los estudios tarifarios aprobados por la Sunass.

El informe analiza dos aspectos clave:

- La **ejecución de Inversiones Totales**, es decir, inversiones financiadas por todas las fuentes de financiamiento, que incluyen recursos propios de las empresas (recursos directamente recaudados), transferencias del Estado (recursos ordinarios) y créditos oficiales; y,
- La **ejecución del Programa de Inversión del Estudio Tarifario**, financiados con el Fondo de inversiones (es decir, recursos directamente recaudados). El Programa de inversiones contiene Proyectos de inversión y gasto en capital no ligado a proyectos; así como actividades y medidas de mejora definidos en el Estudio Tarifario de cada empresa prestadora.

Este seguimiento es especialmente importante porque nuestro país enfrenta una gran brecha en infraestructura de saneamiento. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) estimó en el 2025 que, se necesitan S/138 mil millones en inversiones durante los próximos 30 años para cerrar las brechas en agua potable y saneamiento, lo que requeriría un presupuesto aproximado de S/12.3 mil millones anuales.

Por ello, este reporte también busca resaltar la urgencia de impulsar inversiones estratégicas que contribuyan a cerrar estas brechas y a asegurar servicios de calidad para todos los ciudadanos, en concordancia con las normas vigentes.

El informe está dividido en cuatro secciones principales: i) Clasificación y calificación de las empresas prestadoras, ii) Ejecución total de inversiones por empresa, por todas las fuentes de financiamiento (al 31 de diciembre de 2025), iii) Ejecución de las inversiones definidas en los estudios tarifarios, financiadas por el Fondo de inversiones, y iv) Conclusiones y recomendaciones.

Cada una de estas partes ofrece información clave sobre cómo se están gestionando las inversiones, qué tan alineadas están con los planes establecidos, y qué mejoras se pueden implementar para hacer un mejor uso de los recursos disponibles.

En ese sentido, este reporte es una herramienta de transparencia que busca acercar a la ciudadanía al proceso de mejora de los servicios de agua y saneamiento, mostrando cómo se invierte en obras que impactan directamente en su calidad de vida.

Finalmente, es importante mencionar que los montos y porcentajes de avance en ejecución presentadas podrían actualizarse durante el proceso de fiscalización que realiza la Sunass, como parte de su labor de supervisión.



2. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

OBJETIVO:

Brindar información a las empresas prestadoras, instituciones públicas y ciudadanía en general, sobre la ejecución presupuestal de las inversiones dentro del ámbito de responsabilidad de las empresas prestadoras, por diferentes tipos de financiamiento y en el marco de los estudios tarifarios.

INFORMACIÓN REPORTADA:

El presente documento reporta lo siguiente:

- Información presupuestal correspondiente al monto total de las inversiones programadas y ejecutadas durante el año 2025 por las empresas prestadoras, financiadas con recursos provenientes de todas las fuentes de financiamiento.
- Información sobre el monto de las inversiones programadas y ejecutadas previstas en el estudio tarifario de las empresas prestadoras, desde el inicio del periodo regulatorio a diciembre del 2025.
- Información sobre el avance en la ejecución presupuestal de las inversiones programadas para el 2025.
- Clasificación y calificación del desempeño de las empresas prestadoras, en función del nivel de programación y del grado de ejecución de sus inversiones.

FUENTE DE INFORMACIÓN:

El presente reporte se construye en base a la siguiente información:

- a. Estudios tarifarios e informes de revisiones tarifarias
 - i. Programa de inversiones detallado en los estudios tarifarios aprobados

TABLA 1. LISTADO DE RESOLUCIONES DE REVISIÓN PERIÓDICA

Nro.	Empresa prestadora	Resolución de aprobación
1	EMUSAP ABANCAY	RCD N°046-2019-SUNASS-CD
2	EPS SEDACUSCO S.A.	RCD N°052-2019-SUNASS-CD
3	EMUSAP S.A.	RCD N°043-2021-SUNASS-CD
4	EPS MOYOBAMBA S.A.	RCD N°044-2021-SUNASS-CD
5	SEDAPAR S.A.	RCD N°045-2021-SUNASS-CD
6	SEDALIB S.A.	RCD N°065-2021-SUNASS-CD
7	EPS GRAU S.A.	RCD N°071-2021-SUNASS-CD
8	SEDA AYACUCHO S.A.	RCD N°077-2021-SUNASS-CD
9	EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.	RCD N°078-2021-SUNASS-CD
10	SEDAPAL S.A.	RCD N°079-2021-SUNASS-CD
11	SEDALORETO S.A.	RCD N°102-2022-SUNASS-CD
12	EPS RIOJA S.A.	RCD N°107-2022-SUNASS-CD
13	EMSAP CHANKA S.A.	RCD N°113-2022-SUNASS-CD
14	EMAPAB S.A.	RCD N°114-2022-SUNASS-CD
15	EMSA PUNO S.A.	RCD N°117-2022-SUNASS-CD
16	UE002 SS TUMBES	RCD N°118-2022-SUNASS-CD
17	EPS EMAPAT S.A.	RCD N°122-2022-SUNASS-CD
18	EPS MOQUEGUA S.A.	RCD N°123-2022-SUNASS-CD
19	EPS SELVA CENTRAL S.A.	RCD N°124-2022-SUNASS-CD
20	EPS CHAVIN S.A.	RCD N°129-2022-SUNASS-CD
21	EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	RCD N°016-2023-SUNASS-CD
22	SEDAM HUANCAYO SA	RCD N°027-2023-SUNASS-CD
23	EMPSSAPAL S.A.	RCD N°033-2023-SUNASS-CD
24	EPSSMU S.A.	RCD N°042-2023-SUNASS-CD
25	SEDACHIMBOTE S.A.	RCD N°044-2023-SUNASS-CD
26	EPS EMAPICA S.A.	RCD N°050-2023-SUNASS-CD
27	EPS MARAÑON S.A.	RCD N°066-2023-SUNASS-CD

28	EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.	RCD N°067-2023-SUNASS-CD
29	EMAPISCO S.A.	RCD N°069-2023-SUNASS-CD
30	SEMAPACH S.A.	RCD N°071-2023-SUNASS-CD
31	EPS TACNA S.A.	RCD N°072-2023-SUNASS-CD
32	EPS EMAQ SRL	RCD N°076-2023-SUNASS-CD
33	EMAPAVIGS S.A.	RCD N°080-2023-SUNASS-CD
34	SEDAJULIACA S.A.	RCD N°027-2024-SUNASS-CD
35	NOR PUNO S.A.	RCD N°029-2024-SUNASS-CD
36	EMAPA HUANCVELICA S.A.	RCD N°034-2024-SUNASS-CD
37	EMAPA Y S.A.	RCD N°040-2024-SUNASS-CD
38	EMAPACOP S.A.	RCD N°041-2024-SUNASS-CD
39	EMAPA CAÑETE S.A.	RCD N°044-2024-SUNASS-CD
40	EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.	RCD N°045-2024-SUNASS-CD
41	AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.	RCD N°046-2024-SUNASS-CD
42	CALCA S.A.	RCD N°049-2024-SUNASS-CD
43	EPSEL	RCD N°063-2024-SUNASS-CD
44	EPS PASCO S.A.	RCD N°076-2024-SUNASS-CD
45	EMAPA SAN MARTIN S.A.	RCD N°077-2024-SUNASS-CD
46	EPS BARRANCA S.A.	RCD N°080-2024-SUNASS-CD
47	EPS SEDACAJ S.A.	RCD N°081-2024-SUNASS-CD
48	EMAPA HUARAL S.A.	RCD N°082-2024-SUNASS-CD
49	EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	RCD N°083-2024-SUNASS-CD
50	EPS ILO S.A.	RCD N°084-2024-SUNASS-CD

ii. Revisiones tarifarias excepcionales

TABLA 2. LISTADO DE RESOLUCIONES DE REVISIÓN EXCEPCIONAL

N°	Empresa prestadora	Resolución de aprobación
1	EPS SEDACUSCO S.A.	RCD N°074-2022-SUNASS-CD
2	EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	RCD N°091-2022-SUNASS-CD
3	EPS GRAU S.A.	RCD N°054-2025-SUNASS-CD
3	EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	RCD N°084-2025-SUNASS-CD

- b. Informaciones solicitadas directamente a las empresas prestadoras a través del Sistema de Contabilidad Regulatoria de la Dirección de Regulación Económica de la Sunass, y en respuesta al Oficio Múltiple N° 0004-2026-SUNASS-DRE:
- i. Reporte regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de inversión
 - ii. Reporte regulatorio 16 Seguimiento de la ejecución física de los proyectos de inversión
- c. Información pública
- i. Cuenta General de la República (MEF)
 - ii. Página Web Sedapal
 - iii. SIAF - Consulta amigable
 - iv. SIAF - Consulta del gasto presupuestal de las entidades de tratamiento empresarial (ETES)
 - v. Sistema de Seguimiento de Inversiones (Invierte.pe)
 - vi. Banco de Inversiones (Invierte.pe)
- d. Comentarios remitidos de las empresas prestadoras sobre la información presentada el séptimo Reporte de Seguimiento de Inversiones, en respuesta al Oficio Múltiple N° 0014-2026-SUNASS-DRE.

Con la información disponible, se realiza una síntesis estadística en serie histórica, correspondiente a la programación y ejecución de las inversiones de las empresas prestadoras, en años móviles y años puntuales, según fuente de financiamiento o región.

NIVELES DE ANALISIS DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES

El Reporte de Seguimiento de inversiones contempla distintos niveles de análisis, considerando tanto la programación presupuestal como la ejecución efectiva de las inversiones.


En el **primer nivel**, se analizará la programación presupuestal y la ejecución de las inversiones totales, financiadas con cargo a todas las fuentes de financiamiento presupuestal, durante los últimos años, a nivel agregado para Sedapal y para el conjunto de las demás empresas prestadoras. Asimismo, se evaluará el comportamiento agregado de las inversiones según el tamaño de las empresas prestadoras.

En un **segundo nivel**, se analizará los Proyectos de inversión totales de cada empresa prestadora de manera individual, financiados con cargo a por todas las fuentes de financiamiento presupuestal, utilizando la información del sistema de Consulta Amigable del Gasto Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES) del Ministerio de Economía y Finanzas.

En un **tercer nivel**, se examinará la programación y ejecución de las inversiones específicamente previstas en el Estudio Tarifario de cada empresa prestadora. Este análisis comprenderá tanto las inversiones ejecutadas por año regulatorio como las inversiones acumuladas al mes de diciembre de 2025, con base en la información remitida de las empresas prestadoras a través del Sistema de Contabilidad Regulatoria.

Finalmente, en un **cuarto nivel**, a efectos de facilitar la comparabilidad entre empresas prestadoras, se efectuará una clasificación y calificación comparativa en función del nivel de consistencia de su programación presupuestal y del grado de eficacia en la ejecución de sus inversiones

GRÁFICO 1. NIVELES DE ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

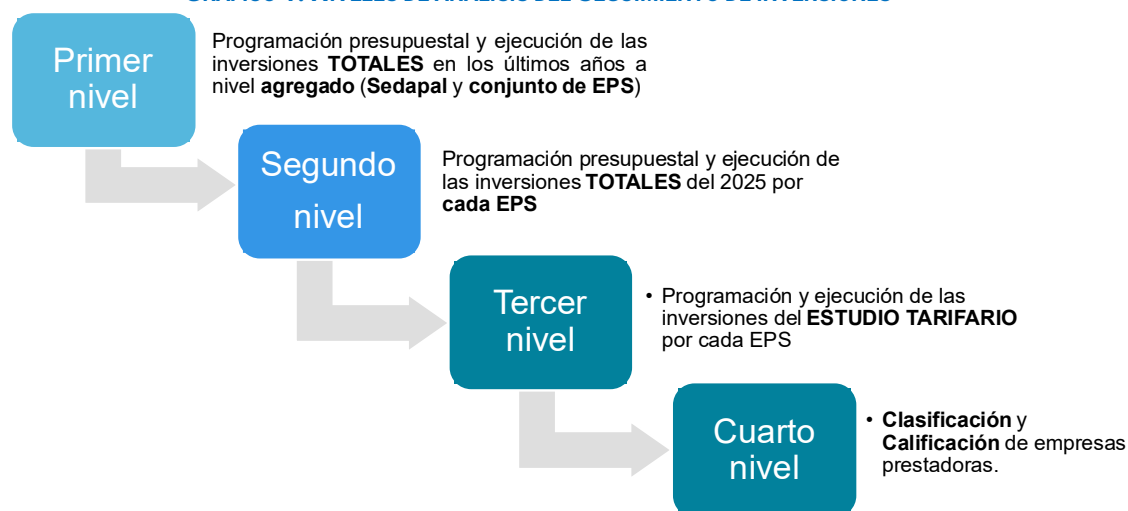



3. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS

3.1 Clasificación de las empresas prestadoras en la ejecución de inversiones


En esta sección, se presenta una clasificación de las empresas prestadoras en función de su nivel de ordenamiento en la programación presupuestal de inversiones y de su eficacia en la ejecución presupuestal, considerando la fase presupuestal de devengado. Asimismo, se evalúa el grado de alineamiento entre la programación de inversiones establecidos en el Estudio Tarifario y su incorporación en la programación presupuestal anual de las empresas prestadoras. Cabe resaltar que, el avance calculado es respecto al equivalente a doce (12) meses (a diciembre de 2025).

Para lograr dicha clasificación, se empleará las siguientes definiciones:

- **Empresa ordenada¹:** es una empresa prestadora que presenta un alto porcentaje del monto de inversiones del estudio tarifario programados en el presupuesto anual del año en curso, respecto del monto programado de inversiones del estudio tarifario del año regulatorio correspondiente, y
- **Empresa eficaz:** es una empresa prestadora que presenta un alto porcentaje del monto de ejecución presupuestal de las inversiones, respecto del monto de inversiones programadas en el presupuesto anual del año en curso, independientemente de la fuente de financiamiento.

Considerado ambas definiciones, se puede clasificar a las empresas prestadoras con la siguiente gráfica:

GRÁFICO 2. CLASIFICADOR DE EMPRESAS PRESTADORAS

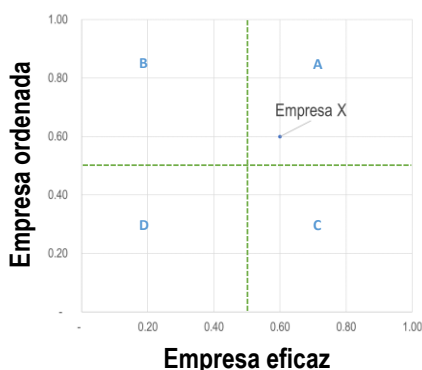

Donde:

- Área A: empresa ordenada y eficaz (**escenario deseado**)
- Área B: empresa ordenada y no eficaz
- Área C: empresa no ordenada y eficaz
- Área D: empresa no ordenada y no eficaz (**escenario no deseado**)

Adicionalmente, se precisa que, las empresas prestadoras que se encuentran en periodo de transición, o empresas que no remitieron información sobre la ejecución de inversiones a través del Sistema de Contabilidad Regulatoria, o que su periodo regulatorio tuviera una vigencia menor a 6 meses no fueron consideradas en esta evaluación de clasificación y calificación.

De esta forma, se presenta la clasificación de las empresas prestadora por tipo según el tamaño:

¹ El presente estudio utiliza en el eje de las empresas ordenadas la razón entre el monto del presupuesto institucional del año en curso, respecto al presupuesto correspondiente al año regulatorio en evaluación. Lo que contrasta con el Reporte de Seguimiento de Inversiones N° 2, donde se utilizó la razón entre el presupuesto institucional correspondiente a proyectos de los estudios tarifarios respecto del total del presupuesto institucional de la empresa prestadora.

GRÁFICO 3. CLASIFICADOR DE EMPRESAS GRANDES (G1) Y SEDAPAL S.A.

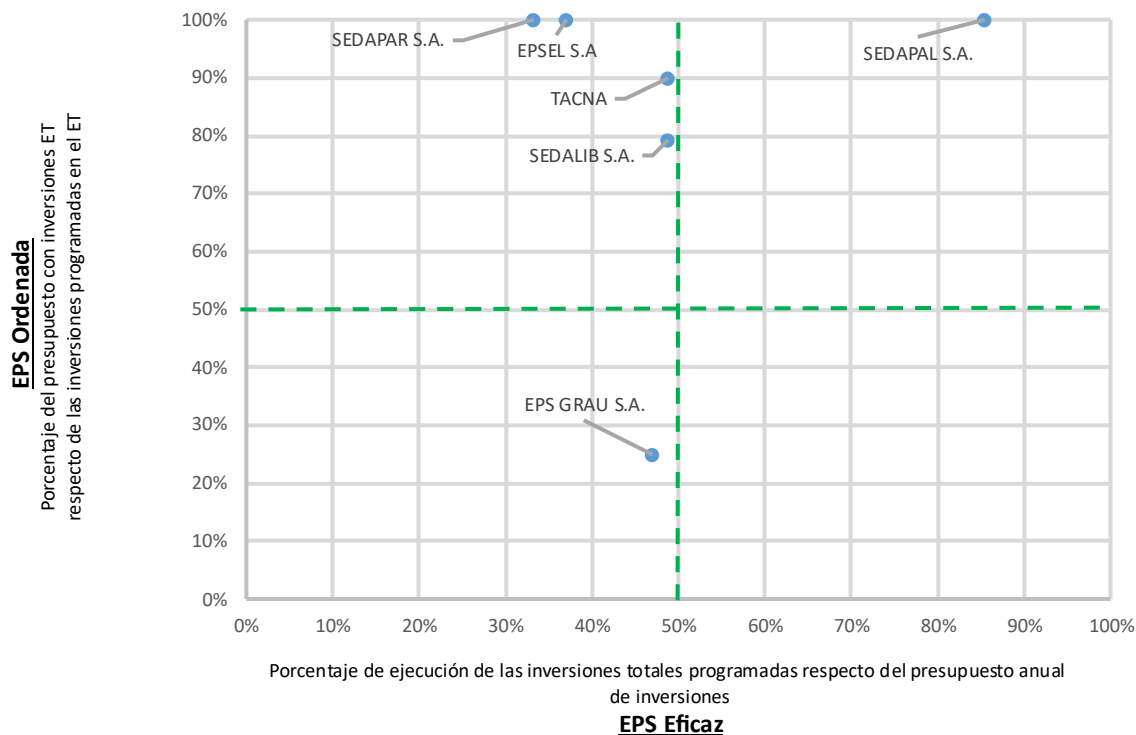


GRÁFICO 4. CLASIFICADOR DE EMPRESAS GRANDES (G2)

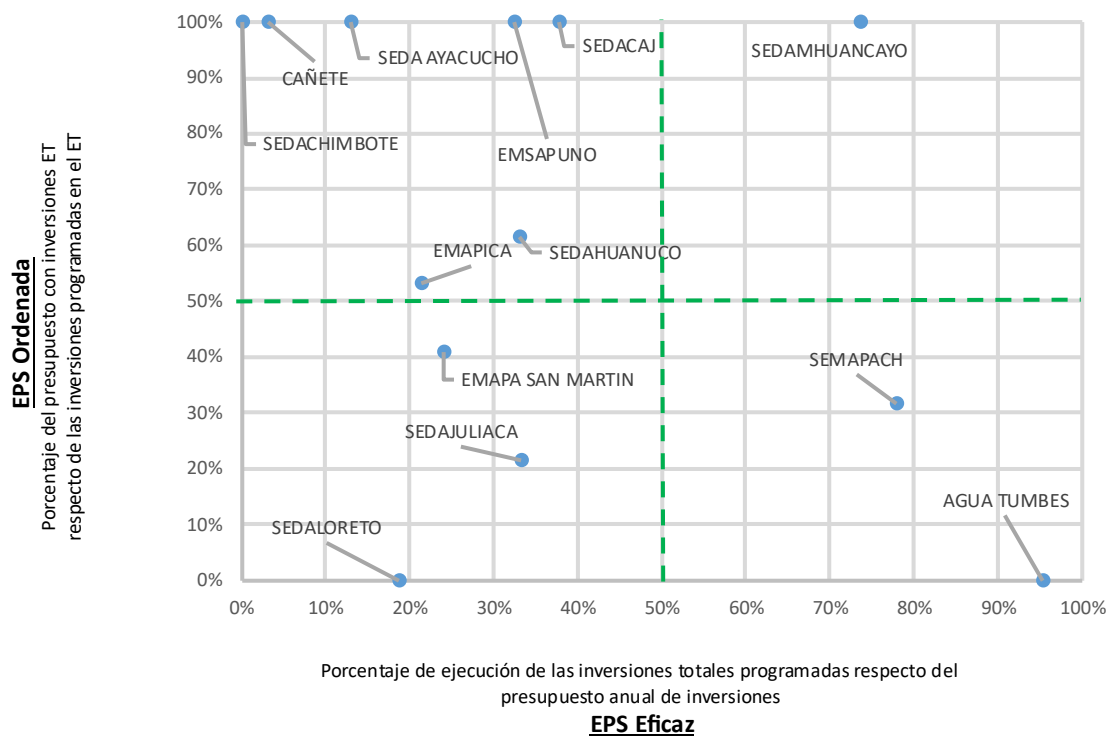


GRÁFICO 5. CLASIFICADOR DE EMPRESAS MEDIANAS (M)


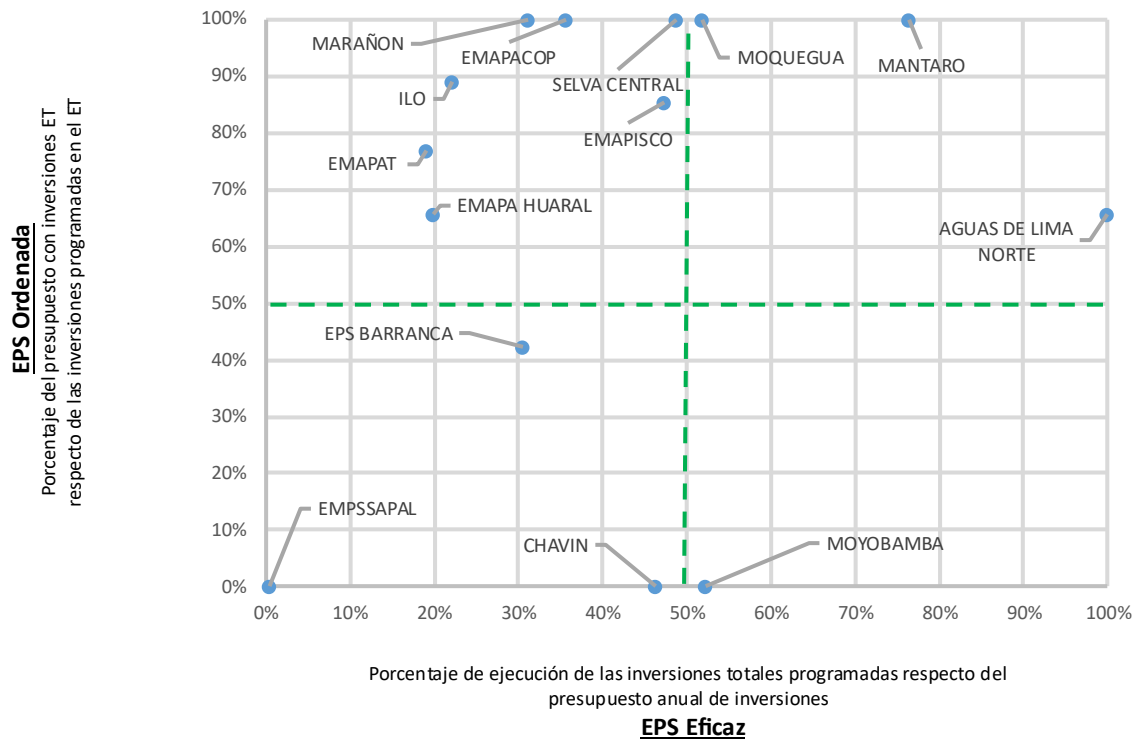


GRÁFICO 6. CLASIFICADOR DE EMPRESAS PEQUEÑAS (P)

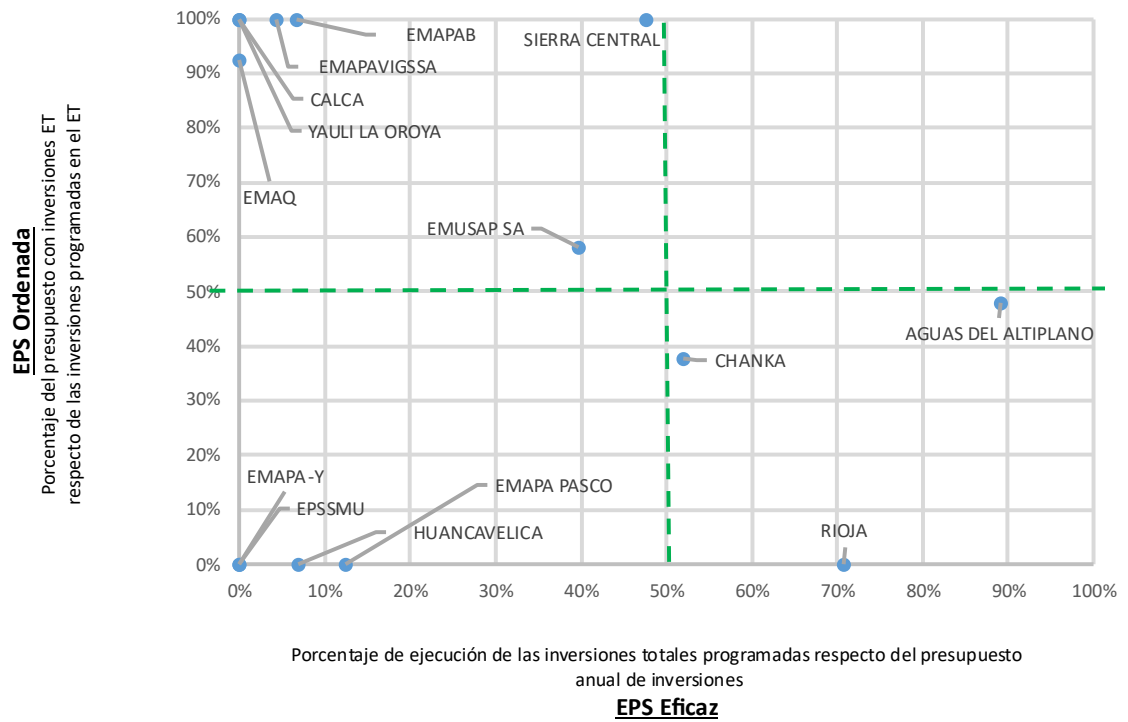


Con respecto a las gráficas anteriores, a diciembre 2025, se observa que cinco (05) empresas alcanzaron el escenario deseado, lo que representa el 10% del total de empresas analizadas. En contraste, once (11) empresas se encuentran en el escenario no deseado, abarcando el 22% del total.

TABLA 3. CANTIDAD DE EMPRESAS PRESTADORAS SEGÚN ESCENARIO

Clasificación	Número de empresas					
	1er Semestre 2023	Año 2023	1er Semestre 2024	Año 2024	1er Semestre 2025	Año 2025
Escenario deseado	3	4	7	5	5	5
Escenario no deseado	22	22	21	16	19	11
Otros escenarios	13	14	13	20	24	32
No evaluados	12	10	9	9	2	2
TOTAL	50	50	50	50	50	50

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA – SUNASS

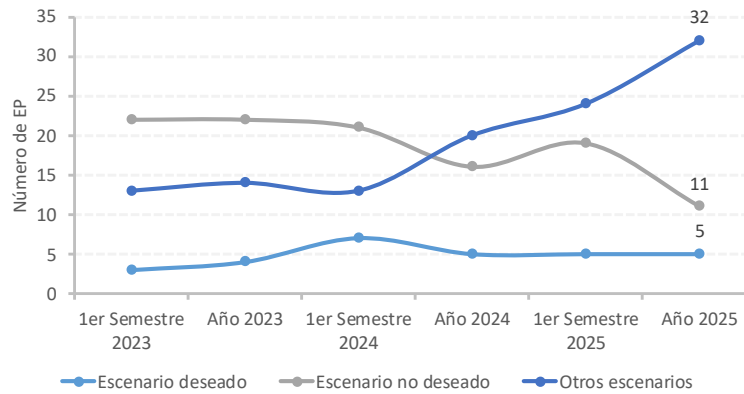GRÁFICO 7. CANTIDAD DE EMPRESAS PRESTADORAS SEGÚN ESCENARIO


Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA – SUNASS

3.2 Calificación del desempeño de las empresas prestadoras en la ejecución de inversiones

Finalmente, considerando: i) el nivel de incorporación, en el presupuesto institucional del 2025 de la empresa prestadora, de las inversiones programadas del Estudio Tarifario (ET) para el año regulatorio correspondiente hasta diciembre de 2025, financiadas con Recursos Directamente Recaudados (RDR), que considera los recursos de los fondos de inversiones de los servicios de saneamiento; y, ii) el nivel de ejecución presupuestal, medido en la fase de devengado, de las inversiones programadas en el año 2025, financiado con cargo a todas las fuentes de financiamiento, se podrá calificar (poner una nota o puntaje) a las empresas prestadoras de la siguiente manera:

TABLA 4. UMBRALES PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS

Clasificación	Score	
	Desde	Hasta
Muy Bueno	[19	20]
Bueno	[16	19 >
Aceptable	[13	16 >
Regular	[10	13 >
Crítico	[0	10 >

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La metodología empleada para calcular los puntajes (score) y los resultados se detalla en el Anexo N° 1 adjunto. En conformidad con esta metodología, se establece que, en el caso de que una empresa prestadora no proporcione la información requerida, su puntaje se asignará como cero.

**TABLA 5. CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS
(CON TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO)**

Nro	Empresa prestadora	Año regulatorio en evaluación	Clasificación (Score) 1er semestre 2023	Clasificación (Score) Anual 2023	Clasificación (Score) 1er semestre 2024	Clasificación (Score) Anual 2024	Clasificación (Score) 1er semestre 2025	Clasificación (Score) Anual 2025
Lima Metropolitana								
1	SEDAPAL S.A.	Año regulatorio 4	16	17	18	15	18	18
Empresas grandes 1								
2	TACNA S.A.	Año regulatorio 2	13	14	13	15	9	13
3	SEDALIB S.A.	Año regulatorio 4	10	9	12 ²	7	12	12
4	SEDACUSCO S.A.	En periodo de transición	9	12	12	16	No evaluado	No evaluado
5	SEDAPAR S.A.	Año regulatorio 4	6	7	6	11	5	13
6	EPS GRAU S.A.	Año regulatorio 4	5	8	2	7	6	7
7	EPSEL S.A.	Año regulatorio 1	7	No evaluado	No evaluado	No evaluado	5 ^{1/}	13
Empresas grandes 2								
8	SEDACAJ S.A.	Año regulatorio 1	18	15	13	13	11	13
9	AGUA TUMBES	Año regulatorio 3	12	6	10	8	10	9
10	SEDA AYACUCHO S.A.	Año regulatorio 4	11	11	10	11	12	11
11	EMAPA SAN MARTIN S.A.	Año regulatorio 1	8	8	5	6	6	6
12	SEMAPACH S.A.	Año regulatorio 2	7	8	12	10	12	10
13	EMAPA CAÑETE S.A.	Año regulatorio 1	6	5	11	10	3	10
14	SEDALORETO S.A.	Año regulatorio 3	4	1	0	0	7	1
15	EMSAPUNO S.A.	Año regulatorio 3	3	7	12	9	11	13
16	SEDAHUANUCO S.A.	Año regulatorio 2	No evaluado	6	2	2	2	9
17	SEDAMHUANCAYO S.A.	Año regulatorio 2	No evaluado	2	1	5	2 ^{1/}	17
18	SEDACHIMBOTE S.A.	Año regulatorio 2	No evaluado	No evaluado	15	14	11	10
19	EMAPICA S.A.	Año regulatorio 2	No evaluado	No evaluado	4	12	7	7
20	SEDAJULIACA S.A.	Año regulatorio 1	No evaluado	No evaluado	No evaluado	No evaluado	1	5
Empresas medianas								
21	EMAPISCO S.A.	Año regulatorio 2	17	16	12	11	10	13
22	EPS ILO S.A.	Año regulatorio 1	13	10	14	14	12	11
23	EPS MOQUEGUA S.A.	Año regulatorio 3	11	2	3	13	14	15
24	EPS CHAVIN S.A.	Año regulatorio 3	7	4	2	4	3	4
25	AGUAS DE LIMA NORTE S.A.	Año regulatorio 1	6	2	13	12	17	16
26	EPS SELVA CENTRAL S.A.	Año regulatorio 3	6	3	0	3	0	14
27	EPS BARRANCA S.A.	Año regulatorio 1	3	3	9	8	7	7
28	EMAPACOP S.A.	Año regulatorio 1	3	3	No evaluado	No evaluado	12	13
29	EPS MOYOBAMBA S.A.	Año regulatorio 4	1	3	1	3	1	5
30	EMUSAP ABANCAY S.A.	En periodo de transición.	1	2	11	9	No evaluado	No evaluado
31	EMAPAT S.A.	Año regulatorio 3	0	11	8	6	2	9
32	EMAPA HUARAL S.A.	Año regulatorio 1	0	2	7	6	10	8
33	EMPSSAPAL S.A.	Año regulatorio 2	No evaluado	No evaluado	0	0	0 ^{b/}	0
34	EPS MANTARO S.A.	Año regulatorio 2	No evaluado	No evaluado	0	10	12	17
35	EPS MARAÑON S.A.	Año regulatorio 2	No evaluado	No evaluado	0	5	11	13
Empresas pequeñas								

² Clasificación actualizada con información vigente a diciembre 2024.

Nro	Empresa prestadora	Año regulatorio en evaluación	Clasificación (Score) 1er semestre 2023	Clasificación (Score) Anual 2023	Clasificación (Score) 1er semestre 2024	Clasificación (Score) Anual 2024	Clasificación (Score) 1er semestre 2025	Clasificación (Score) Anual 2025
36	EMUSAP S.A.	Año regulatorio 4	11	8	20	10	3	9
37	EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.	Año regulatorio 4	10	3	9	10	10	10
38	EMAQ S.A.	Año regulatorio 2	10	10	10	6	10	9
39	EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.	Año regulatorio 1	5	4	No evaluado	No evaluado	1	14
40	EPS CHANKA S.A.	Año regulatorio 3	3	8	2	6	0 ^{b/}	8
41	EMAPAB S.A.	Año regulatorio 3	3	2	0	1	5	10
42	EMAPAVIGS S.A.	Año regulatorio 2	1	1	1	5	5	10
43	EPS RIOJA S.A.	Año regulatorio 3	0	2	0	11	16	7
44	EPS HUANCAMELICA S.A.	Año regulatorio 1	0	14	No evaluado	No evaluado	2	0 ^{c/}
45	EPS CALCA S.A.	Año regulatorio 1	0	0	No evaluado	No evaluado	0 ^{b/}	10
46	EMAPA PASCO S.A.	Año regulatorio 1	0	11	0	10	0 ^{b/}	1
47	EPSSMU S.A.	Año regulatorio 2	No evaluado	10	10	8	0 ^{b/}	0 ^{c/}
48	EMAPA-Y S.R.L.	Año regulatorio 1	No evaluado	No evaluado	No evaluado	No evaluado	0 ^{b/}	0
49	AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.	Año regulatorio 1	No evaluado	No evaluado	No evaluado	No evaluado	0 ^{b/}	13
50	NOR-PUNO S.A.	Año regulatorio 1	No evaluado	No evaluado	No evaluado	No evaluado	10	7

Nota:

a/ Se modificó considerando información presentada por la empresa prestadora de manera ex post al reporte.

b/ No presentó información antes de la fecha de publicación.

c/ No presentó información sobre el presupuesto de las inversiones para el 2025.

Fuente: Estudios tarifarios, informes de revisión tarifaria y Reportes de Contabilidad Regulatoria (Formato 15 y Formato 16)

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

De acuerdo con el cuadro anterior, el promedio de las calificaciones aumentó de 6.8 en 2023 a 9.4 en 2025, lo que se correlaciona con la mayor atención de las empresas en proporcionar información precisa y completa sobre el seguimiento de inversiones, así como en mejorar la transparencia y el cumplimiento de los plazos establecidos.


En el cuadro siguiente, se puede apreciar que **12 empresas prestadoras** se encuentran calificadas por encima de Aceptable, inclusive. El propósito del Reporte de Seguimiento de Inversiones es incrementar el número de empresas prestadoras calificadas como *Aceptable* o *Bueno* o *Muy Bueno*.

TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS

Clasificación	Score		Número de empresas					
	Desde	Hasta	1er Semestre 2023	Anual 2023	1er Semestre 2024	Anual 2024	1er Semestre 2025	Anual 2025
Muy Bueno	[19	20]	0	0	1	0	0	0
Bueno	[16	19 >	3	2	1	1	3	4
Aceptable	[13	16 >	2	3	5	6	1	12
Regular	[10	13 >	7	8	11	12	17	10
Crítico	[0	10 >	26	27	23	22	27	22
No evaluados			12	10	9	9	2	2
TOTAL			50	50	50	50	50	50

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

GRÁFICO 8. CANTIDAD DE EMPRESAS PRESTADORAS SEGÚN ESCENARIO

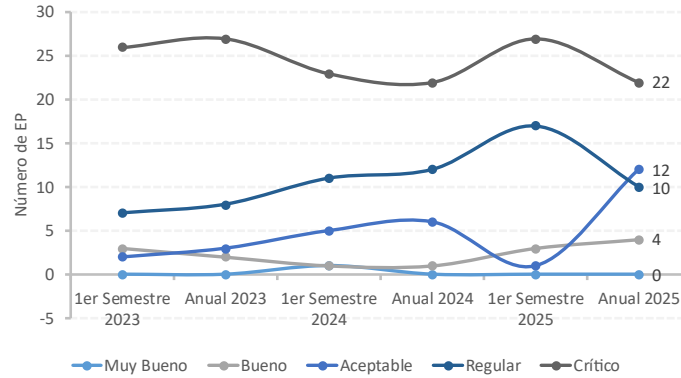

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Si bien la entrada en vigor de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, vigente desde el 22 de abril de 2025, introduce cambios orientados a fortalecer la eficiencia de las contrataciones del Estado mediante una mejor planificación, la evaluación de ofertas bajo el criterio del mejor valor por dinero, así como la promoción de la innovación y la gestión de riesgos, su implementación supone importantes desafíos para las entidades y empresas sujetas a su aplicación al considerarse **más compleja y reglamentaria** que la norma anterior (Ley N° 30225).

En particular, el nuevo marco normativo presenta una estructura regulatoria más amplia y detallada que la prevista en la anterior Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, considerando que su reglamento comprende cerca de 389 artículos. En ese contexto, el proceso de adecuación a las nuevas disposiciones, procedimientos y herramientas de gestión podría generar dificultades operativas durante la etapa de transición.

Por ello, es posible que las empresas prestadoras enfrenten una reducción temporal en los niveles de ejecución de inversiones mientras consolidan la aplicación del nuevo régimen de contrataciones y fortalecen sus capacidades institucionales para su adecuada implementación.

Así, a diciembre de 2025, se observa un ligero incremento en el número de empresas prestadoras calificadas en situación regular y crítica respecto de 2024, aunque dicho nivel es inferior al reportado al primer semestre de 2025. Esta situación evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la capacidad operativa, técnica y de gestión de las empresas prestadoras. A fin de evitar retrasos en la ejecución de proyectos durante este periodo de transición —mientras se actualizan los mecanismos internos, se ajustan los procesos administrativos y se capacita al personal—, **resulta fundamental que las empresas prestadoras; y, en general, todas las entidades públicas, fortalezcan su capacidad en gestión de inversiones** para mantener o mejorar el ritmo de ejecución de inversión, cumplir con las metas previstas y asegurar el uso eficiente de los recursos públicos.

En esa línea, entre junio y julio de 2025, la Sunass realizó cuatro talleres macrorregionales en las ciudades de Cusco, Piura, Pucallpa y Huancayo, en los que se abordaron temas relacionados con la estrategia para el seguimiento de inversiones, los criterios para la formulación del Programa de Inversiones de Largo Plazo, los lineamientos para el uso del Fondo de Inversiones y las modificaciones de los programas de inversiones de los Estudios Tarifarios durante el periodo regulatorio, así como aspectos vinculados con la formulación y evaluación de inversiones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, durante el año 2026, se continuará con el desarrollo de talleres macrorregionales en Ayacucho, Arequipa, Tarapoto y Trujillo; entre otras acciones de asistencia técnica orientadas a fortalecer las capacidades de planificación, programación, seguimiento y ejecución de inversiones de las empresas prestadoras, con el propósito de mejorar el cumplimiento oportuno de las inversiones previstas en los Estudios Tarifarios.



4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS INVERSIONES TOTALES 2016-2025

En el ámbito urbano, la prestación de los servicios de saneamiento se realiza a través de 49 empresas prestadoras y una Unidad Ejecutora de Tumbes (UE Tumbes)³. Estas 50 constituidas con el exclusivo propósito de brindar servicios de saneamiento.

En el **primer nivel**, se analiza la programación presupuestal y la ejecución de las inversiones totales, financiadas con cargo a todas las fuentes de financiamiento presupuestal, durante los últimos años, a nivel agregado para Sedapal y para el conjunto de las demás empresas prestadoras. Asimismo, se evaluará el comportamiento agregado de las inversiones según el tamaño de las empresas prestadoras.

Así, en esta sección, se describe la evolución de las inversiones por parte de las empresas prestadoras dentro del ámbito de responsabilidad, con el exclusivo fin de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento, mediante la obtención de ingresos captados por el pago de las tarifas destinados a cubrir los costos de operación y mantenimiento, e inversiones.

Las inversiones consideradas en esta sección son las ejecutadas por las empresas prestadoras y financiadas con cargo a todas las fuentes de financiamiento, independientemente si dichas inversiones están consideradas en el programa de inversiones del estudio tarifario.

4.1. Inversiones totales de Sedapal

Durante el periodo 2016–2025, Sedapal ejecutó inversiones por un total de **S/ 7,375 millones**, con un promedio anual de **S/ 737 millones** y una ejecución promedio del 91%. Este alto nivel de cumplimiento se impulsó principalmente por los resultados obtenidos en 2023 y 2024, gracias a la ejecución del proyecto Nueva Rinconada y la incorporación los pagos por Remuneración por Inversiones (RPI) vinculados a concesiones. Esta última incorporación responde a cambios en la normativa contable del sector público no financiero.

En los primeros años, la ejecución se mantuvo cercana al presupuesto asignado, aunque en 2019 se registró una ejecución superior a la programada debido a una reclasificación de partidas —por ejemplo, servicios prestados por terceros que pasaron a ser considerados gastos de capital— y a la adquisición de predios para la rehabilitación de plantas de tratamiento de agua potable. Es importante destacar que entre 2016 y 2019 no se incluyó la RPI de los proyectos concesionados, pues inicialmente se contabilizaban como gastos operativos. Cabe señalar que, en el 2020, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia afectó significativamente el ritmo de inversión.

En 2021, la inversión ejecutada alcanzó S/ 626 millones, con un nivel de cumplimiento del 80%, orientado a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua y saneamiento. Posteriormente, en 2022, la inversión ascendió a S/ 1,279 millones, superando la programación anual con un cumplimiento del 124%⁴. Este sobrecumplimiento se debió principalmente a proyectos de ampliación de cobertura, incluyendo contingencias legales del Macro Proyecto Pachacútec y el proyecto Nueva Rinconada, así como a la reclasificación de la RPI del proyecto concesionado Agua-Chillón y al reajuste por el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de las RPI correspondientes a concesiones como Huascacocha, Taboada, La Chira y Provisur.

En 2023, la ejecución de inversiones fue de S/ 1,193 millones, logrando un cumplimiento del 100.4%, resultado atribuido principalmente al avance del proyecto de ampliación y mejora del sistema de agua potable y alcantarillado de Nueva Rinconada, manteniéndose la RPI conforme a lo presupuestado. Para el cierre de 2024, la inversión ejecutada fue de S/ 1,158 millones, con un nivel de cumplimiento del 91.3%.

En 2025, la ejecución de inversiones (Formación Bruta de Capital - FBK) fue de S/ 811 millones, logrando un cumplimiento del **85.4%**, resultado atribuido principalmente al avance del proyecto


³ Sólo para efectos del presente reporte se considerará a la UE Tumbes como una empresa prestadora.

⁴ Cabe señalar que, corresponde a información del Sistema de Contabilidad Regulatoria y el Formato SE Evaluación Presupuestal del 2022 y 2023 remitidos por la empresa prestadora.

de ampliación y mejora del sistema de agua potable y alcantarillado de Nueva Rinconada (que se ejecutó en un nivel de 139% respecto a lo presupuestado) , manteniéndose el pago de los RPI conforme a lo presupuestado (100% de cumplimiento).


La ejecución de inversiones del 2025 **muestra un desplazamiento** de la ejecución del proyecto Nueva Rinconada en lugar de los proyectos de inversión y gasto de capital no ligado a proyectos (medidas de mejora) del Estudio Tarifario. Vale decir que, de los S/ 508 millones solo se ejecutó el 60% (S/ 305 millones).

GRÁFICO 9. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (FBK) DE SEDAPAL: PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(MILLONES DE SOLES)

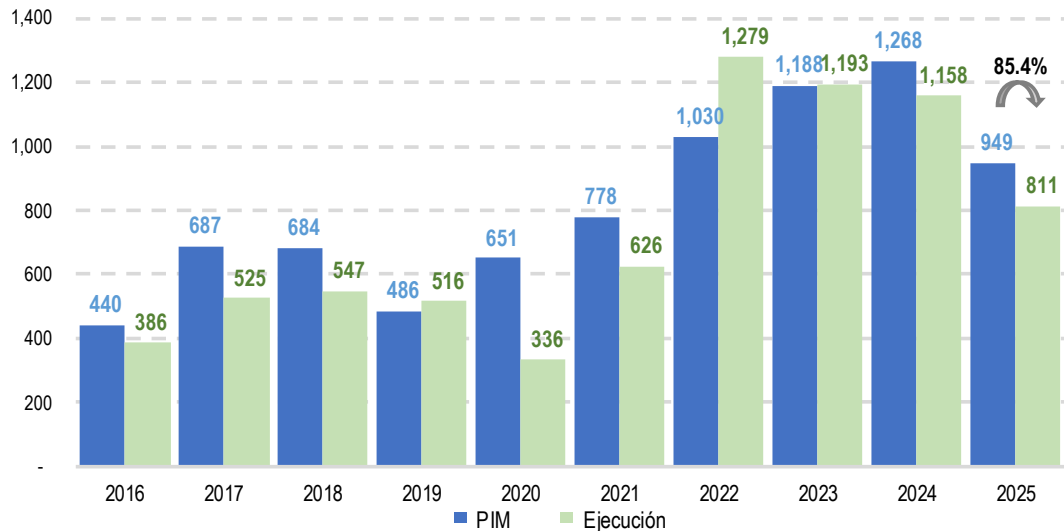

Nota: Formación bruta de capital incluye los proyectos de inversión y los gastos de capital no ligados a proyectos.
Fuente: SEDAPAL (Reporte 8e – FONAFE) y Contabilidad regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

GRÁFICO 10. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL (FBK) DE SEDAPAL: PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA⁵
(MILLONES DE SOLES)

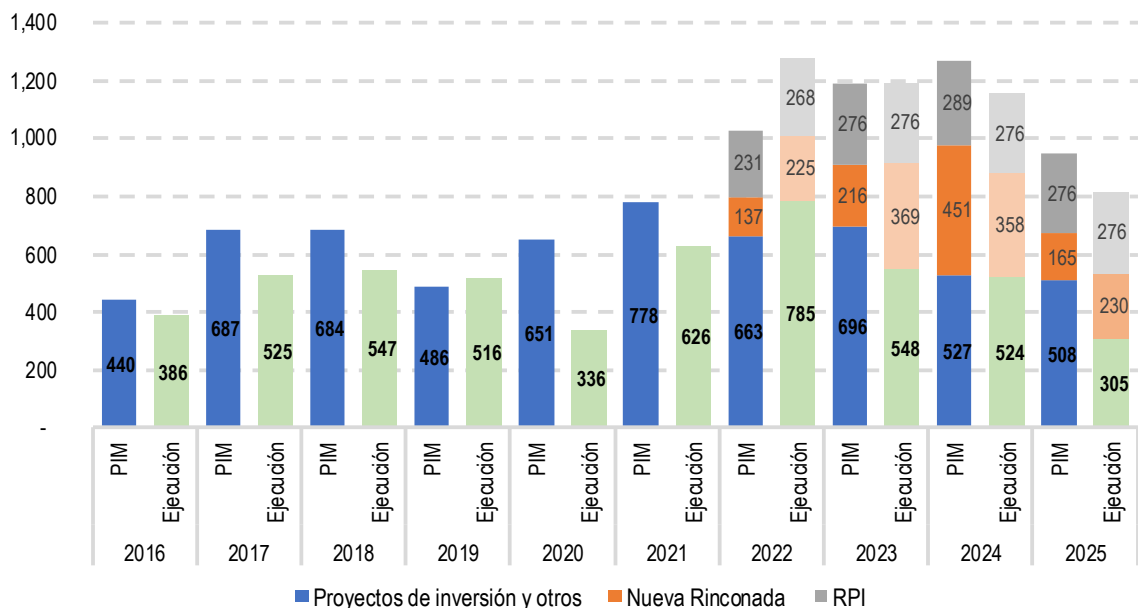


Nota: Formación bruta de capital incluye los proyectos de inversión y los gastos de capital no ligados a proyectos.
Fuente: SEDAPAL (Reporte 8e – FONAFE) y Contabilidad regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

⁵ El gráfico ilustra los cambios en la metodología descrita, así como la incorporación del proyecto Nueva Rinconada.


Reducción del presupuesto para inversiones en el 2025: Es importante destacar la reducción del 25% en el presupuesto total para el año 2025 respecto de 2024. Esta disminución se explica principalmente por la menor asignación presupuestal al proyecto Nueva Rinconada, cuyo presupuesto se redujo en 63% debido a que se encuentra en una etapa avanzada de ejecución.

GRÁFICO 11. EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE SEDAPAL
(% AVANCE ANUAL)

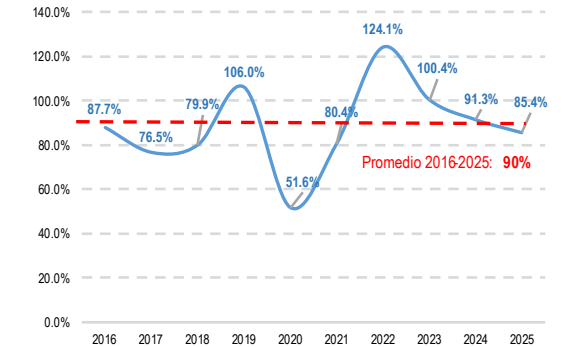

Nota: Formación bruta de capital incluye los proyectos de inversión y los gastos de capital no ligados a proyectos.
Fuente: SEDAPAL
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

GRÁFICO 12. EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE SEDAPAL SIN RPI Y RINCONADA
(% AVANCE ANUAL)

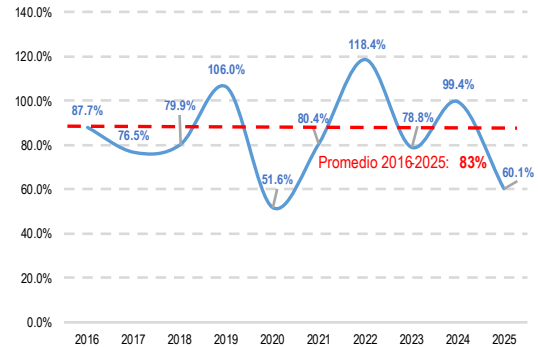

Nota: Sin considerar en el presupuesto y ejecución correspondientes al proyecto Nueva Rinconada y los pagos por RPI en las concesiones.
Fuente: SEDAPAL
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

El nivel de ejecución de inversiones en 2025 por encima del promedio histórico de 90%: El nivel de ejecución de inversiones de Sedapal (considerando la FBK) durante el periodo 2016–2025 alcanzó, en promedio, el 90%, aunque con un comportamiento fluctuante. En 2022 se registró el valor máximo, con 124.1%; posteriormente, entre 2023 y 2024, el indicador se mantuvo por encima del promedio histórico. Cabe señalar que, el nivel de ejecución de inversiones en el 2025 fue menor al promedio histórico, incluso cuando la ejecución del proyecto Nueva Rinconada fue el 139% respecto a lo presupuestado.

No obstante, **el nivel de ejecución de inversiones en 2025 sería menor al promedio histórico si se excluye la ejecución del proyecto Nueva Rinconada y los pagos por RPI.** En este escenario, el nivel de ejecución en el 2025 solo alcanzó el 60.1%, menor al promedio histórico de 83%. Por ello, se vuelve necesario fortalecer la planificación, seguimiento y gestión de estos proyectos específicos, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y asegurar la continuidad de las inversiones estratégicas.

4.2. Inversiones totales de las empresas prestadoras (sin Sedapal)

Entre 2016 y 2025, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento —con excepción de SEDAPAL— ejecutaron inversiones por un total acumulado de **S/ 2,147 millones**, lo que representa un promedio anual de S/ 215 millones y una tasa promedio de ejecución del 32%.


En el 2025 se observa una disminución en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para inversiones de las empresas prestadoras, el menor desde el 2020. A partir de 2018, el PIM había mostrado un crecimiento sostenido, llegando a duplicarse en 2024 respecto del nivel asignado en 2017. Este incremento reflejaba una mayor disponibilidad de recursos orientados al cierre de brechas de infraestructura y la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, en 2025 el PIM ascendió a S/ 703 millones, monto inferior en S/ 108 millones al registrado en el 2024, lo que representa una reducción en 13% respecto al año previo. Esta disminución presupuestal se presenta de manera generalizada en las empresas prestadoras clasificadas como grandes 1, grandes 2 y medianas.

El nivel de ejecución de las empresas prestadoras (sin considerar a Sedapal) mantiene una tendencia de crecimiento sostenido desde el 2023. En el 2025, se registró una ejecución de inversión de S/ 289 millones, con un nivel de ejecución equivalente al 41.1 %, ubicándose por encima del promedio histórico de 32% y constituyéndose como el mayor desde el 2017.

No obstante, en términos nominales, el monto ejecutado en el 2025 es inferior al registrado en el 2024. Esta disminución podría estar asociada al proceso de adaptación de los procedimientos de contratación pública al nuevo marco normativo, así como a los desafíos estructurales que aún enfrentan las empresas prestadoras, tales como la limitada capacidad técnica para ejecutar inversiones, las demoras en la obtención de permisos y las deficiencias en la formulación de expedientes técnicos.

Pese a ello, se vienen realizando esfuerzos orientados a fortalecer las capacidades de gestión y mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal dentro del sector.

**GRÁFICO 13. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS:
PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(MILLONES DE SOLES)**

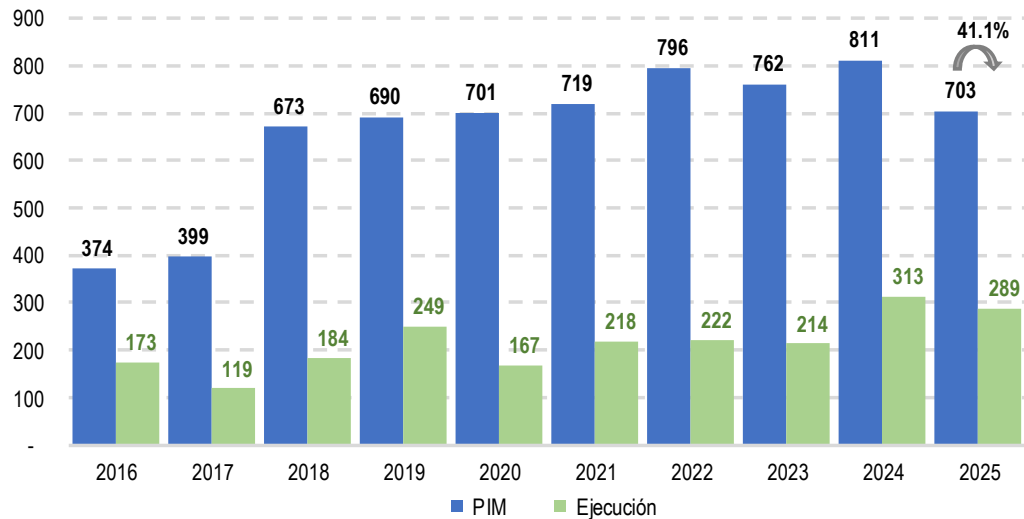

Nota: Sin considerar a Sedapal.
Fuente: SIAF-ETES
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

**GRÁFICO 14. NIVEL DE EJECUCIÓN AGREGADO DE INVERSIONES DE EMPRESAS DE SANEAMIENTO
(% AVANCE ANUAL)**




Nota: Sin considerar a Sedapal.
Fuente: SIAF -ETES
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

4.3. Inversiones totales de las empresas prestadoras según tamaño

En el caso de las empresas prestadoras clasificadas como grandes 1 (de 100 mil a 1 millón conexiones)⁶ el nivel de ejecución promedio en el periodo 2016-2025 es de 37%. Durante el 2025, las empresas prestadoras grandes 1 presupuestaron una inversión de S/ 316 millones, de los cuales se ejecutó S/ 147 millones, registrando un nivel de ejecución del 46.5% para dicho año. El nivel de ejecución mantiene su crecimiento sostenido desde el 2023 y, en términos nominales, el monto de inversión ejecutado es similar al 2024.

Los datos de programación y ejecución en millones de soles se encuentran representados en el siguiente gráfico.


GRÁFICO 15. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 1 (G1)
PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(MILLONES DE SOLES)

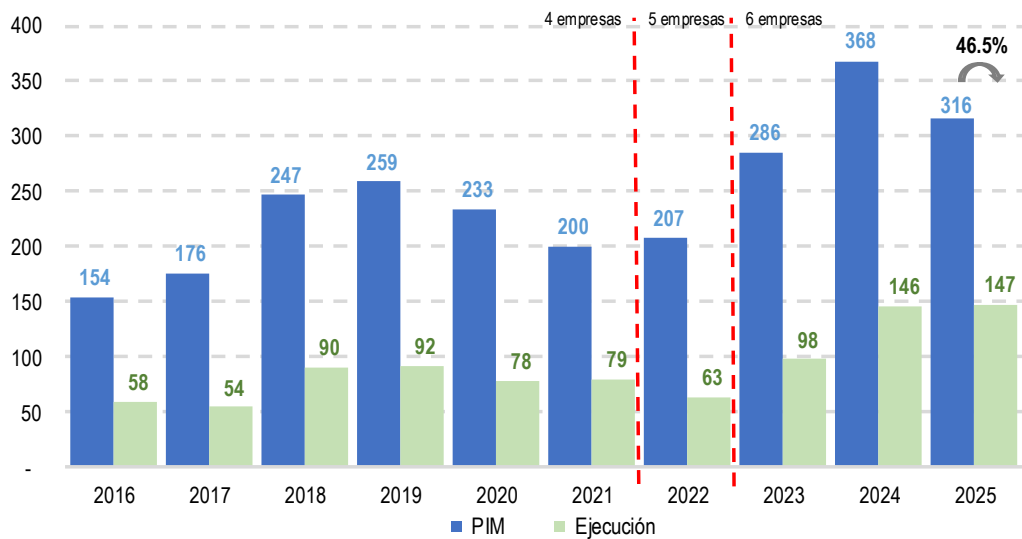

Fuente: SIAF -ETES

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

GRÁFICO 16. NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LAS EMPRESAS GRANDES 1 (G1)
(% AVANCE ANUAL)

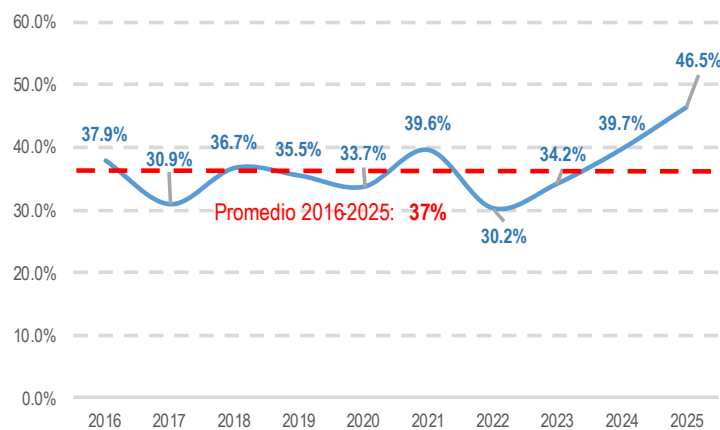

Fuente: SIAF -ETES

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Asimismo, en el caso de las empresas prestadoras clasificadas como grandes 2 (de 40 mil a 100 mil conexiones)⁷ el nivel de ejecución promedio en el periodo 2016-2025 es de 29%.


⁶ SEDALIB S.A., SEDAPAR S.A., EPS GRAU S.A., EPSSEL S.A., SEDACUSCO S.A. y EPS TACNA S.A.

⁷ SEDA HUANUCO S.A., SEDALORETO S.A., CAÑETE S.A., EMSAPUNO S.A., SEDACAJ S.A., SEDACHIMBOTE S.A., SEDA AYACUCHO S.A., EMAPA SAN MARTÍN S.A., SEMAPACH S.A., SEDACUSCO S.A., EMAPICA S.A., SEDA JULIACA S.A. y SEDAMHUANCAYO S.A.

Durante el 2025, las empresas prestadoras grandes 2 presupuestaron una inversión de S/ 254 millones, de los cuales se ejecutó S/ 92 millones, registrando un nivel de ejecución del 36.3% para dicho año. El nivel de ejecución se mantuvo alrededor del 2024 y, en términos nominales, el monto de inversión ejecutado es mejor al 2024.


La programación y ejecución en millones de soles se muestra en la siguiente gráfica.

GRÁFICO 17. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 2 (G2)
PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(MILLONES DE SOLES)

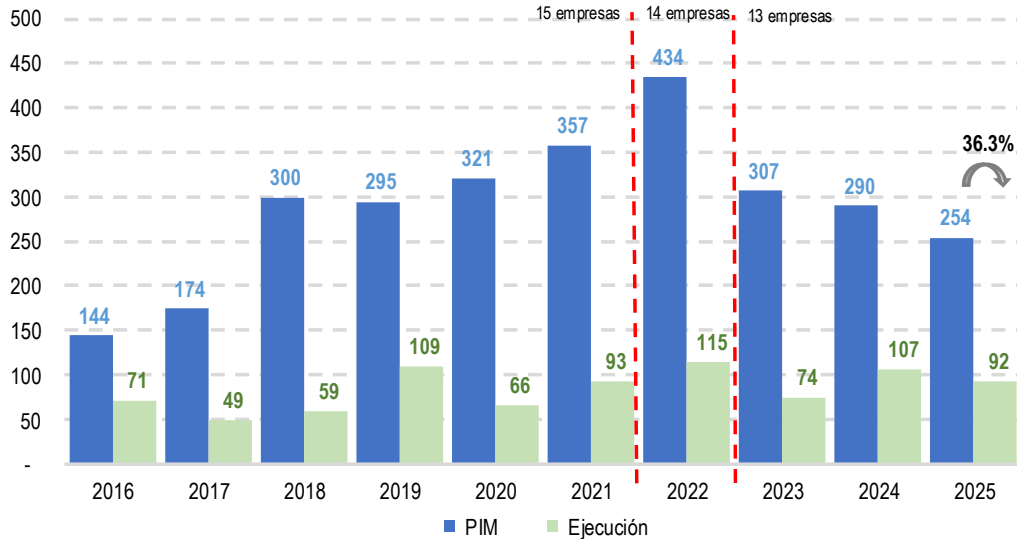

Fuente: SIAF -ETES
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA – SUNASS

GRÁFICO 18. NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LAS EMPRESAS GRANDES 2 (G2)
(% AVANCE ANUAL)

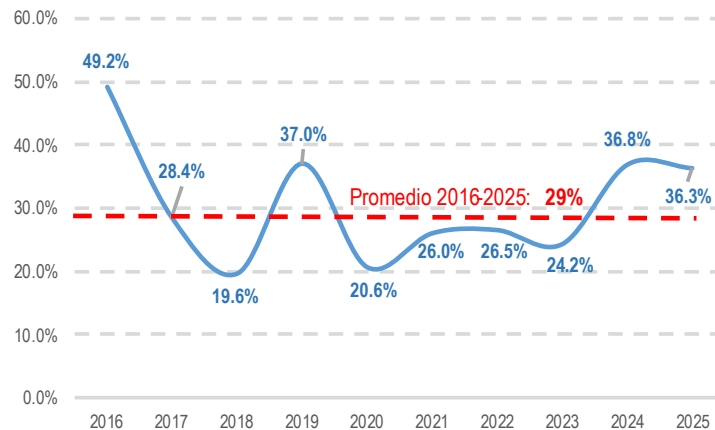


Fuente: SIAF -ETES
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Del mismo modo, en el caso de las empresas medianas (De 15 mil a 40 mil conexiones)⁸ el **nivel de ejecución promedio en el periodo 2016-2025 es de 33%. Durante el 2025, las empresas prestadoras medianas presupuestaron una inversión de S/ 106 millones, de los cuales se ejecutó S/ 41 millones, registrando un nivel de ejecución del 38.9% para dicho año. El nivel de ejecución se mantuvo alrededor del 2024 y, en términos nominales, el monto de inversión ejecutado es mejor al 2024.**

⁸ EPS BARRANCA S.A., MOYOBAMBA S.A., EMAPA HUARAL S.A., EMUSAP ABANCAY S.A., ILO S.A., MOQUEGUA S.A., EMPSSAPAL S.A., MANTARO S.A., MARAÑÓN S.A., EMAPISCO S.A., EMAPAT S.A., EMAPACOP S.A., AGUAS DE LIMA NORTE S.A., SELVA CENTRAL S.A. y CHAVIN S.A.

La programación y ejecución en millones de soles se muestra en la siguiente gráfica.


GRÁFICO 19. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS MEDIANAS (M)
PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(MILLONES DE SOLES)

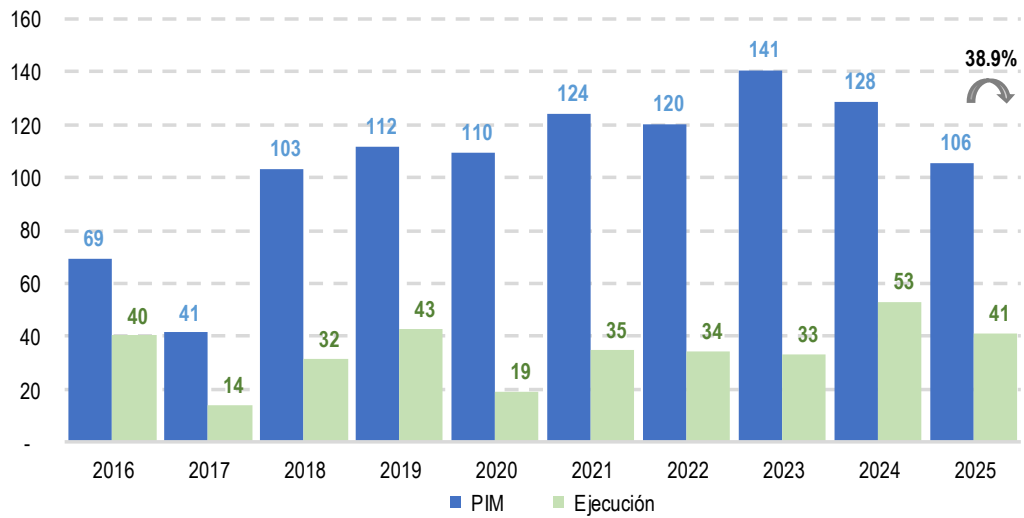

Fuente: SIAF -ETES

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

GRÁFICO 20. EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LAS EMPRESAS MEDIANAS (M)
(% AVANCE ANUAL)

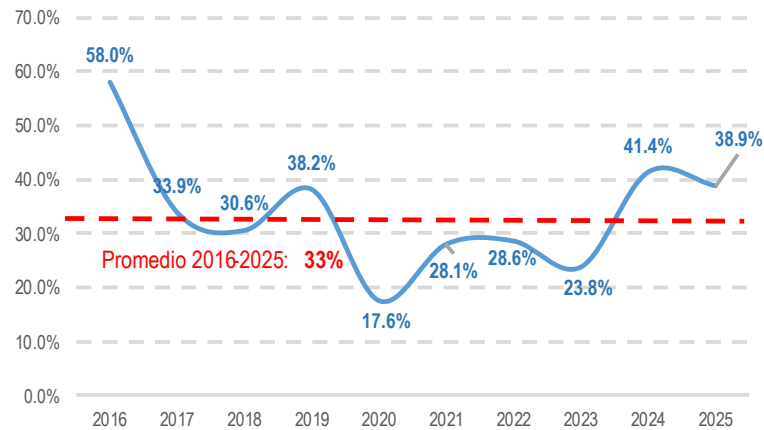

Fuente: SIAF -ETES


Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Finalmente, el caso de las empresas prestadoras clasificadas como pequeñas (hasta 15 mil conexiones)⁹ el nivel de ejecución promedio en el periodo 2016-2025 fue de 24%. Durante el 2025, las empresas prestadoras medianas presupuestaron una inversión de S/ 27 millones, de los cuales se ejecutó S/ 9 millones, registrando un nivel de ejecución del 32% para dicho año. El nivel de ejecución es el mayor desde el 2017 y, en términos nominales, el monto de inversión ejecutado es mayor al 2024.

La programación y ejecución en millones de soles se muestra en la siguiente gráfica.

⁹ EMUSAP S.A., EPSSMU S.A., EMAPA PASCO S.A., EMAPAVIGS S.A., HUANCAMELICA S.A., EMAQ S.A., EMAPAB S.A., SIERRA CENTRAL S.A., NOR PUNO S.A., CHANKA S.A., CALCA S.A. y SEDAPAR - RIOJA S.A.


GRÁFICO 21. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS (P)
PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 (MILLONES DE SOLES)

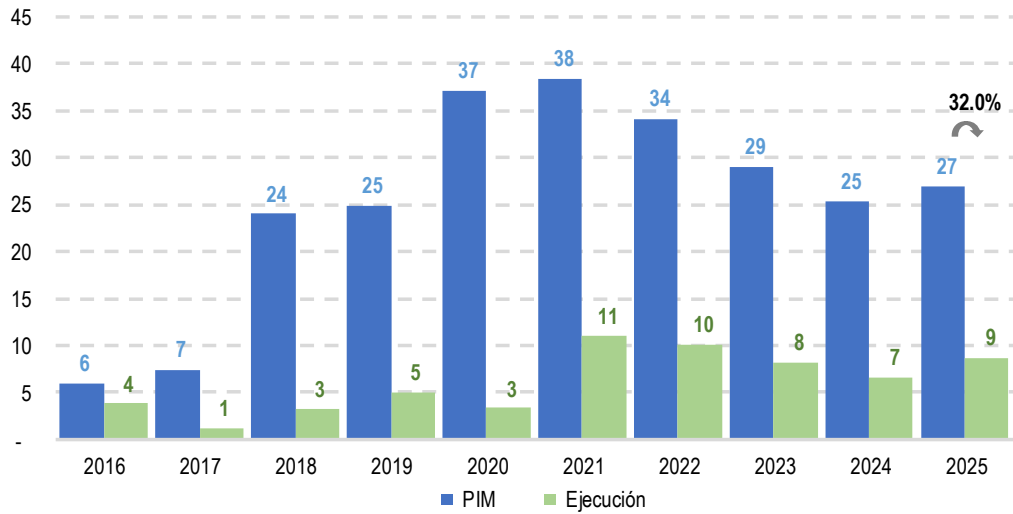

Fuente: SIAF -ETES

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

GRÁFICO 22. NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS (P)
 (% AVANCE ANUAL)

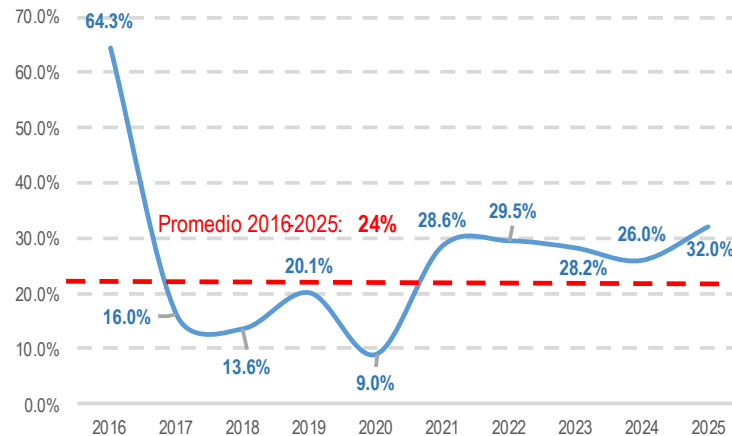

Fuente: SIAF -ETES

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

De otro lado, tal como se evidencia en las gráficas precedentes, entre 2016 y 2025, las empresas dedicadas a la prestación de servicios de agua y saneamiento han mostrado diversos niveles de participación en la ejecución de inversiones, diferenciados según su tamaño. Esto refleja que algunas empresas han logrado desplegar mayores recursos que otras, debido a variaciones en su capacidad técnica, operativa y de gestión.

Las **empresas grandes 1** han tenido una participación destacada en la ejecución de inversiones. Aunque su aporte disminuyó hasta un 28.2 % en 2022, experimentaron una recuperación significativa, alcanzando un 50.9 % en 2025. Este desempeño se ha visto reforzado por un aumento en el número de empresas de este grupo (pasó de 4 en 2021 a 6 en 2023), lo que evidencia un fortalecimiento en su capacidad para desarrollar proyectos y administrar recursos.


Por su parte, las **empresas grandes 2** fueron líderes en ejecución durante varios años, llegando a ejecutar el 51.7 % del total en 2022, la cifra más alta registrada en el periodo analizado. Sin embargo, desde 2023 su participación ha disminuido de manera sostenida, situándose en 31.9% en 2025. Esta reducción coincide con una disminución en el número de empresas del

grupo (pasó de 15 en 2021 a 13 en 2023), asociada a retrasos en proyectos o dificultades para mantener el ritmo de inversión.

Las **empresas medianas** han mantenido una participación relativamente estable, aunque sin avances significativos. Durante el periodo analizado, su ejecución fluctuó entre el 11% y el 23% del total. En 2025, representaron el 14.2 %, reflejando una ligera disminución en comparación con años previos. Esto sugiere que, aunque poseen cierta capacidad para llevar a cabo proyectos, no han logrado incrementarla de manera sustancial.

En cuanto a las **empresas pequeñas**, su participación en la ejecución de inversiones ha sido muy limitada. En 2016 ejecutaron apenas el 2.2% del total, alcanzando su máximo en 2020 y 2021 con un 5.0 % y 4.5 % respectivamente. No obstante, en los años siguientes su participación volvió a decrecer, llegando a un 3.0% en 2025. Esta situación evidencia que estas empresas enfrentan importantes limitaciones para llevar a cabo obras, probablemente debido a la falta de personal técnico calificado, experiencia o recursos financieros.

GRÁFICO 23. PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA (%)

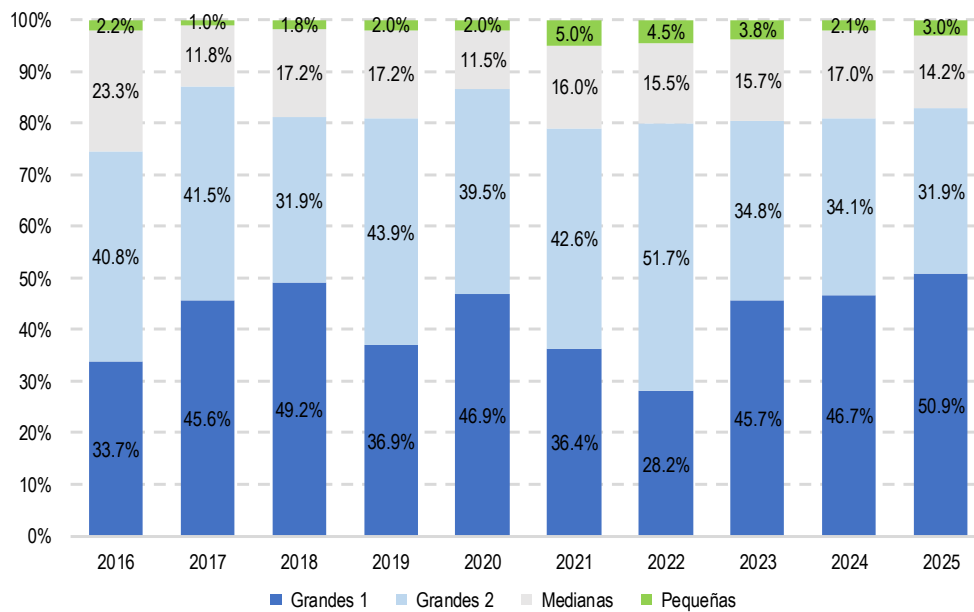

Fuente: SIAF -ETES

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

En síntesis, las empresas más grandes, especialmente las pertenecientes al grupo 1, han mejorado significativamente su capacidad para ejecutar inversiones en los últimos años, consolidándose como líderes en 2025. Por otro lado, las empresas grandes del grupo 2, que fueron las más activas en el pasado, han experimentado una reducción en su participación. Las empresas medianas mantienen una participación constante, mientras que las pequeñas continúan enfrentando desafíos relevantes.



5. EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES TOTALES EN EL 2025

En un **segundo nivel**, se analiza los Proyectos de inversión totales de cada empresa prestadora de manera individual, financiados con cargo a por todas las fuentes de financiamiento presupuestal, utilizando la información del sistema de Consulta Amigable del Gasto Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Así, en esta sección, se proporciona información detallada de las empresas prestadoras, según su tamaño, acerca del avance en la ejecución de las inversiones totales, a nivel presupuestal, considerando todas las diferentes fuentes de financiamiento (recursos directamente recaudados, recursos ordinarios, recursos de operaciones de crédito, entre otros), a diciembre de 2025.

5.1 Sedapal

En el 2025, de acuerdo con información de la Evaluación presupuestal Ejercicio 2025 (formato N.5E del FONAFE) y el reporte regulatorio N° 15 Reporte de seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de Inversión de Sedapal, **el Presupuesto aprobado anual para Inversiones (Formación bruta de capital – FBK) ascendía a S/ 949 millones, de cuales se ejecutaron S/ 811 millones en inversiones en 2025, alcanzando un avance de ejecución presupuestal del 85.4%.**

Respecto a la ejecución presupuestal en 2025, se puede mencionar que principalmente correspondieron a **Proyectos de inversión** por **S/ 797.3 millones** (98.3%) y el resto a **Gasto de capital no ligado a proyectos** por **S/ 13.8 millones** (1.7%).

TABLA 7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIONES (FBK) DE SEDAPAL

(EN MILLONES DE SOLES Y %, A DICIEMBRE 2025)

Fuente de financiamiento	Presupuesto (en millones en soles)	Ejecución (en millones en soles)	En %
RDR (*)	571.2	538.5	94.3%
Tesoro Público	2.0	0.4	20.2%
Endeudamiento Externo	376.2	272.2	72.4%
Total	949.4	811.1	85.4%


Nota: (*) Se incluyen los pagos por RPI de las concesiones, entre otros pagos.

Fuente: SEDAPAL y Reporte regulatorio 15

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Es necesario resaltar que, la principal fuente de financiamiento para las inversiones de Sedapal la representa los Recursos directamente recaudados (RDR) proveniente del cobro de las tarifas.

El número de inversiones reportadas como **Proyectos de inversión asciende a 192** (entre PIP, IOARR, Obras y Otros proyectos) y el **Gasto de capital no ligado a proyectos representado en 4 inversiones** (en intangibles como la implementación del sistema SCADA estandarizado y nuevos sistemas de gestión comercial y operativo; y activos en maquinarias y equipos).

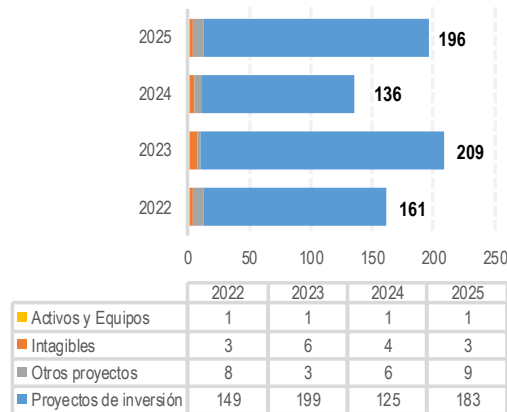GRÁFICO 24. NÚMERO DE INVERSIONES (FBK) REPORTADAS POR SEDAPAL (%)


Fuente: SEDAPAL, Reporte Regulatorio 15
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

5.2 Empresas Prestadoras Grandes 1

En 2025, de acuerdo con la información de la Consulta del Gasto Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES), la ejecución de Proyectos de inversión de este grupo de empresas registró **S/ 146.9 millones**, con un avance de 46.5% respecto a lo programado en el año fiscal, que asciende a S/ 316.1 millones. En términos de cantidad de proyectos de inversión, se programó un total de 224 proyectos de los cuales solo 145 tuvieron algún desembolso para su ejecución en el transcurso del año.

TABLA 8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 1 (G1)
(EN SOLES Y %, A DICIEMBRE 2025)

Fuente de financiamiento	PIM (en soles)	Ejecución (en soles)	Ejecución (en %)
Donaciones y transferencias	104,560,744	45,729,078	43.7%
Recursos directamente recaudados	211,513,642	101,150,276	47.8%
TOTAL	316,074,386	146,879,354	46.5%


Fuente: SIAF – ETES
Con información al 09 de abril del 2026

Es necesario resaltar que, en las empresas prestadoras grandes 1, la principal fuente de financiamiento para sus inversiones la representa los **Recursos directamente recaudados** (RDR) proveniente del cobro de las tarifas. Este comportamiento es similar entre las empresas de este grupo, a excepción de EPS GRAU y EPSEL. Dichas empresas, en los que en años previos la principal fuente de financiamiento, a nivel de PIM, fueron donaciones y transferencias.

Respecto al nivel de ejecución, SEDACUSCO se posiciona en primer lugar con un avance del S/ 32.5 millones, seguidos por SEDAPAR con S/ 32 millones, y EPS GRAU, que alcanza una ejecución de S/ 27.8 millones. En quinto lugar, se ubica EPSEL, con una ejecución de S/ 22.6 millones, mientras que EPS TACNA presenta un nivel de ejecución de S/ 8.1 millones.

La empresa prestadora SEDAPAR es la empresa que cuenta con la mayor cantidad de proyectos de inversión en su cartera de inversiones entre las empresas prestadoras (sin considerar a SEDAPAL). Así, dicha empresa prestadora cuenta con 95 proyectos de inversión y 43 de ellos tuvieron algún tipo de desembolso o ejecución presupuestal en el 2025. Por su parte, EPS GRAU tiene una cartera de 43 proyectos de inversión, de los cuales se ejecutaron 35. Finalmente, en tercer lugar, la EPS TACNA tiene una cartera de 30 proyectos de inversión y 22 de estos con algún grado de ejecución.

GRÁFICO 25. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS EMPRESAS GRANDES 1 (G1)

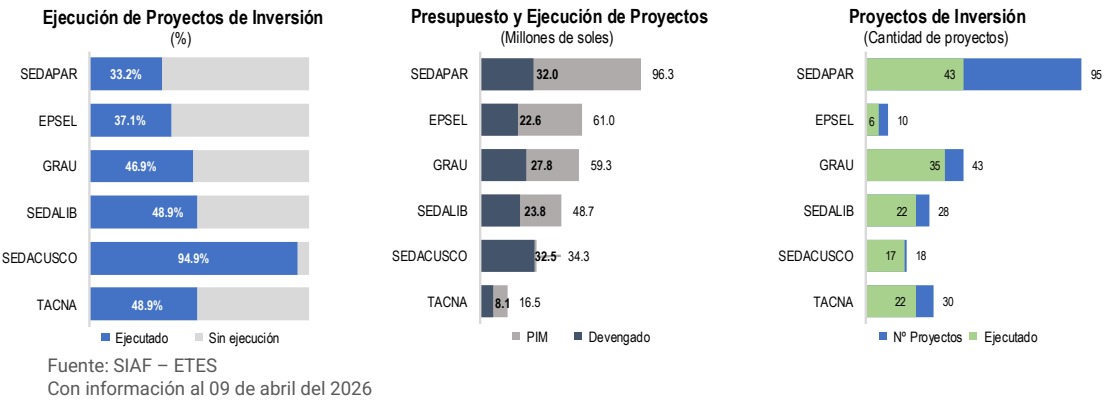

Finalmente, el ranking del nivel de ejecución para el 2025, SEDACUSCO se posiciona en primer lugar con un avance del 94.9 % de su presupuesto asignado, seguidos por SEDALIB y EPS TACNA con 48.9 %, y GRAU, que alcanza un 46.9 %. En quinto lugar, se ubica EPSEL, con una ejecución del 37.1 %, mientras que SEDAPAR, a pesar de contar con el mayor presupuesto, presenta un nivel de ejecución relativamente bajo, con apenas 33.2 %.

A nivel histórico, SEDACUSCO es la empresa prestadora que por tercer año consecutivo se encuentra como la empresa con mayor nivel de ejecución en proyectos de inversión en comparación al grupo de las empresas grandes 1 (G1) y siendo el 2025 el año con mayor nivel de ejecución a nivel histórico en los últimos 10 años.

TABLA 9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 1 (G1) (%AVANCE)

Empresa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SEDACUSCO	37.7%	77.7%	33.9%	32.0%	39.7%	25.4%	30.0%	31.6%	59.4%	64.3%	94.9%
TACNA	72.7%	41.6%	58.0%	46.8%	25.8%	48.8%	53.8%	63.6%	44.4%	57.8%	48.9%
SEDALIB	69.7%	46.2%	57.0%	46.2%	19.5%	33.5%	47.5%	13.8%	25.0%	55.9%	48.9%
GRAU	66.5%	66.2%	23.9%	38.6%	58.7%	49.4%	38.0%	22.9%	15.3%	34.0%	46.9%
EPSEL	54.7%	23.9%	6.2%	25.1%	58.6%	40.4%	19.7%	29.9%	27.5%	17.0%	37.1%
SEDAPAR	73.5%	22.9%	49.6%	38.1%	17.0%	25.8%	42.0%	51.3%	43.6%	36.5%	33.2%

Fuente: SIAF – ETES
 Con información al 09 de abril del 2026
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA

De otro lado, la ejecución de cada una de las inversiones programadas para el 2025 de las empresas grandes 1 se muestra en el Anexo N° 2 con relación al Reporte regulatorio 15 sobre el seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de Inversión.

5.3 Empresas Prestadoras Grandes 2

En 2025, de acuerdo con la información de la Consulta del Gasto Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES), la ejecución de Proyectos de inversión total alcanzó S/ 92.3 millones de los S/ 254 millones programados. De los 167 proyectos de inversión programados, solo 109 ejecutaron recursos en el año.

TABLA 10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 2 (G2)
(EN SOLES Y %, A DICIEMBRE 2025)

Fuente de financiamiento	PIM	Ejecución (en soles)	Ejecución (en %)
Donaciones y transferencias	101,258,492	38,178,471	37.7%
Recursos directamente recaudados	153,096,332	54,100,691	35.3%
Total	254,354,824	92,279,162	36.3%

Fuente: SIAF – ETES


Con información al 09 de abril del 2026

Es necesario mencionar que, en el caso de las empresas Grandes 2, la principal fuente de financiamiento para sus inversiones la representa los Recursos directamente recaudados (RDR) proveniente del cobro de las tarifas. En este grupo, a diferencia del resto, históricamente SEDALORETO y SEDA JULIACA tuvieron como principal fuente de financiamiento, a nivel de PIM, a las donaciones y transferencias.

Respecto al nivel de ejecución, SEDAMHUANCAYO se posiciona en primer lugar con un avance del S/ 20.9 millones, seguidos por SEMAPACH con S/ 20 millones, y SEDA JULIACA, que alcanza una ejecución de S/ 12.9 millones.

Entre las empresas grandes 2 (G2), la empresa prestadora EMAPICA cuenta con 32 proyectos de inversión y 20 de ellos tuvieron algún tipo de desembolso o ejecución presupuestal en el 2025. Por su parte, EPS SAN MARTÍN tiene una cartera de 30 proyectos de inversión, de los cuales se ejecutaron 25. Finalmente, en tercer lugar, la EPS SEMAPACH tiene una cartera de 22 proyectos de inversión y 21 de estos con algún grado de ejecución.

GRÁFICO 26. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS EMPRESAS GRANDES 2 (G2)

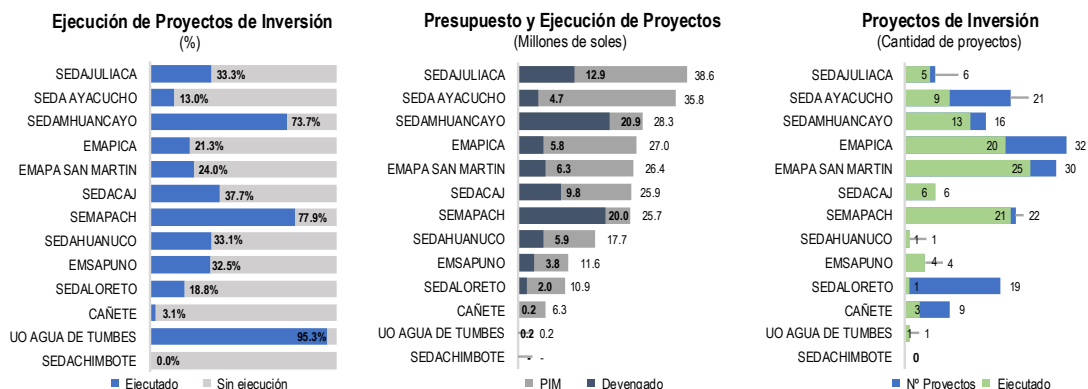

Fuente: SIAF – ETES

Con información al 09 de abril del 2026

En términos de ejecución presupuestal, el ranking es liderado por Agua de Tumbes, que alcanzó el 95.3 % de ejecución, seguida por SEMAPACH, con un destacado 77.9 %, y SEDAMHUANCAYO, con 73.7 %. En cuarto lugar, se encuentra SEDACAJ, con una ejecución de 37.7 %, mientras que SEDA JULIACA y SEDA HUÁNUCO registraron niveles de 33.3 % y 33.1 %, respectivamente. Mientras que, empresas como EMSA PUNO (32.5 %), EMAPA SAN MARTIN (24.0 %), EMAPICA (21.3 %), SEDALORETO (18.8 %), SEDA AYACUCHO, que registró una ejecución de 13.0 %. En los últimos lugares empresas que tuvieron desempeños bajos, como EMAPA CAÑETE con 3.1 % y SEDA CHIMBOTE que no registró ejecución en Proyectos de inversión.

A nivel histórico, en los 2 últimos años (2024 y 2025) las empresas prestadoras grandes 2 vienen logrando un mayor nivel de ejecución de sus proyectos de inversión. La UE Tumbes por segundo año consecutivo tuvo el mayor nivel de ejecución en proyectos de inversión en comparación al grupo de las empresas grandes 2 (G2) y siendo el 2025 el año con mayor nivel de ejecución a nivel histórico en los últimos 10 años. Así también, SEMAPACH y

SEDAMHUANCAYO son las empresas prestadoras con buen nivel de ejecución de sus proyectos de inversión en los 2 últimos años.

TABLA 11. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS GRANDES 2 (G2)
(%AVANCE)

Empresa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
UO AGUA DE TUMBES	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	96.1%	95.3%
SEMAPACH	1.2%	38.4%	8.3%	0.7%	19.5%	8.3%	35.9%	31.3%	33.8%	52.4%	77.9%
SEDAMHUANCAYO	17.1%	37.6%	14.3%	7.1%	2.3%	11.5%	6.0%	18.1%	10.5%	51.3%	73.7%
SEDACAJ	2.5%	4.6%	33.4%	22.0%	38.1%	12.7%	32.1%	37.1%	59.2%	30.4%	37.7%
SEDAJULIACA	77.7%	74.4%	15.2%	14.1%	34.2%	1.9%	26.7%	6.8%	11.3%	50.9%	33.3%
SEDAHUANUCO	10.2%	35.1%	1.6%	0.5%	15.4%	23.9%	19.6%	35.2%	39.4%	25.8%	33.1%
EMSAPUNO	17.7%	4.0%	7.0%	18.0%	45.7%	8.2%	26.2%	27.5%	22.3%	22.9%	32.5%
EMAPA SAN MARTIN	34.6%	56.4%	13.8%	25.9%	65.4%	28.5%	11.3%	28.8%	17.7%	24.0%	24.0%
EMAPICA	0.0%	0.6%	13.6%	17.7%	50.5%	3.7%	17.8%	14.0%	23.7%	32.2%	21.3%
SEDALORETO	0.0%	35.4%	60.7%	3.7%	79.4%	57.0%	4.6%	50.9%	17.7%	2.5%	18.8%
SEDA AYACUCHO	27.5%	31.4%	21.1%	36.7%	55.6%	18.1%	13.3%	15.3%	19.3%	11.3%	13.0%
CAÑETE	25.3%	28.9%	20.7%	7.1%	7.7%	12.8%	13.9%	33.7%	16.4%	52.5%	3.1%
SEDACHIMBOTE	7.1%	30.0%	60.9%	53.5%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48.0%	0.0%

Fuente: SIAF – ETES

Con información al 09 de abril del 2026

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA

De otro lado, la ejecución de cada una de las inversiones programadas para el 2025 de las empresas grandes 2 se muestra en el Anexo N° 2 con relación al Reporte regulatorio 15 sobre el seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de Inversión.

5.4 Empresas Prestadoras Medianas

En 2025, de acuerdo con la información de la Consulta del Gasto Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES), la ejecución de Proyectos de inversión total alcanzó S/ 41.0 millones de los S/ 105.6 millones programados. En términos de cantidad de proyectos de inversión, se programó un total de 203 proyectos de los cuales 144 tuvieron algún desembolso para su ejecución en el transcurso del año.

TABLA 12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS MEDIANAS (M)
(EN SOLES Y %, A DICIEMBRE 2025)

Fuente de financiamiento	PIM	Ejecución (en soles)	Ejecución (en %)
Donaciones y transferencias	59,163,177	18,259,270	30.9%
Recursos directamente recaudados	46,388,288	22,755,437	49.1%
Total	105,551,465	41,014,707	38.9%

Fuente: SIAF – ETES

Con información al 09 de abril del 2026


Es necesario mencionar que, en el caso de las empresas Medianas, la mayor fuente de financiamiento para sus inversiones son, ligeramente, las Donaciones y transferencias que reciben de terceros. Cabe precisar que, las empresas en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) como EMAPACOP y EPS MARAÑÓN tuvieron, históricamente, un financiamiento mayor de Donaciones y transferencias.

Respecto al nivel de ejecución, EMUSAP ABANCAY se posiciona en primer lugar con un avance del S/ 8.7 millones, seguidos por EPS ILO con S/ 5.9 millones, y EMAPACOP, que alcanza una ejecución de S/ 4.1 millones.

Entre las empresas medianas (M), la empresa prestadora EMAPACOP tuvo con 27 proyectos de inversión y solo 6 de ellos tuvieron algún tipo de desembolso o ejecución presupuestal en el

2025. Por su parte, EPS ILO tiene una cartera de 20 proyectos de inversión, de los cuales se ejecutaron 12. Finalmente, en tercer lugar, la EPS CHAVIN tiene una cartera de 19 proyectos de inversión y 18 de estos con algún grado de ejecución.

GRÁFICO 27. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS (M)

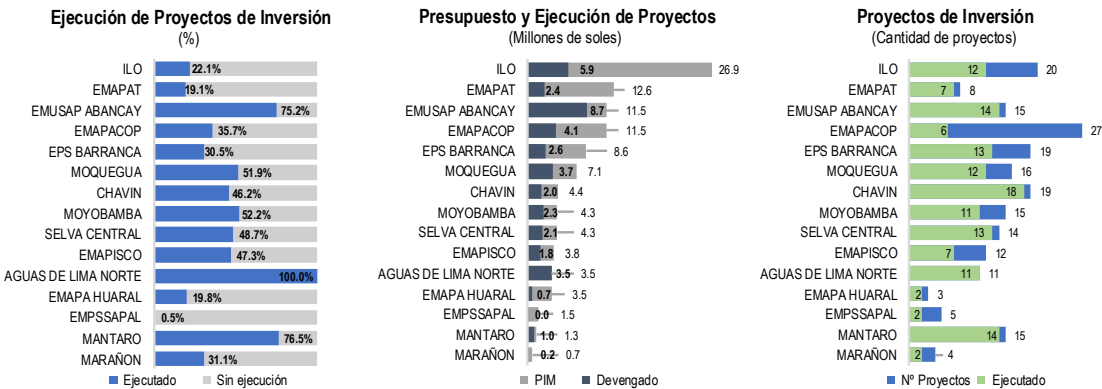

Fuente: SIAF – ETES
 Con información al 09 de abril del 2026

De esta manera, en los 3 primeros lugares se ubicaron las empresas prestadoras Aguas de Lima Norte en primer lugar con 100 %, seguido de EPS Municipal Mantaro con 76.5% y Emusap Abancay con 75.2%. Mientras que los últimos 3 lugares en las empresas medianas, se ubicaron Emapa Huaral (19.8 %), EMAPAT (19.1 %) y EMPSSAPAL (0.5%).

A nivel histórico, entre las empresas prestadoras medianas (M) vienen logrando un mayor nivel de ejecución de sus proyectos de inversión como AGUAS DE LIMA NORTE, EPS MANTARO y EMUSAP ABANCAY en 2025. Cabe señalar que, EMPSSAPAL es una de las empresas prestadoras con menor nivel de ejecución en los últimos 4 años, que debe ser revertido a través de un fortalecimiento de capacidades.

TABLA 13. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS MEDIANAS (M) (%AVANCE)

Empresa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AGUAS DE LIMA NORTE	83.5%	89.4%	32.1%	86.7%	69.3%	6.8%	35.4%	39.5%	21.2%	21.9%	100.0%
MANTARO	84.3%	65.8%	54.7%	25.8%	44.0%	29.0%	10.0%	5.2%	75.7%	39.2%	76.5%
EMUSAP ABANCAY	69.6%	81.9%	91.6%	84.3%	0.0%	0.0%	0.0%	55.1%	23.0%	65.3%	75.2%
MOYOBAMBA	74.5%	78.4%	23.9%	29.5%	21.2%	20.7%	19.4%	60.4%	19.7%	36.8%	52.2%
MOQUEGUA	28.1%	84.2%	0.5%	56.9%	33.5%	31.4%	38.8%	17.2%	22.1%	33.4%	51.9%
SELVA CENTRAL	64.7%	33.6%	19.1%	28.9%	43.2%	24.5%	46.6%	2.3%	32.6%	35.6%	48.7%
EMAPISCO	26.1%	11.6%	0.0%	7.8%	14.6%	11.1%	45.1%	24.5%	62.9%	58.5%	47.3%
CHAVIN	22.9%	67.2%	45.4%	15.1%	27.0%	6.1%	12.5%	17.3%	42.4%	45.8%	46.2%
EMAPACOP	0.0%	0.0%	89.9%	10.0%	65.1%	15.3%	11.6%	26.9%	23.0%	12.5%	35.7%
MARAÑON	0.0%	0.0%	93.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	78.1%	47.5%	31.1%
EPS BARRANCA	1.5%	0.0%	2.1%	7.4%	45.2%	10.7%	18.1%	20.6%	24.4%	11.8%	30.5%
ILO	5.9%	29.2%	18.4%	0.7%	26.7%	34.8%	45.7%	52.7%	8.4%	39.1%	22.1%
EMAPA HUARAL	12.0%	100.0%	0.0%	6.7%	2.0%	30.4%	8.0%	17.5%	17.4%	8.3%	19.8%
EMAPAT	90.6%	92.2%	12.0%	18.8%	58.8%	29.2%	33.3%	13.7%	11.6%	53.7%	19.1%
EMPSSAPAL	64.9%	99.9%	95.0%	55.5%	86.4%	8.3%	22.8%	2.6%	0.0%	0.0%	0.5%

Fuente: SIAF – ETES
 Con información al 09 de abril del 2026
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA

De otro lado, la ejecución de cada una de las inversiones programadas para el 2025 de las empresas mediana se muestra en el Anexo N° 2 con relación al Reporte regulatorio 15 sobre el seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de Inversión.

5.5 Empresas Prestadoras Pequeñas

De acuerdo con la información de la Consulta del Gasto Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES), durante el 2025, las inversiones sumaron un total de S/ 8.7 millones, respecto a los S/ 27 millones programados. En cuanto al número de proyectos de inversión planificados, se contemplaron un total de 47, de los cuales únicamente 26 recibieron recursos para su implementación a lo largo del año.

TABLA 14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS (P)
(EN SOLES Y %, A DICIEMBRE 2025)

Fuente de financiamiento	PIM	Ejecución (en soles)	Ejecución (en %)
Donaciones y transferencias	18,959,244	6,714,187	35.4%
Recursos directamente recaudados	8,057,047	1,941,489	24.1%
Total	27,016,291	8,655,676	32.0%


Fuente: SIAF – ETES
Con información al 09 de abril del 2026

Es necesario mencionar que, en el caso de las empresas pequeñas, la mayor fuente de financiamiento de sus inversiones son las Donaciones y transferencias que reciben de terceros. Estas empresas dependen en mayor medida de donaciones y transferencias como fuente de financiamiento de sus inversiones. En este grupo de empresas, se diferencia EMUSAP (Chachapoyas) donde su principal fuente de financiamiento son los recursos directamente recaudados, es decir, las tarifas cobradas a los usuarios.

Respecto al nivel de ejecución, ESP RIOJA se posiciona en primer lugar con un avance del S/ 2.5 millones, seguidos por EPS NOR PUNO con S/ 2.4 millones, y AGUAS DEL ALTIPLANO, que alcanza una ejecución de S/ 1.1 millones.

Entre las empresas pequeñas (P), la empresa prestadora EMAPAVIG S.A. tuvo con 10 proyectos de inversión y solo 4 de ellos tuvieron algún tipo de desembolso o ejecución presupuestal en el 2025. Por su parte, EPS CHANKA tiene una cartera de 8 proyectos de inversión, de los cuales se ejecutaron 2. Finalmente, en tercer lugar, la EPS HUANCANELICA tiene una cartera de 6 proyectos de inversión y 3 de estos con algún grado de ejecución.

GRÁFICO 28. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS EMPRESAS PEQUEÑAS (M)

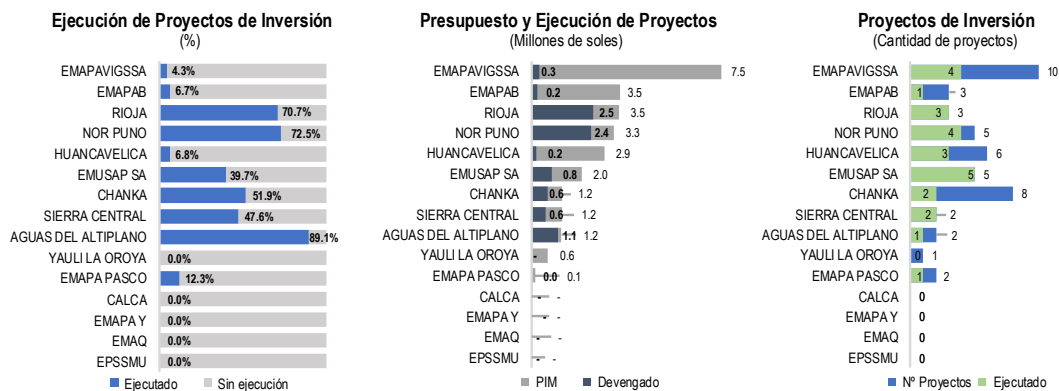

Fuente: SIAF – ETES
Con información al 09 de abril del 2026

En este contexto, se observa que Aguas del Altiplano lidera el nivel de ejecución anual con un 89.1 %, seguida por Nor Puno con 72.5% y EPS Rioja con 70.7%. Aguas del Altiplano alcanzó un alto nivel de ejecución financiera con solo dos proyectos programados, de los cuales ejecutó uno, lo que facilita el cumplimiento de metas al tratarse de un portafolio reducido. En comparación, Nor Puno y Rioja presentan una mayor carga de proyectos y, aun así, muestran una relación más equilibrada entre el número de proyectos ejecutados y la ejecución presupuestal, lo que refleja un esfuerzo de gestión más exigente.

A nivel histórico, entre las empresas prestadoras pequeñas (P) vienen logrando un mayor nivel de ejecución de sus proyectos de inversión como AGUAS DEL ALTIPLANO, EPS NOR PUNO y EPS RIOJA en 2025. Cabe señalar que, EPS CALCA, EMAPA-Y, EMAQ Y EPSSMU son empresas prestadoras que no cuentan con proyectos de inversión.

TABLA 15. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS (P)
(%AVANCE)

Empresa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AGUAS DEL ALTIPLANO	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%	61.5%	82.5%	90.6%	0.0%	0.0%	0.3%	87.8%
NOR PUNO	0.0%	0.0%	0.0%	82.2%	100.0%	0.0%	83.9%	1.1%	49.2%	88.2%	56.7%
RIOJA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	61.2%	92.8%	86.7%	0.0%	2.6%	10.5%	32.3%
EMUSAP SA	1.2%	85.7%	100.0%	26.2%	29.8%	13.3%	41.6%	57.3%	23.8%	70.3%	19.0%
EMAPAVIGSSA	22.3%	82.5%	28.6%	11.1%	0.8%	0.9%	0.0%	0.0%	14.0%	6.8%	12.0%
HUANCAVELICA	0.9%	0.0%	6.6%	4.2%	18.7%	24.4%	5.2%	15.8%	38.4%	26.8%	11.5%
SIERRA CENTRAL	0.0%	0.0%	0.0%	3.5%	0.0%	13.4%	32.3%	18.5%	27.8%	7.0%	8.3%
CHANKA	0.0%	0.0%	0.0%	13.3%	40.2%	71.2%	40.7%	56.2%	46.8%	31.6%	3.8%
YAULI LA OROYA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.7%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
CALCA	0.0%	0.0%	0.0%	28.1%	97.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
EMAPAB	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	26.4%	0.0%	10.6%	61.1%	20.2%	7.1%	0.0%
EMAQ	10.1%	63.5%	0.0%	53.3%	7.5%	0.0%	59.1%	99.3%	85.9%	0.0%	0.0%
YUNGUYO	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
EMAPA PASCO	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.7%	33.8%	28.8%	12.8%	15.7%	8.8%	0.0%
EPSSMU	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	48.9%	0.0%	87.8%	13.5%	46.3%	83.1%	0.0%

Fuente: SIAF – ETES

Con información al 09 de abril del 2026

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA

En este extremo, varias entidades no registran ejecución alguna, pese a contar con recursos asignados, lo que representa una pérdida de oportunidades para el desarrollo local. Esta situación pone en evidencia la necesidad de mejorar la capacidad operativa y de gestión de inversiones a nivel institucional.

De otro lado, la ejecución de cada una de las inversiones programadas para el 2025 de las empresas pequeñas se muestra en el Anexo N° 2 con relación al Reporte regulatorio 15 sobre el seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de Inversión.



6. EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL ESTUDIO TARIFARIO EN EL 2025

En un **tercer nivel**, se examina la programación y ejecución de las inversiones específicamente previstas en el Estudio Tarifario de cada empresa prestadora. Este análisis comprenderá tanto las inversiones ejecutadas por año regulatorio, así como las inversiones acumuladas al mes de diciembre de 2025, con base en la información remitida de las empresas prestadoras a través del Sistema de Contabilidad Regulatoria.

Así, en esta sección, se proporciona información detallada de cada empresa prestadora acerca del avance en la ejecución de las inversiones del estudio tarifario, así como el estado de las inversiones programadas en los estudios tarifarios desde el inicio del período regulatorio hasta diciembre de 2025.

En el caso de las empresas que se acogieron al Procedimiento de revisión tarifaria en el marco de la Resolución de Consejo Directivo N.º 016-2020-SUNASS-CD, para el cálculo del avance de las inversiones no se consideran los montos de inversión determinados en los informes correspondientes a los periodos remanentes menores a un año regulatorio, sino que se utilizó el monto de inversión original del estudio tarifario.

Adicionalmente, se realizó reuniones con las empresas prestadoras por parte de la DRE donde se solicitó la información de los proyectos priorizados de cada una de éstas, a fin de realizar el seguimiento de la situación proyecto por proyecto.

6.1 Sedapal

El programa de inversiones de Sedapal S.A. para el Periodo regulatorio 2022 - 2027 correspondiente a los servicios de agua potable, alcantarillado, así como al monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, asciende a **S/ 1,963 millones**. De dicho monto, **S/ 1,885 millones** corresponde a inversiones financiadas mediante los servicios de agua potable y alcantarillado, mientras que **S/ 78,0 millones** están destinadas a inversiones para el monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas.

Respecto a las **inversiones financiadas por los servicios de agua potable y alcantarillado**, las inversiones con cargo al Fondo de inversiones ascienden a **S/ 1,724 millones**, de los cuales S/ 1,651 corresponde a inversiones vinculadas a los servicios de agua potable y alcantarillado, mientras que S/ 73,2 millones están destinadas a proyectos del uso conjuntivo relacionadas con el servicio de Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas. Asimismo, **S/ 62,4 millones** serán destinadas a la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y **S/ 98,4 millones** a acciones de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD).


En relación con las inversiones financiadas con cargo al Fondo de inversiones, Sedapal ejecutó **S/ 150 millones** en inversiones de agua potable y saneamiento durante el 2025, lo que representa un **avance anual de 48.1%** respecto de los **S/ 311.6 millones** programados para el cuarto (4) año regulatorio del periodo regulatorio 2022-2026, sin considerar las inversiones ejecutadas con cargo a otras reservas, tales como MRSE y GRD.

Cabe señalar que los valores presentados en este reporte corresponden a la **ejecución presupuestal** del gasto en la fase de devengo¹⁰, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

Finalmente, el **avance acumulado de ejecución es de 60.7%** respecto del monto de inversión total programado para el periodo regulatorio vigente financiadas con el **Fondo de Inversiones**, considerando la información a diciembre del 2025.

¹⁰ De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, a fase de Devengado corresponde a la fase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia del respectivo compromiso contraído.

GRÁFICO 29. SEDAPAL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO ENE. 2022 A DIC. 2026)

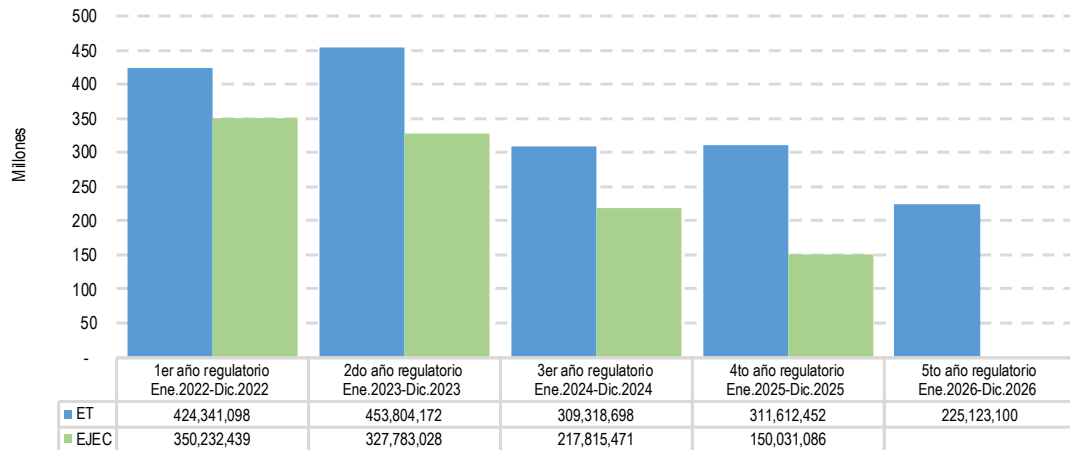

Donde:


ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario

EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDAPAL - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2022-Dic.2022	2do año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	3er año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	4to año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	5to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026
SEDAPAL S.A. Ene.2022-Dic.2026	82.5%	72.2%	70.4%	48.1%	0%

SEDAPAL - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: SEDAPAL


Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

De acuerdo con el Reporte Regulatorio N° 15 "Seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de inversión" remitido por la empresa prestadora, respecto de la ejecución de inversiones y medidas de mejora correspondiente al 2025 (4to año regulatorio), financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

El proyecto **"Esquema Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camote - Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 - distrito Lurigancho y San Antonio de Huarochiri"** (con CUI 2423031) ejecutó un monto de S/ 42.2 millones en 2025. Este proyecto beneficiará a 88,507 habitantes. Según la última actualización registrada, el costo de inversión actualizado asciende a S/ 1,217.9 millones y tiene un **avance físico de 41.9%**. La **Etapla 1** comprende en el sistema de agua potable, la construcción de una línea de impulsión de 35.9 km, construcción de un reservorio, construcción de redes de distribución (245.4 km) y 19,145 conexiones de agua potable con medidor. Asimismo, en el sistema de alcantarillado considera la construcción de colectores primarios (38.9 km) y secundarios (203.2 km) y 19,145 conexiones de alcantarillado, cuya ejecución ha culminado. Por su parte, la **Etapla 2**, correspondiente al tratamiento de aguas residuales, se encuentra

financiada mediante el Contrato de Préstamo BMZ N° 2008 66 277 y recursos propios de Sedapal, y considera la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) La Atarjea, de tipo Lodos activados con una capacidad de Q=900 lps en su primera etapa y Q=1,200 lps en la segunda etapa, con un nivel de tratamiento Categoría 3 Riego de vegetales y bebida de animales. Asimismo, incluye la construcción de un emisor y el equipamiento electromecánico de la PTAR, entre otros componentes.

IMAGEN 1. ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE POR SEDAPAL

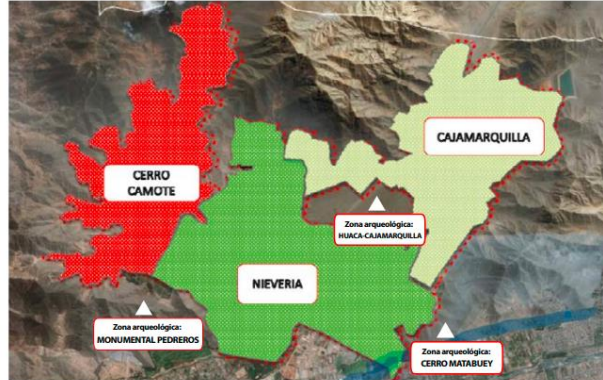

Fuente: Infraestructura para el desarrollo Volumen 3, no. 4 (BID)

Además, el proyecto **“Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los sectores 348, 349 y 351 - Collique - en los distritos de Comas y Carabaylo de la provincia de Lima - departamento de Lima”** (con CUI 2286612), ejecutó un monto de S/ 33.8 millones en el 2025. Dicho proyecto considera en el sistema de agua potable la construcción de 5 reservorios apoyados (con una capacidad de 1,750 m³); ampliación de 4 reservorios existentes; y, la construcción de 2 cisternas (con una capacidad total de 200 m³), construcción de muro de contención (5.2 km), instalación de redes primarias (13.5 km) y secundarias (36.5 km), 2,826 conexiones de agua potable con medidor, colectores primarios (1.2 km) y secundarios (32.9 km) y 2,562 conexiones de alcantarillado. Finalmente, este proyecto beneficiará a más de 18,972 habitantes.

IMAGEN 2. PROYECTO COLLIQUE EN ZONAS DE COMAS Y CARABAYLLO EJECUADO POR SEDAPAL



Fuente: Sedapal

Asimismo, el proyecto **“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacútec – Etapa III”** (con CUI 2403089) ejecutó un monto de S/ 25,5 millones en 2025. De acuerdo con el Sistema de Seguimiento de inversiones del MEF, el proyecto considera en el sistema de agua potable la línea de conducción Chillón II (12.5 km), la línea de interconexión del ramal norte con línea de refuerzo Sistema Chillón (9.5 km), redes secundarias (296.9 km), 30,828 conexiones de agua potable con micromedidores, y el equipamiento e instalaciones hidráulicas. En el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, el proyecto consideró redes de alcantarillado (323.7 km), 30,828 conexiones de alcantarillado, así como la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con una capacidad de 0.42 m³/s, así como un colector de descarga proyectado sumergido en el mar.

La PTAR Pachacútec fue culminada en noviembre de 2023 y en 2024, entró en fase de puesta en marcha, con un período de pruebas operativas y ajustes realizados por la empresa constructora. Esta fase se extendió por 12 meses para garantizar el óptimo funcionamiento de la PTAR. Desde enero de 2025, la operación de la PTAR Pachacútec se encuentra a cargo de SEDAPAL, a través del Equipo Gestión Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (EG-PTAR). Finalmente, en agosto de 2025, el Macroproyecto Pachacútec Etapa III se encuentra culminado, con un avance financiero de ejecución contractual de 95.68%.

IMAGEN 3. PTAR PACHACUTEC EJECUTADO POR SEDAPAL



Fuente: CUI 2403089: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACÚTEC – ETAPA III"

Es importante destacar el proyecto **"Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema Santa Rosa y Ancón distritos de Santa Rosa y Ancón"** (con CUI 2031100), que alcanzó una ejecución financiera de S/ 10.9 millones en 2025. El costo actualizado del proyecto asciende a S/ 127.4 millones (última actualización en enero de 2026) y un avance físico de obra del 89.1%. Este proyecto beneficiará a 52,007 personas. El proyecto considera en el sistema de agua potable la construcción de redes primarias (24.4 km) y secundarias (59.7 km), 2,846 conexiones domiciliarias convencionales y 1,635 conexiones domiciliarias condominiales, construcción y equipamiento de un reservorio (como saldo de obra). Por su parte, en el sistema de alcantarillado considera la implementación de 1 cámara de bombeo, colectores primarios (13.7 km) y secundarios (80.9 km de redes convencionales y 42 km de redes condominiales), construcción y equipamiento de 1 cámara de bombeo de aguas residuales, así como 4,525 conexiones domiciliarias convencionales de alcantarillado y 1,635 conexiones domiciliarias condominiales.

Finalmente, el proyecto **"Obras complementarias ramal norte (lote 6 - obras complementarias - planta Huachipa)"** o **"Mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima"** con CUI 2443481 se ejecutó un monto de S/ 17.1 millones. El conjunto del proyecto se encuentra recepcionado y en funcionamiento, salvo el contrato de Obra Llave en Mano - Suma Alzada N°13-2008-CW-2920/JBIC-SEDAPAL, Lotes 1, 2 y 3 - Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa y Ramal Norte, que se encuentra en un proceso de Laudo Arbitral judicializado y el Contrato de Obra N° 014-2010-CW32930/JICA/SEDAPAL "Lote 6 - Obras Complementarias a los Lotes 1, 2 y 3". Ambos proyectos se encuentran recepcionado y en funcionamiento. Cabe indicar, que parte de dicho proyecto, actualmente se viene ejecutando la obra "Reparación Definitiva de la Bocatoma del Sistema Huachipa, y Adecuación y Corrección de Vicios Ocultos, Averías, y/o Defectos del Proyecto Lotes 1, 2 y 3 Bocatoma, PTAP Huachipa y Ramal Norte".

Por otro lado, según lo establecido en el numeral IV.4 del Informe N° 073-2023-SUNASS-DRT-ESP, se autorizó a SEDAPAL S.A. el uso de los saldos remanentes del Fondo de Inversión en Saneamiento para el pago de la deuda del proyecto **"Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 y 301 - Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador"** con CUI 2305241 (en adelante Proyecto Nueva Rinconada), siempre que no afecte el

financiamiento de los proyectos del Estudio Tarifario 2022-2027, según lo dispuesto en el procedimiento de revisión excepcional realizado en 2023.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora por la empresa prestadora, el proyecto continúa en ejecución durante 2025, con un monto ejecutado de **S/ 230 millones** en 2025, con importantes avances en la mejora de la infraestructura de agua potable y alcantarillado en Lima sur.

Con respecto al Proyecto Nueva Rinconada - Etapa I, éste avanza en distintos frentes:

- **Frente 1** (*Línea Ovni-Ford*): La obra está concluida al 100%, con un avance financiero del 98.11%. Esta obra fue recepcionada por SEDAPAL el 12 de febrero de 2025.
- **Frente 2** (*Esquema Villa Maria y Nueva Esperanza*): Presenta un avance físico del 65.35%. El avance financiero acumulado es de 85.627%.

Por otro lado, el Proyecto Nueva Rinconada – Etapa II (esquema Pamplona), se encuentra en la elaboración del expediente técnico: estudios de vulnerabilidad y análisis de riesgos y desastres, estudios de diagnóstico en arqueología, estudios de impacto ambiental y metrados, presupuesto y programación de obras. Cabe señalar que, esta etapa no fue considerada en el procedimiento de revisión excepcional.

El proyecto Nueva Rinconada Etapa 1 Frente 2 contempló inicialmente:

Sistema de Agua Potable

- La construcción y mejoramientos de 29 reservorios, 1 cisterna, 1 cámara de derivación y 2 cámaras de sectorización.
- Instalación de 5,023.45 ml de nuevas líneas de conducción.
- Instalación de 31,155.78 ml de líneas de impulsión.
- Instalación de 62,695.68 ml de nuevas Troncales Estratégicas.
- Instalación de 133,813.28 ml de redes proyectadas y 324,098 ml de redes mejoradas
- Instalación de 8,757 conexiones proyectadas y 35,017 conexiones mejoradas.

Sistema de Alcantarillado

- Mejoramiento de 5 cámaras existentes de desagüe.
- Instalación de 8,186.33 ml de colectores principales proyectados y 24,033.92 ml de colectores principales mejorados.
- Instalación de 1,707.15 ml de línea de impulsión
- Instalación de 1,621.57 ml de la línea de rebose.
- Instalación de 58,574.03 ml de redes secundarias proyectadas y 306,576.76 ml de redes secundarias mejoradas.
- Instalación de 9,985 conexiones proyectadas y 34,091 conexiones mejoradas

IMAGEN 4. CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE BOMBEO EN EL PROYECTO NUEVA RINCONADA DE SEDAPAL



Fuente: CUI 2305241: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 y 301 - Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador" Etapa 1-Frente 2.

IMAGEN 5. CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN EL PROYECTO NUEVA RINCONADA DE SEDAPAL

**Avance en la construcción de reservorio RRP-04
(V=20,000 m3)**



Avance en la construcción de reservorio RRP-6 (V=500 m3)




Fuente: CUI 2305241: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 y 301 - Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador" Etapa 1-Frente 2.

Sin embargo, durante la ejecución del proyecto el sistema de agua potable, se vio modificado, por ejemplo, las redes finalmente comprenden 29 736 metros de líneas de impulsión, 4 907 metros de líneas de conducción, 60 667 metros de líneas troncales y 2 966 metros de líneas provisionales. Estas obras permitirán mejorar la capacidad de transporte y distribución del recurso hídrico, fortaleciendo la continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable en las zonas de intervención.


En conjunto, a abril de 2026, las obras ejecutadas de las líneas de agua potable alcanzan un avance acumulado de 98 276 metros, lo que representa un avance acumulado total de 96,4 % respecto de las metas programadas para el proyecto.

IMAGEN 6. LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y REDES EN EL PROYECTO NUEVA RINCONADA DE SEDAPAL

Líneas de agua potable (primarias)

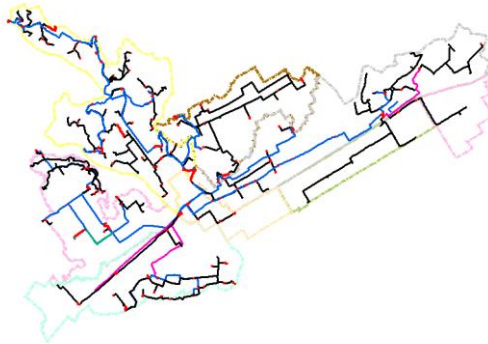

Redes de agua potable

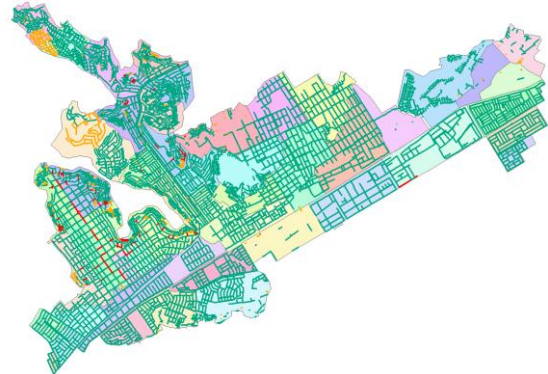


Fuente: Visita técnica de Sunass al proyecto CUI 2305241: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 y 301 - Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador" Etapa 1-Frente 2.

Respecto al sistema de redes de alcantarillado, el proyecto contempla la ejecución de 9 138 metros de colector proyectado y la intervención de 25 909 metros de colector mejorado, orientados a optimizar la capacidad de conducción y la continuidad operativa del sistema de alcantarillado. Estas intervenciones permitirán fortalecer la infraestructura existente y reducir riesgos de colapso y aniegos en las zonas beneficiadas.


A abril de 2026, las obras ejecutadas de las líneas de alcantarillado registran un avance acumulado total de 96,4 %, respecto de las metas programadas para el proyecto.

IMAGEN 7. COLECTORES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL PROYECTO NUEVA RINCONADA DE SEDAPAL

Líneas de alcantarillado (colectores)

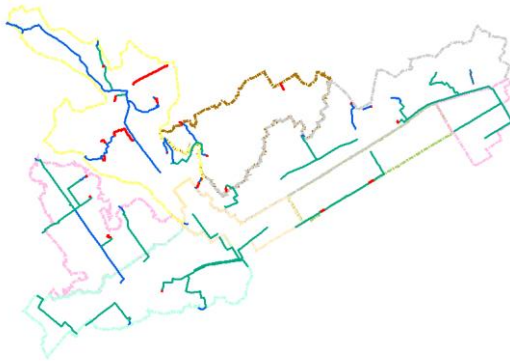

Redes de alcantarillado

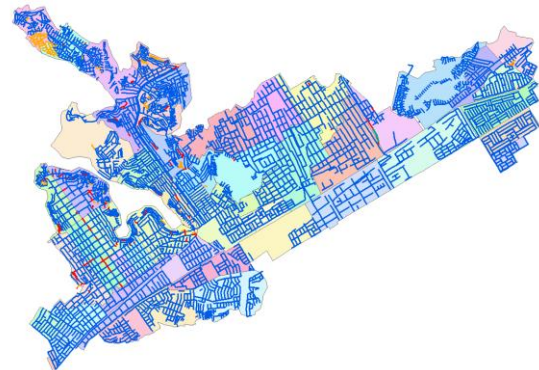

Fuente: Visita técnica de Sunass al proyecto CUI 2305241: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 y 301 - Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador" Etapa 1-Frente 2.

TABLA 16. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE SEDAPAL S.A.

CUI o SNIP	Nombre del proyecto	Presupuesto programado ET 2022-2026	Presupuesto total actualizado a diciembre 2025	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance (acumulado)	Año de ejecución según ET	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación	Situación del proyecto
2423031	Esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote - Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 - distrito de Lurigancho y San Antonio de Huarochiri	371,704,177	1,217,873,968.85	88,507	Obra en ejecución Avance físico: 41.9%	Año 3, año 4 y año 5	Oct-2016	Dic-2031	Etapa 1: Obra recepcionada, en operación, pendiente de liquidación final de obra por haberse concluido el trato directo. Etapa 2: En ejecución de obras al 9.45%
2286612	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los sectores 348, 349 y 351 - Collique - en los distritos de Comas y Carabayllo	132,887,713	148,232,778	18,972	Obra en ejecución Avance físico: 77.7%	Año 1, año 2 y año 3	Jun-2022	Jun-2026	Obra en ejecución. La obra al 24 de marzo del 2026, tiene un avance total físico ejecutado de 77.71%
2389329	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el esquema Los Chancas - La Encalada, distrito de Santa Anita - provincia de Lima - departamento de Lima; distrito de El Agustino - provincia de Lima - departamento de Lima	116,948,209	140,855,228.15	1,101,220	Obra en ejecución Avance físico: 0.0%	Año 1, año 2 y año 3	May-2024	Oct-2025	Autorización sobre la ejecución de obra de aprovechamiento hídrico que consiste en la perforación de 07 pozos para el proyecto: Esquema Chancas. Sin embargo, el proyecto no se encuentra priorizado en el presupuesto.
2403089	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el Macro proyecto Pachacutec del distrito de Ventanilla - Etapa 3 - PTAR	108,741,528	1,079,538,858.73	212,112	Obra en ejecución Avance físico: 97.9%	Año 1 y año 2	Jul-2013	Set-2024	Etapa N°01 Obra culminada y recepcionada (Nov.2017). Etapa N°02 Obra culminada y recepcionada (Nov.2017) Etapa N°03 Ejecución de Obra (finalizado en Nov.2023) Puesta en Marcha (Feb.2024). Puesta en Servicio en Jul.2025 y la PTAR a cargo de Sedapal

Nota:
 ET: Estudio tarifario
 Fuente: SEDAPAL y el Sistema de Seguimiento de Inversiones del INVIERTE.pe
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

6.2 Empresas Prestadoras Grandes 1


A continuación, se reporta la ejecución de inversiones programadas en los estudios tarifarios vigentes durante el 2025 de las empresas prestadoras Grandes 1.

EPS SEDAPAR

El programa de inversiones de EPS SEDAPAR S.A para el Periodo regulatorio 2021-2026 asciende a **S/ 415.7 millones**. De este monto, **S/ 394.1 millones** corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 13.7 millones corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y S/ 8.0 millones a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La ejecución de inversiones de SEDAPAR con recursos propios (financiados con el fondo de inversiones), como parte del estudio tarifario, ascendió a S/ 31.7 millones en el cuarto año regulatorio (noviembre 2024 a octubre 2025), lo cual representa **un nivel de ejecución anual de 41.0%**. Mientras que, en el quinto año regulatorio (noviembre 2025 a diciembre 2025) ascendió a S/ 4.98 millones, lo cual representa un nivel de ejecución de 8.1% para lo que va del quinto año regulatorio.

GRÁFICO 30. SEDAPAR - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET (PERIODO REGULATORIO NOV. 2021 A OCT. 2026)

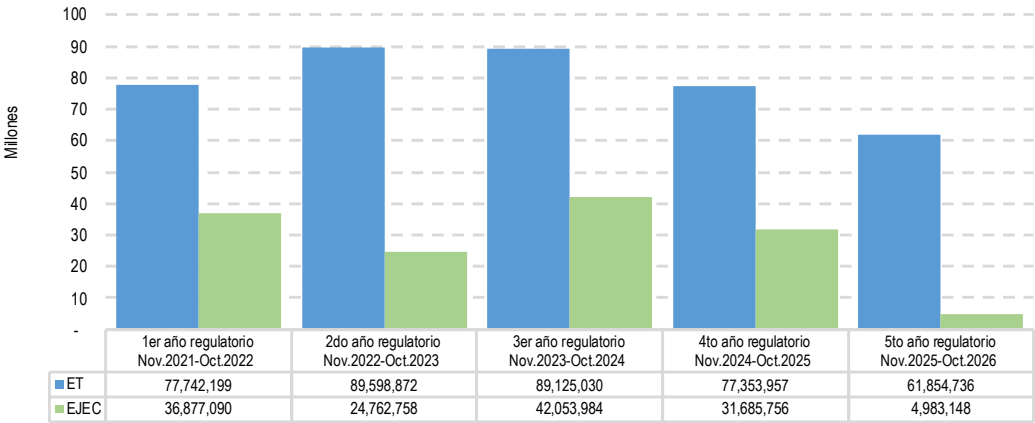


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDAPAR - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Nov.2021-Oct.2022	2do año regulatorio Nov.2022-Oct.2023	3er año regulatorio Nov.2023-Oct.2024	4to año regulatorio Nov.2024-Oct.2025	5to año regulatorio Nov.2025-Oct.2026
SEDAPAR S.A. Nov.2021-Oct.2026	47.4%	27.6%	47.2%	41.0%	8.1%

SEDAPAR - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Además, el **avance acumulado de ejecución es de 35.5%** respecto a la inversión total programada en el periodo regulatorio vigente financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.


Cabe señalar que los valores presentados en este reporte corresponden a la ejecución presupuestal del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio N° 15 "Seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de inversión" remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (4to año regulatorio), financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

El proyecto **"Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en los distritos de Socabaya, Sabandia y Characato de la provincia de Arequipa - departamento de Arequipa"** con CUI 2479971, tuvo una ejecución de S/ 15.5 millones. Este proyecto se encuentra en ejecución; sin embargo, se indica que se presenta conflictos sociales en su ejecución. Se tiene programado un monto de PIM para el 2026 de S/ 10.8 millones. De acuerdo con el formato N° 08, el sistema de abastecimiento cono sur este - etapa 1 considera la construcción de una línea de conducción (20.7 km) y derivaciones y empalmes (R49, R10, R33, N14, R14, R20, R32, R34, R35, R36), mientras que el sistema de abastecimiento cono sur este - etapa 2 considera la construcción de línea de conducción (PTAP-N49A) y, la reparación y renovación de reservorios (N14, N32, R34, R35, R36, N39, N49, R14, R20, N38, N41, N39, N40), así como la rehabilitación de reservorios (N14, N32, R34, R35, R36).

IMAGEN 8. PLANO DE SECTORIZACIÓN EN EL PROYECTO SOCABAYA, SABANDIA Y CHARACATO DE SEDAPAR

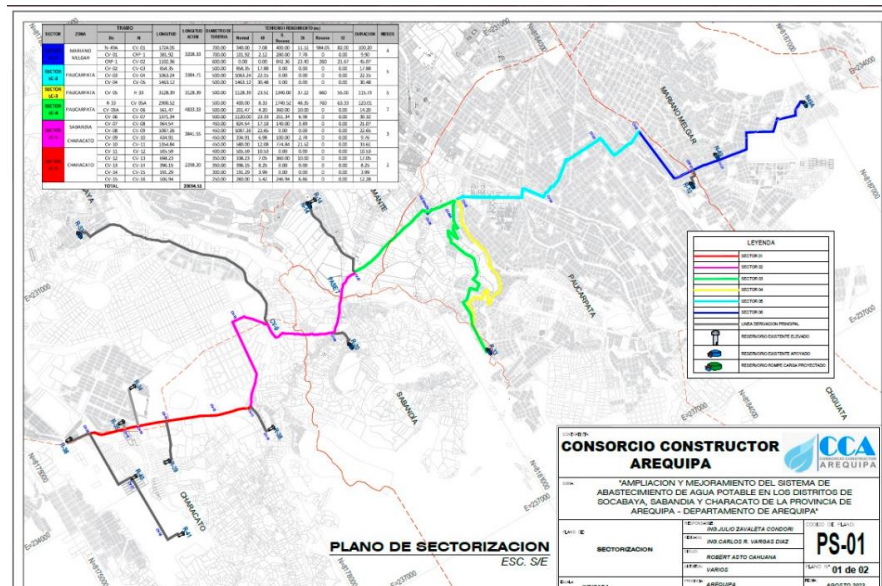


Fuente: CUI 2479971 "Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en los distritos de Socabaya, Sabandia y Characato de la provincia de Arequipa - departamento de Arequipa"

Asimismo, el proyecto **"Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano en la micromedición de Arequipa metropolitana, distrito de Arequipa de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa"** con CUI 2555627, tuvo una ejecución ascendente a S/ 9.2 millones en el 2025. De acuerdo con el Formato N° 07-A referido a la viabilidad del proyecto

(aprobado en 1/06/2023), se extrae que consiste en la adquisición e instalación de 1 752 040 medidores en Paucarpata, Characato, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Uchumayo, Tiabaya, Arequipa, Mariano Melgar, Jose Luis Bustamante y Rivero, Yanahuara, Sachaca, Yura, Cayma, Sabandia, Alto Selva Alegre, Chiguata, Miraflores, Socabaya. Así como la realización de 18 talleres de Educación sanitaria.

Respecto del proyecto **“Renovación de red secundaria y colector secundario; en el(la) tramo desde la calle Pucallpa hasta Av. Independencia, distrito de Socabaya, provincia Arequipa, departamento Arequipa”** con CUI 2574099, se ejecutó un monto ascendente a S/ 1.9 millones en el 2025. El expediente técnico del proyecto fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia General N° 35334-2024/S-30000. El proyecto consiste en el reemplazo de 1.26 km de redes secundarias y la renovación de 1.47 km de colectores secundarios, la renovación de 87 conexiones domiciliarias de alcantarillado. Este proyecto se inició su ejecución en febrero de 2025 y culminó en octubre de 2025. El avance físico de la inversión asciende a 99%. La obra se encuentra ejecutada, se han aprobado dos adicionales. Se realizaron pruebas hidráulicas, ensayos de laboratorio de mezclas asfálticas y verificaciones técnicas, cuyos resultados confirmaron que los trabajos cumplen con los parámetros exigidos. A la fecha la obra se encuentra con el acta de recepción conforme entre la entidad y la contratista.

IMAGEN 9. PLANO DE INTERVENCIÓN EN SOCABAYA EJECUTADO POR SEDAPAR

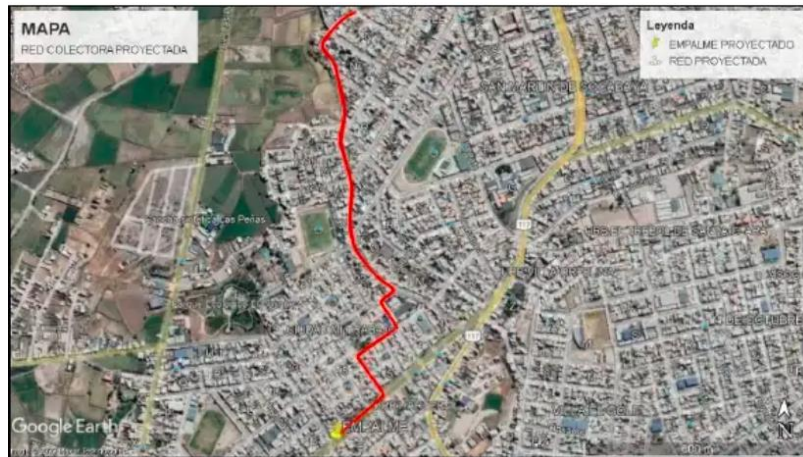

Fuente: CUI 2574099 “Renovación de red secundaria y colector secundario; en el(la) tramo desde la calle Pucallpa hasta Av. Independencia, distrito de Socabaya, provincia Arequipa, departamento Arequipa”

Finalmente, el proyecto **“Adquisición de micro medidores; en el(la) sistema de agua potable Mollendo, segunda fase, distrito de Mollendo, provincia Islay, departamento Arequipa”** con CUI 2687433, se ejecutó un monto ascendente a S/ 0.59 millones en 2025. El proyecto tiene un avance financiero de 50.2% del costo total de la inversión ascendente a S/ 1.2 millones. Dicho proyecto involucra en su segunda fase la adquisición de 5,945 medidores, accesorios e instalación de medidores.

TABLA 17. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE SEDAPAR S.A.

CIU o SNIP	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Estudio Tarifario	Costo de inversión actualizado (Dic - 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero (acumulado)	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2382190	Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de los distritos de Sachaca, Tiabaya y la localidad de Congata, distrito de Uchumayo- Arequipa" (AQP-16)	63,041,227	131,373,740.19	ND	Convocatoria para ejecución del saldo de obra	May-2025	Dic-2026
2479971	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en los distritos de Socabaya, Sabandia y Characato de la provincia de Arequipa - departamento de Arequipa - I Etapa (AQP-15)	49,734,177	145,882,692.89	275,452	En ejecución de obra. Se presentan conflictos sociales (39.4%)	Jun-2023	Ene-2026
2555627	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano en la micromedición de Arequipa Metropolitana, distrito de Arequipa de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa (AQP-85)	23,542,722	38,641,129.2	42,990	En ejecución (36.4%)	Jul-2023	Dic-2026
2455634	Mejoramiento y ampliación de los colectores (en la zona av. Venezuela, av. La Marina y av. Alfonso Ugarte) del sistema de recolección de aguas residuales de Arequipa Metropolitana en los distritos de Arequipa, Jacobo hunter y Sachaca de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa (AQP-17)	20,740,005	47,195,895.26	233,629	Elaboración de expediente técnico	Ene-2024	Mar-2028
2375720	Ampliación y mejoramiento del sistema de colectores de alcantarillado en los distritos de Characato, Sabandia y Socabaya de la provincia de Arequipa - departamento de Arequipa (AQP-20)	19,944,617	24,633,261.93	8,992	Adecuación de los Términos de referencia del proyecto (1.7%)	Dic-2021	ND

Fuente: SEDAPAR y el Sistema de Seguimiento de Inversiones del INVIERTE.pe
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Asimismo, se identifican problemas comunes como procesos de selección desiertos, demoras administrativas, falta de autorizaciones, y en algunos casos, reformulación de expedientes técnicos. Estos factores han afectado la continuidad de los proyectos y comprometen el cierre de brechas en cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento.

Identificación de riesgos realizada por SEDAPAR:

En la **etapa de formulación del expediente técnico** de los proyectos de saneamiento existen diversos riesgos que pueden comprometer la calidad del diseño, los plazos de ejecución y la sostenibilidad de las inversiones. Entre los principales riesgos técnicos destacan los estudios básicos incompletos, situación que constituye una de las principales causas de adicionales de obra en las empresas prestadoras. Ello incluye la existencia de interferencias no identificadas, tales como colectores, acometidas y redes antiguas que no cuentan con planos actualizados, así como diseños que no son validados oportunamente por las áreas de Producción y Operaciones, generando problemas posteriores relacionados con presiones, pérdidas de agua o colapsos del sistema. Asimismo, son recurrentes los errores en los metrados de excavaciones, tuberías, cámaras y equipamiento electromecánico.

En el **ámbito administrativo**, los riesgos se relacionan principalmente con la descoordinación entre las áreas de Ingeniería, Operaciones y Producción, así como con las demoras en la aprobación de los expedientes técnicos y la definición de plazos insuficientes para la elaboración de estudios de calidad. A ello se suman riesgos contractuales vinculados a términos de referencia deficientemente formulados y contratos que no establecen adecuadamente las responsabilidades, alcances y mecanismos de control del servicio.

Respecto de los **procesos de selección** en las empresas prestadoras, los riesgos administrativos y legales se manifiestan en bases con errores o vacíos técnicos, lo que genera un elevado número de consultas y observaciones por parte de los postores. Asimismo, pueden presentarse impugnaciones ante el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes - OECE o procesos declarados desiertos debido a estimaciones incorrectas de precios referenciales. Desde el punto de vista técnico y de mercado, es frecuente la participación de postores sin experiencia específica en proyectos de saneamiento, así como una limitada concurrencia en procesos altamente especializados. Del mismo modo, las variaciones de mercado en materiales como PVC, HDPE y acero pueden ocasionar una subvaloración del presupuesto de obra. Otro factor recurrente corresponde a las demoras en el desarrollo de los procesos de selección.

TABLA 18. MATRIZ DE RIESGOS EN INVERSIONES ANALIZADO POR SEDAPAR S.A.

Ítem	Etapas	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
01	Formulación del Expediente Técnico	Estudios básicos incompletos (causa de más del 60% de adicionales en EPS):	Probable	Alto	Alto
02		Interferencias no identificadas (colectores, acometidas, redes antiguas sin planos).	Muy probable	Alto	Alto
03		Diseños no validados por Producción y Operaciones (problemas reales: presiones, pérdidas, colapsos).	Probable	Alto	Alto
04		Errores en metrados de excavaciones, tuberías, cámaras, EM.	Poco probable	Medio	Medio
05		Descoordinación entre Gerencia de Ingeniería, Operaciones y Producción.	Probable	Alto	Alto
06		Aprobaciones tardías del ET.	Muy probable	Alto	Alto
07		Plazos insuficientes	Probable	Alto	Alto
08		TDR mal formulados	Probable	Alto	Alto
09		Contratos mal formulados	Probable	Alto	Alto
10	Proceso de Selección	Bases con errores → consultas/observaciones abundantes.	Probable	Alto	Alto
11		Impugnaciones ante OSCE.	Poco probable	Alto	Medio
12		Desiertos por precios mal estimados.	Probable	Alto	Alto
13		Postores sin experiencia en saneamiento (muy común).	Probable	Alto	Alto
14		Participación mínima por procesos muy especializados.	Muy probable	Alto	Alto
15		Subvaloración del presupuesto ante variaciones de mercado (PVC, HDPE, acero).	Probable	Alto	Alto
16	Ejecución de Obra	Demora en el Proceso de Selección	Casi seguro	Muy alto	Muy alto
17		Adicionales y deductivos por deficiencias en el ET.	Probable	Alto	Alto
18		Fallas en pruebas hidráulicas.	Poco probable	Muy alto	Alto
19		Interferencias con redes existentes antiguas o no registradas.	Muy probable	Muy alto	Muy alto
20		Retrasos por reposiciones de pavimento (coordinar con municipalidad).	Muy probable	Muy alto	Muy alto
21		Demoras en valorizaciones.	Muy probable	Alto	Alto
22		Deficiencia de supervisión (no especializada en saneamiento).	Probable	Muy alto	Alto
23		Falta de control de calidad en pruebas de compactación, conexiones, soldaduras.	Probable	Muy alto	Alto
24		Demora en obtención de permisos, licencias, servidumbres o similares	Casi seguro	Muy alto	Muy alto
25		Ampliaciones de plazo por interferencias o demoras en pagos.	Muy probable	Alto	Alto
26		Incumplimiento del cronograma valorizado del contratista.	Muy probable	Alto	Alto
27		Controversias por Metrados.	Muy probable	Medio	Alto
28		Cierre de vías genera conflictos vecinales → paralizaciones.	Muy probable	Muy alto	Muy alto
29		Reclamos por afectación al servicio durante derivaciones/suspensiones.	Muy probable	Alto	Alto

Fuente: SEDAPAR

Durante la **ejecución de las obras**, los riesgos técnicos comprenden la generación de adicionales y deductivos derivados de deficiencias en el expediente técnico, fallas en las pruebas hidráulicas e interferencias con redes existentes antiguas o no registradas. También son frecuentes los retrasos asociados a la reposición de pavimentos, debido a la

necesidad de coordinación con las municipalidades correspondientes. En el aspecto administrativo, destacan las demoras en el trámite de valorizaciones, las deficiencias en la supervisión especializada en saneamiento y la falta de control de calidad en pruebas de compactación, conexiones y soldaduras. Asimismo, pueden producirse retrasos en la obtención de permisos, licencias, servidumbres u otras autorizaciones requeridas para la ejecución de las obras.

En **materia contractual**, los principales riesgos están asociados a ampliaciones de plazo originadas por interferencias o retrasos en los pagos, incumplimientos del cronograma valorizado por parte del contratista y controversias vinculadas a metrados de obra.

Finalmente, en el **ámbito social**, el cierre de vías y las restricciones de tránsito suelen generar conflictos con la población y paralizaciones temporales de las obras, mientras que las derivaciones o suspensiones del servicio pueden ocasionar reclamos por afectación a los usuarios.


EPS GRAU

El programa de inversiones de la empresa prestadora Grau S.A. para el Periodo regulatorio 2022–2027, a ser financiado con recursos internamente generados por la EPS, asciende a **S/ 110,6 millones**, de los cuales S/ 76,3 millones (69%) están destinados para el servicio de agua potable y S/ 34,3 millones (31%) para el servicio de alcantarillado. No obstante, en el procedimiento de revisión excepcional, el programa de inversiones se modificó para lo que resta del cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2022–2027, y que asciende a **S/ 30,001,789** que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 14,975,898 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 6,084,153 corresponden a inversiones en mejoramiento y S/ 8,941,738 corresponden a inversiones institucionales.

En diciembre de 2025, la ejecución de inversiones de GRAU, con cargo al Fondo de inversiones, ascendió a S/ 2.3 millones en el cuarto año regulatorio (enero a diciembre 2025), lo cual representa un nivel de **avance de ejecución anual de 27%** de los S/ 11.4 millones programados en el procedimiento de Revisión Excepcional.

Cabe señalar que los valores presentados en este reporte corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 31. EPS GRAU - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2022 A DIC. 2026)

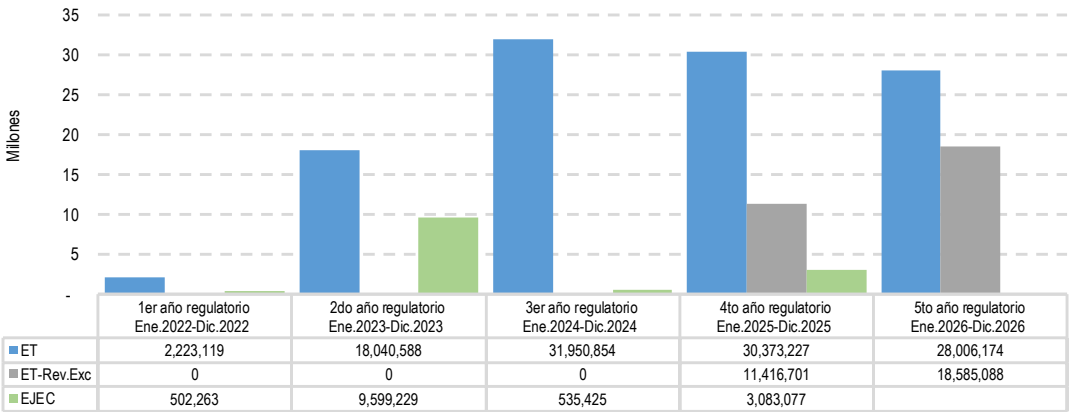


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

GRAU - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2022-Dic.2022	2do año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	3er año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	4to año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	5to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026
GRAU S.A. Ene.2022-Dic.2026	22.6%	53.2%	1.7%	27.0%	0%

GRAU - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Además, el **avance acumulado de ejecución es de 16.7%** respecto a la inversión total programada para el periodo regulatorio vigente financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre del 2025.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio N° 15 “Seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de inversión” remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (4to año regulatorio), financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

El proyecto **“Recuperación del sistema de producción de agua potable del pozo n°02 del distrito de Morropón - provincia de Morropón - departamento de Piura”** con CUI 2514509, tuvo una ejecución de S/ 1.9 millones en 2025. El proyecto comprende la perforación de un pozo tubular (pozo exploratorio, pruebas y análisis de pozo) y la construcción de 2,170.00 m de línea de impulsión de agua potable. El número de beneficiarios del proyecto serán 247,107 personas. En junio de 2024 se aprobó el expediente técnico de la obra (Resolución de Gerencia General N° 0211-2024-EPS GRAU S.A.-100-AT). A noviembre de 2025, el avance físico acumulado asciende a 95.74%, añadiendo que la obra estuvo suspendida desde el 14 de noviembre de 2025 y con fecha 06 de enero de 2026 se reiniciaron los trabajos de la obra¹¹.

Asimismo, el proyecto **“Renovación de colector primario, buzón y línea de impulsión; en el(la) sistema de alcantarillado ubicado en el dren 1308 A.H. La Primavera distrito de Castilla, provincia Piura, departamento Piura”** con CUI 2658408, tuvo una ejecución de S/ 0.62 millones en el 2025. El proyecto consiste en la renovación 707.80 metros de colector primario, 8 buzones y 62.20 metros de línea de impulsión. Mediante Contrato N° 048-2025-EPS GRAU S.A.-100-AT, de fecha 11/11/2025, se suscribe el contrato de ejecución de la obra, por el monto de S/ 2,437,529.62 (incluido IGV), con el contratista. Con fecha 01/12/2025 se realiza el acto de entrega de terreno y el 03/12/2025 se inicia la ejecución de la obra. A diciembre de 2025, el avance físico acumulado asciende a 21.28%.

Asimismo, el proyecto **Renovación de tubería y buzón; en el(la) sistema de alcantarillado entre av. Piura desde pasaje Los Incas hasta cámara de bombeo de aguas residuales n°1 distrito de Mancora, provincia Talara, departamento Piura”** con CUI 2607904, tuvo una ejecución de S/ 0.18 millones en el 2025. Mediante Resolución de Gerencia General N° 211-2025-EPS GRAU S.A.-100-AT, de fecha 15/07/2025 se aprueba el expediente técnico de la obra. Luego, se suscribe el Contrato N° 049-2025-EPS GRAU S.A.-100-AT, de fecha 21/11/2025 para la ejecución de la obra. Con fecha 17/12/2025 se inició a la ejecución de la obra. La obra al mes de enero del 2026 tiene un avance físico acumulado de 64.43% con respecto al cronograma valorizado de obra.

¹¹ Información remitida mediante el Oficio N° D000439-2026-EPS GRAU S.A.-GG.

TABLA 19. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE GRAU S.A.


CUI o SNIP	Proyectos	Presupuesto en el Estudio Tarifario	Presupuesto actualizado (dic 2025)	Beneficiario (habitantes)	Nivel de avance financiero (acumulado)	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2514509	Recuperación del sistema de producción de agua potable del Pozo N°02 del distrito de Morropón - provincia de Morropón - Departamento de Piura.	2,235,405	2,659,376.86	13,191	En ejecución (77.7%)	May-2025	Ago-2025
2658408	Ejecución de obra: renovación de colector primario, buzón y línea de impulsión; en el(la) sistema de alcantarillado ubicado en el dren 1308 A.H. La Primavera distrito de Castilla, provincia Piura, departamento Piura	1,759,899	2,712,463.01	ND	En ejecución de obra / adquisición de bienes y servicios (33.7%)	Set-2025	Dic-2025
2607904	Renovación de tubería y buzón; en el(la) sistema de alcantarillado entre av. Piura desde pasaje los incas hasta cámara de bombeo de aguas residuales n°1 distrito de Mancora, provincia Talara, departamento Piura	795,794	823,895.03	ND	En ejecución de obra (32.9%)	Dic-2025	Mar-2026

Fuente: EPS GRAU y el Sistema de Seguimiento de Inversiones del INVIERTE.pe
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA – SUNASS

EPS SEDALIB

El programa de inversiones de SEDALIB S.A para el Periodo regulatorio 2021-2026 asciende a **S/ 344.2 millones**. De este monto, S/ 325.6 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios del Fondo de inversiones; S/ 12.7 millones corresponde a reservas para financiar la gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación del cambio climático (ACC); S/ 4.2 millones a reservas orientadas a la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) y S/ 1.7 millones corresponde a reservas a financiar el plan de control de calidad (PCC) y plan de adecuación sanitaria (PAS).

GRÁFICO 32. SEDALIB - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO ENE. 2022 A DIC. 2026)

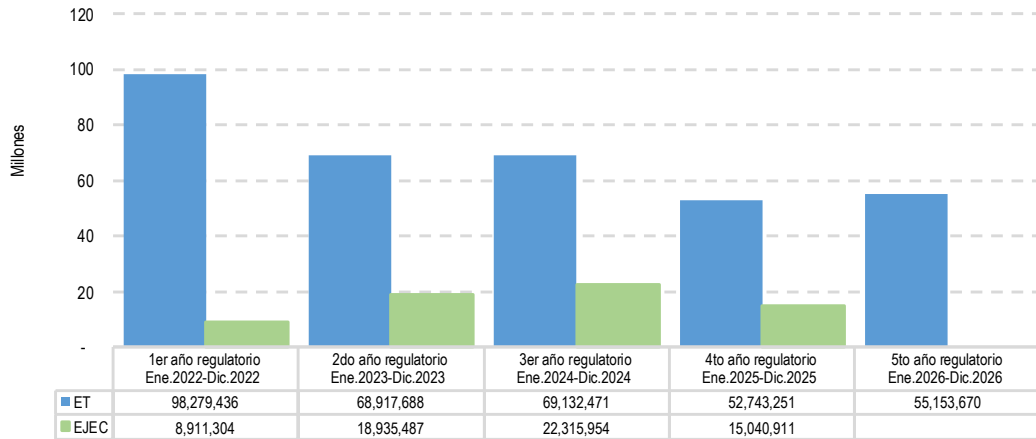


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDALIB - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2022-Dic.2022	2do año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	3er año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	4to año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	5to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026
SEDALIB S.A. Ene.2022-Dic.2026	9.1%	27.5%	32.3%	28.5%	0%

SEDALIB - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA – SUNASS

La ejecución de inversiones de SEDALIB, como parte del estudio tarifario financiados con recursos propios del Fondo de inversiones y reservas, ascendió a S/ 15.0 millones en el cuarto año regulatorio (enero a diciembre de 2025), lo cual representa un **nivel de avance de ejecución anual de 28.5%** respecto a los S/ 52.7 millones programados en el Estudio Tarifario.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

Además, el **avance acumulado de ejecución es de 18.9%**¹² respecto a la inversión total programada para el periodo regulatorio vigente financiadas con el Fondo de Inversiones y reservas, con información a diciembre del 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** (pero próximo al umbral de eficaz) en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio N°15 “Seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de inversión” remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (4to año regulatorio), financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

El proyecto **“Mejoramiento redes de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario de la urb. Primavera, distrito de Trujillo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad”** con CUI 2115955, ejecutó un monto de S/ 3.2 millones en 2025. El costo de inversión actualizado asciende a S/ 10,381,083.31 (en mayo de 2025), con un avance de financiero de 69.6%. No obstante, el proyecto se encuentra en arbitraje. El proyecto en el sistema de agua potable consiste en la construcción de la red secundaria: Suministro e instalación de 8,589.67 ml de tubería HDPE PE100 ISO 4427 DN 110-160-200-315 mm SDR17-PN10 por electrofusión. Suministro e instalación de 176 accesorios de HDPE por electrofusión. Suministro e instalación de 752 conexiones domiciliarias incluye accesorios. Suministro e Instalación de 752 micromedidores DN 15 (1/2") tipo chorro único Q3=2.5 R125 NMP 005-2018 con sus respectivos accesorios de control. En el sistema de alcantarillado sanitario consistió: el Suministro e instalación de 5,951.53 ml tubería PVC NTP 4435:2005 SN4 UF DN200. Suministro e instalación de 1,950.50 ml tubería PVC NTP 4435:2005 SN4 UF DN250. Construcción de 135 buzones de concreto. Instalación de 643 conexiones domiciliarias con tubería PVC NTP4435:2005 SN4 UF DN 160(6") incluye sus accesorios y cajas domiciliarias.

Respecto al Proyecto **“Mejoramiento del Servicio de Agua para Consumo Humano a través de Batería de Pozos en los Distritos La Esperanza Florencia de Mora y El Porvenir - Provincia De Trujillo - Departamento De La Libertad”** con CUI 2329112, este proyecto se encuentra en etapa de elaboración de expediente técnico. El costo total de inversiones asciende a S/ 26,417,716.00 en la declaración de viabilidad (12/04/2017). El proyecto considera el Componente 1: Comprende el sistema de captación de agua, el cual será a través de **12 Pozos Tubulares**, e instalaciones Electromecánicas, y Automatización de Pozos; el Componente 2: líneas de impulsión de agua potable Comprende el tendido de tubería de PVC - PN 10, desde la profundidad de los 12 pozos proyectados, conectándose entre sí, las cuales el Pozo 1 al 5 se impulsará a una cámara de carga de 200 metros cúbicos; y del Pozo 6 al 12 impulsará hasta el Reservorio Los Gemelos (Pesqueda), entre otros.

Respecto al Proyecto **“Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario del distrito El Porvenir nor este - Trujillo”** con CUI 2148032, este proyecto se encuentra en etapa de contratación del servicio para la elaboración de expediente técnico. El proyecto consiste en la Etapa I la construcción de una captación subterránea y en la Etapa II la construcción de una línea de impulsión (2.98 km), la construcción de un reservorio (con una capacidad de 1,100 m3) y la construcción de una línea de aducción 0.64 km.

Respecto al Proyecto **“Mejoramiento y ampliación de las redes de alcantarillado sanitario en el sector parque industrial - distrito de La Esperanza - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad”** con CUI 2475709, este proyecto considera la construcción de un colector primario de una longitud de 5.4 km y la construcción de redes de alcantarillado 916 metros

¹² SEDALIB presento información adicional que modifica la ejecución de inversiones de los años previos.

lineales. A noviembre de 2024, el proyecto tuvo un avance físico de 90%y actualmente la obra se encuentra en liquidación de la supervisión.

TABLA 20. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE SEDALIB S.A.

CUI	Nombre del proyecto	Presupuesto Estudio Tarifario	Presupuesto actualizado (dic 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero (acumulado)	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2329112	Mejoramiento del Servicio de Agua para Consumo Humano a través de Batería de Pozos en los Distritos La Esperanza Florencia de Mora y El Porvenir - Provincia De Trujillo - Departamento De La Libertad	34,171,892.3	26,417,716.00	446,931	Elaboración de expediente técnico (4.4%)	Abr-2018	ND
2148032	Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario del distrito El Porvenir nor este - Trujillo	8,838,114	8,706,348.24	13,429	En elaboración de Expediente técnico (1.5%)	Dic-2025	Mar-2026
2115955	Mejoramiento redes de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario de la urb. Primavera, distrito de Trujillo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad	8,030,399	10,381,083.31	20	En arbitraje (69.6%)	Mar-2024	Abr-2025
2475709	Mejoramiento y ampliación de las redes de alcantarillado sanitario en el sector parque industrial - distrito de La Esperanza - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad	7,266,596	11,669,985.06	847	Liquidación de la supervisión (96.6%)	Set-2023	Abr-2024
2331655	Instalación de interceptor Pumacahua -El Porvenir-Trujillo	4,939,202	5,765,633.34	73,015	0%	2018	ND
2424184	Mejoramiento del emisor tramo entre la calle Las Huertas y la planta de tratamiento de la localidad de Paiján- distrito de Paiján - provincia de Ascope - departamento de La Libertad	3,949,855	4,660,829.11	24,924	Liquidación de la supervisión (60.6%)	Mar-2022	Set-2022

Fuente: EPS SEDALIB S.A.

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

EPS EPSEL

El programa de inversiones de EPSEL S.A., para el periodo regulatorio 2025–2028, asciende a **S/ 112 691 845** que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 43 964 360 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 17 903 577 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 38 821 172 corresponden a inversiones institucionales, S/ 5 824 604 corresponden a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria, S/ 4 780 068 corresponde a inversiones relacionadas a la gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, y S/ 1 398 064 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

La ejecución de inversiones de EPSEL, como parte del estudio tarifario financiados con recursos propios del Fondo de inversiones, ascendió a S/ 9.5 millones en el primer año regulatorio (enero a diciembre de 2025), con el Fondo de Reserva para el Plan de Control de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria (PCC & PAS), por la suma de S/ 2,298,979.94; con el Fondo de Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD & ACC), por el importe de S/ 578,582.94. Lo cual representa un nivel de avance de **ejecución anual de 55.0%** respecto a lo programado en el Estudio Tarifario.

Además, el **avance acumulado de ejecución es de 11.0%** respecto a la inversión total programada en el periodo regulatorio vigente financiadas con el Fondo de Inversiones y reservas, con información a diciembre de 2025. Se precisa que, dicho porcentaje no considerar la información de las inversiones del Estudio Tarifario 2018-2023.

Cabe señalar que los valores presentados en este reporte corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.


Asimismo, EPSEL¹³ precisa que, durante el año 2025, se ejecutó proyectos correspondientes al **Estudio tarifario 2018-2023** que no fueron ejecutados durante dicho periodo regulatorio, por el monto de S/ 1,815,126.90.

En ese sentido, EPSEL indica que durante el primer año regulatorio (2025), ejecutó inversiones por un total de S/ 14,161,867.81, considerando el Fondo de inversiones, reservas e inversiones del periodo regulatorio anterior (periodo de transición).

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

¹³ Remitido a la Sunass mediante el Oficio N° 620-2026-EPSEL S.A.-GG e Informe N° 116- 2026-EPSEL S.A.-GG/GDP.

GRÁFICO 33. EPSEL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2028)

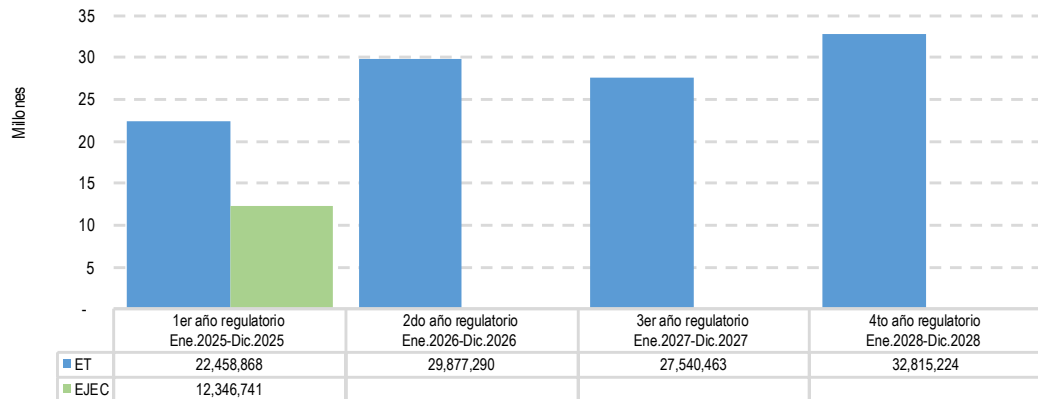


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EPSEL - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028
EPSEL Ene.2025-Dic.2028	55.0%	0%	0%	0%

EPSEL - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

De acuerdo con el Reporte Regulatorio N°15 "Seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de inversión" remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio), financiados con recursos del **Fondo de inversiones**, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

La Ficha 11-C-133 **"Adquisición e instalación de medidores por reposición, para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en el ámbito de EPSEL S.A."** por un monto de S/ 1 millón en el 2025.

La 11-C-143 **"Adquisición de registrador de datos de presión por telemetría - data logger"** por un monto de S/ 4.5 millones en el 2025.


EPS TACNA

El programa de inversiones de la EPS Tacna S.A., para el periodo regulatorio 2024–2028, asciende a **S/ 81,372,634** que serán financiados con recursos internamente generados por la empresa prestadora; de los cuales S/ 8,185,460 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 55,114,620 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 18,072,554 corresponden a inversiones institucionales, S/ 2,034,375 corresponde a inversiones relacionadas a la gestión de Riesgos de Desastres y S/ 1,476,000 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

La ejecución de inversiones de la EPS TACNA S.A. financiado por recursos del Fondo de inversiones, como parte del estudio tarifario, registra **un avance anual de 51.0%** en 2025 respecto de los S/ 15.8 millones programados en el Estudio Tarifario.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 34. EPS TACNA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2024 A DIC. 2028)

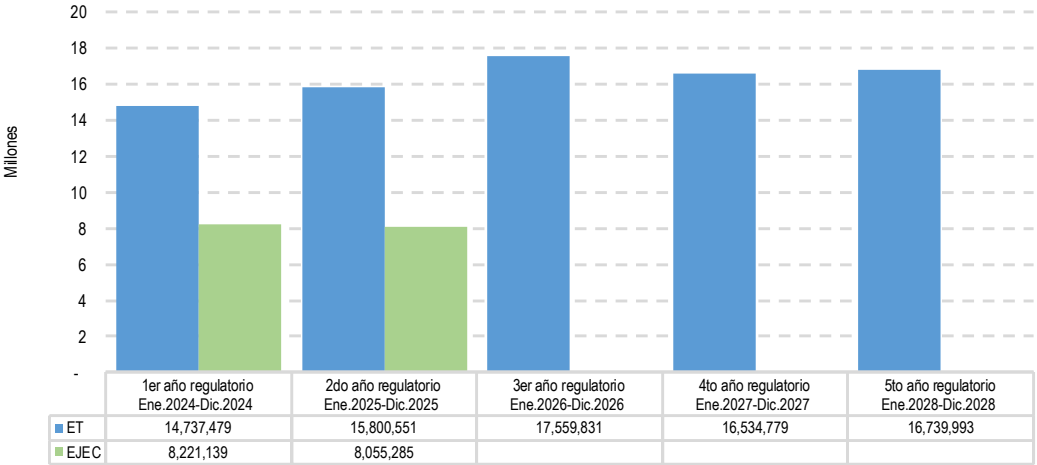


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

TACNA - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	2do año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	3er año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	4to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	5to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028
EPS TACNA Ene.2024-Dic.2028	55.8%	51.0%	0%	0%	0%

TACNA - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Además, el **avance acumulado de ejecución es de 20.0%** respecto a la inversión total programada para el periodo regulatorio vigente financiadas con el Fondo de Inversiones y reservas, con información a diciembre del 2025.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** prestadoras según su programación de inversiones y su ejecución presupuestal, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** (pero próximo al umbral de eficacia) en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio N° 15 “Seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de inversión” remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (2do año regulatorio), financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

El proyecto **“Adquisición de sistema de información; en el(la) catastro comercial georeferenciado de redes de agua potable y alcantarillado de la entidad prestadora de servicios de saneamiento Tacna S.A. distrito de Tacna, provincia Tacna, departamento Tacna”** con CUI 2625550, tuvo una ejecución de S/ 1.4 millones en el 2025. El costo de la inversión actualizada asciende a S/ 2,539,082, con un avance financiero de 67%.

Asimismo, el proyecto **“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable mediante la instalación de micromedidores en el distrito de Locumba-provincia Jorge Basadre y en los distritos de Tacna y Pachia de la provincia de Tacna - departamento de Tacna”** con CUI 2473288, tuvo una ejecución de S/ 1.4 millones en el 2025. El costo de inversión actualizado S/ 15,216,000.00, con un avance financiero de 40.9%. Dicho proyecto beneficiaría a 370,202 habitantes. El proyecto consiste en instalación de 38,949 micromedidores y la realización de 5 capacitaciones en el marco de Educación Sanitaria.

Finalmente, el proyecto **“Recuperación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la junta vecinal Guido Bacigalupo Costa del distrito de Tacna - provincia de Tacna - región Tacna”** con CUI 2370397, tuvo una ejecución de S/ 2.7 millones en el 2025. El costo de inversión actualizado asciende a S/ 3,756,553.91, con un nivel de avance financiero de 76.8%. El proyecto consiste en renovación de redes de agua potable (3 km) y renovación de redes de alcantarillado (3.9 km).

TABLA 21. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE TACNA S.A.,

CUI, SNIP u otros	Nombre del proyecto	Presupuesto Estudio Tarifario	Presupuesto actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2473288	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable mediante la instalación de micromedidores en el distrito de Locumba-provincia Jorge Basadre y en los distritos de Tacna y Pachia de la provincia de Tacna, departamento de Tacna	12,405,386	15,216,000.00	370,202	III etapa recepcionada (40.9%)	Ene-2020	Ene-2027
2480447	Recuperación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la Junta Vecinal Los Lirios de Ceoavi del distrito de Tacna, provincia de Tacna, departamento de Tacna	6,108,070	6,742,903.71	3,305	Elaboración de expediente (0.3%)	Nov-2021	ND
2410984	Recuperación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la Junta Vecinal Barrio Miraflores del distrito de Tacna, provincia de Tacna, departamento de Tacna	4,280,862	4,384,668.99	2,038	Culminada. En proceso de recepción (67%)	Jul-2024	Dic-2024
2410987	Recuperación del servicio de agua potable y alcantarillado en la Junta Vecinal Los Cipreces del CPM Augusto B. Leguía del distrito de Tacna, provincia de Tacna, departamento de Tacna	4,054,891	4,550,129.77	3,740	En ejecución (0.6%)	Set-2019	ND

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS


EPS SEDACUSCO

El programa de inversiones de SEDACUSCO S.A. para el Periodo regulatorio 2019 – 2024 con recursos internamente generados, asciende a **S/ 137 152 334** de los cuales el 87% está destinado para el servicio de agua potable y el 13% para el servicio de alcantarillado. Cabe mencionar que, la empresa prestadora se encuentra en **periodo de transición** por factores ajenos tanto a la propia empresa prestadora como a la Sunass.

La ejecución de inversiones de SEDACUSCO, financiado con el Fondo de inversiones en el marco del estudio tarifario, **alcanzó el nivel de ejecución acumulada de inversiones de 52.3%** de su Periodo regulatorio comprendido entre enero de 2020 y diciembre de 2024, según información al cierre de diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 35. SEDACUSCO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2020 A DIC. 2024)

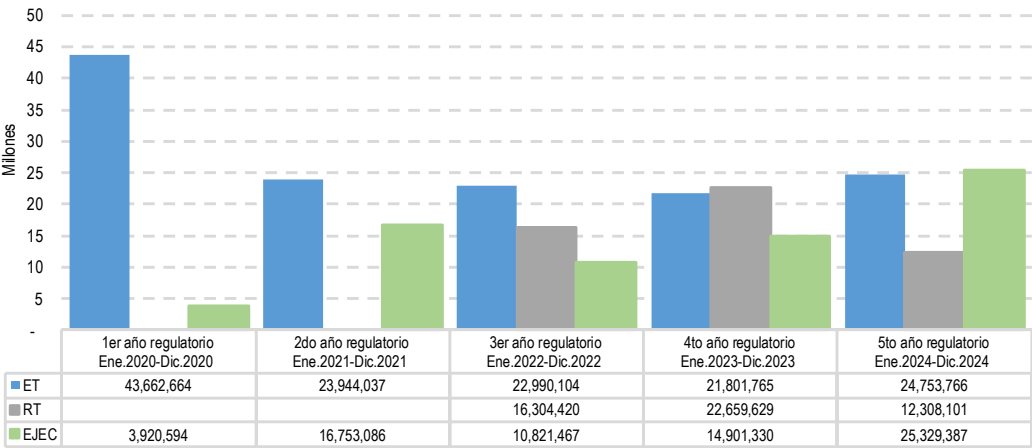


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 RT: Revisión Tarifaria - modificación del programa de inversiones
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDACUSCO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2020-Dic.2020	2do año regulatorio Ene.2021-Dic.2021	3er año regulatorio Ene.2022-Dic.2022	4to año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	5to año regulatorio Ene.2024-Dic.2024
SEDACUSCO Ene.2020-Dic.2024	9.0%	70.0%	66.4%	65.8%	205.8%

SEDACUSCO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Por otro lado, la empresa SEDACUSCO S.A. aclara que su falta de calificación en el presente Reporte de Inversiones no se debe a un incumplimiento directo, sino a que actualmente se encuentra en un periodo de transición mientras espera la aprobación de su nuevo Plan Maestro Optimizado (PMO). Esta situación limita la ejecución y programación de nuevas inversiones. Además, la empresa recuerda que en el reporte anterior fue calificada como "ordenada y eficaz", lo que demuestra su capacidad técnica y operativa.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio N° 15 "Seguimiento de la ejecución financiera de los proyectos de inversión" remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (periodo de transición), financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

Respecto al proyecto **"Sistema de Pre-Tratamiento de Agua de la Laguna de Piuray – Cusco"** (con CUI 2391875), tiene un avance financiero de 101.6%. El proyecto consiste en la construcción de **200 lps** y contará con microtamices, filtros de avanzada, cámara de paso, cisterna, caseta de bombeo, 01 laboratorio de control de procesos, sala de dosificación, sala cloración, oficinas, almacén, lechos de secado, sistema de tratamiento de aguas residuales, tanque séptico mejorado, humedal artificial, entre otros componentes. Según el SSI del MEF, la obra se encuentra paralizado.

IMAGEN 10. PTAP PIURAY EJECUTADO POR SEDACUSCO



Fuente: CUI 2391875 "Sistema de Pre-Tratamiento de Agua de la Laguna de Piuray – Cusco"

Además, el proyecto **"Mejoramiento renovación de redes de agua potable ciudad del cusco 2019 - 2023 distrito de Cusco - provincia de Cusco - departamento de Cusco"** (con CUI 2395163) ha concluido la ejecución física en diciembre de 2023 (cuenta con liquidación). El expediente del proyecto fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°095-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A. Asimismo, el proyecto comprende la renovación de 25.2 km de redes secundarias.

Finalmente, el proyecto **"Renovación de red de alcantarillado; en el(la) sistema de alcantarillado periodo 2023-2024 distrito de Cusco, provincia Cusco, departamento Cusco"** (con CUI 2584631) ha concluido la ejecución física en diciembre de 2023 (cuenta con liquidación). El expediente del proyecto fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°095-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A. Asimismo, el proyecto comprende la renovación de 25.2 km de redes secundarias.

Sobre el proyecto **"Mejoramiento línea de interconexión sistema Vilcanota tramo punto B - reservorio Goripata en los distritos de Santiago, Cusco y Wanchaq de la provincia de Cusco - departamento de Cusco"** (con CUI 2448239) tiene un avance físico de 94.7% y la obra concluyó el 31/10/2025 con acta de conclusión de obra. Finalmente, el proyecto de inversión se encuentra finalizado al mes de marzo 2026. El proyecto consiste en la construcción de

una línea de conducción 5.4 km y el expediente técnico fue aprobado mediante la Resolución de Gerencia General N°329-2025-GG-EPS SEDACUSCO S.A.

IMAGEN 11. LÍNEA DE INTERCONEXIÓN SISTEMA VILCANOTA EJECUTADO POR SEDACUSCO



Fuente: CUI 2448239 " Mejoramiento línea de interconexión sistema Vilcanota tramo punto B - reservorio Goripata en los distritos de Santiago, Cusco y Wanchaq de la provincia de Cusco - departamento de Cusco"

TABLA 22. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE SEDACUSCO S.A.

CUI, SNIP u otros	Nombre del proyecto	Programación en la Revisión Excepcional	Presupuesto actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero (acumulado)	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2391875	Creación de la planta de pretratamiento de agua del sistema Piuray del distrito de Chinchero - provincia de Urubamba - departamento de Cusco	14,195,585	26,975,372.18	138,983	Paralizada (101.6%)	Set-2020	Nov-2025
2448239	Mejoramiento línea de interconexión sistema Vilcanota tramo punto B - reservorio Goripata en los distritos de Santiago, Cusco y Wanchaq de la provincia de Cusco - departamento de Cusco	15,035,845	23,241,104.87	187,628	Finalizado en Oct-2025. Para liquidación (85.3%)	Feb-2024	Oct-2025
2395163	Renovación de redes de agua potable ciudad del cusco 2020-2025	2,585,649	8,409,777.98	18,617	Proyecto concluido (66.4%)	Mar 2019	Dic 2023
2584631	Renovación de red de alcantarillado; en el(la) sistema de alcantarillado periodo 2023-2024 distrito de Cusco, provincia Cusco, departamento Cusco	1,961,147	4,508,158.75	ND	En ejecución (84.8%)	May-2024	Mar-2026
2561983	Construcción de sistema de descarga; en el(la) colectores de agua residual cinco distritos de la provincia Cusco, departamento Cusco	769,899	2,926,449.89	ND	Finalizado en Oct-2025. Para liquidación (87.8%)	Ago-2024	Oct-2025

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

Problemática identificada por las empresas prestadoras Grandes 1 en la ejecución de sus inversiones

- Sobre los Expedientes Técnicos (ET): Los ET son esenciales para la programación y ejecución de los proyectos de saneamiento, pero con frecuencia son observados por entidades nacionales, lo que podría retrasar la implementación de proyectos y aumentar los costos. Asimismo, los ET se desactualizan o generan adicionales de obra que no permiten su liquidación en los plazos establecidos.
- La falta de liquidaciones de los proyectos (que generan saldos de obra), los adicionales, entre otros, generan un alto número de procesos en arbitraje. Estos litigios prolongados no solo aumentan los costos operativos de las empresas, sino que también retrasan la ejecución de proyectos, lo que afecta la calidad y la disponibilidad de los servicios.
- Sobre la obtención de licencias: Los procedimientos de los gobiernos locales para la obtención de licencias y permisos para llevar a cabo los proyectos de saneamiento es, en algunos casos, lentos o costosos que resultan en retrasos en la ejecución de inversiones. Algunas empresas no tienen una Programación Multianual de Inversiones (PMI) por lo que dependen de los gobiernos locales para que sus proyectos sean inscritos en el Invierte.pe, y sigan el proceso de ejecución.
- Alto número de procesos de adjudicación declarados desiertos. Falta de competencia y de postores interesados en participar en los procesos de adjudicación de proyectos de inversión. Sin un ambiente competitivo, las empresas pueden carecer del incentivo necesario para mejorar la calidad de sus servicios y reducir los costos de los servicios provistos a las empresas prestadoras.
- Desarticulación de las áreas competentes de la empresa en lo que respecta a la ejecución de inversiones, lo que dificulta su correcta implementación.

6.3 Empresas Prestadoras Grandes 2

En esta sección, se presenta la ejecución de inversiones de las empresas prestadoras Grandes 2 financiados con cargo al Fondo de inversiones, correspondiente a diciembre de 2025. Del mismo modo la ejecución de las inversiones del estudio tarifario.

En esta sección se muestra para cada empresa prestadora del grupo grande 2 que cuentan con estudio tarifario vigente, la siguiente información:

- Monto de inversión programado para cada año del periodo regulatorio.
- Nivel de ejecución financiera por cada año del periodo regulatorio.
- Nivel de ejecución financiera durante el periodo regulatorio.


EMAPA SAN MARTIN

El programa de inversiones de EPS San Martín para el periodo regulatorio 2025-2029 asciende a **S/ 46 823 276**, que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 3 878 831 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 28 465 782 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 9 130 469 corresponden a inversiones institucionales, S/ 2 651 734 corresponde a inversiones relacionadas a la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC), S/ 2 696 460 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La ejecución de inversiones de EMAPA SAN MARTIN, registró un **avance anual de 4.6%** en el primer año regulatorio respecto al monto programado, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 36. EPS SAN MARTIN - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2029)

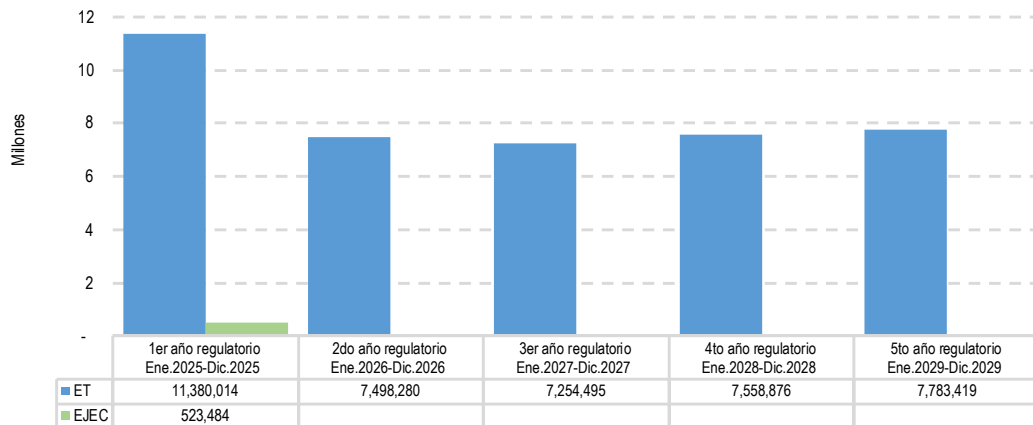


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SAN MARTIN - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028	5to año regulatorio Ene.2029-Dic.2029
SAN MARTIN Ene.2025-Dic.2029	4.6%	0%	0%	0%	0%

SAN MARTIN - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de la EPS SAN MARTÍN S.A., como parte del estudio tarifario, registra **un avance acumulado de 1.3%** respecto a las inversiones programadas para el periodo regulatorio vigente financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz**¹⁴ en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1 año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

La inversión IOARR **“Reparación de Captación de Agua, Sistema de Pretratamiento y Línea de Conducción en el Sistema de Producción de Agua Potable de la Oficina Zonal de Lamas”** (con CUI 2597065) con Resolución de Gerencia General N° 000125-2024-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 23/08/2024 se aprobó Expediente Técnico para la I etapa. Y el 11/12/2025 se suscribió el Contrato N°025-2025-EMAPA-SM-SA-GG para la ejecución de la inversión, por un monto ascendente a S/ 5,377,000.00 con un plazo de ejecución de 180 días calendario. Se encuentra con contrato de ejecución de obra de la I etapa. Entre las restricciones para la ejecución, se identifica la disponibilidad de terrenos para la línea de conducción.

De igual modo, la inversión IOARR **“Optimización del Sistema de Precloración, Cloración y Dosificación en las Plantas de Tratamiento de la Sede Central y Oficinas Zonales de Emapa San Martín S.A.”** (con CUI 2675114), que incluye a las oficinas de Picota, Bellavista, Saposo, San José de Sisa y Tarapoto. El proyecto con Expediente Técnico aprobado. Pendiente de incorporación para su ejecución en 2026.

Por su parte, la inversión **“Reparación de PTAP; Construcción de Caseta, Laboratorio y Cámara de Control en la Localidad de Lamas, distrito de Lamas, provincia de Lamas, departamento de San Martín”** (con CUI 2654060) cuenta con expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 000128-2024-EMAPA-SM-SA-GG con fecha 23/08/2024 y se encuentra en actos preparatorios para el proceso de selección.

Asimismo, la inversión IOARR **“Mejoramiento de los Procesos de la PTAP Saposo (Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Saposo)”**, registrada como **“Construcción de laboratorio; adquisición de equipo de laboratorio y equipo de ambientes de procesos operacionales; en el(la) Empresa municipal de servicios de agua potable y alcantarillado de San Martín S.A. distrito de Saposo, provincia Huallaga, departamento San Martín”** (con CUI 2652934), presenta un avance financiero de 2.9%.

¹⁴ El Reporte regulatorio 15 presentado por EMAPA SAN MARTÍN considera devengados negativos. Al respecto, se precisa que este reporte considera un seguimiento de la ejecución presupuestal, por lo que las conciliaciones entre presupuesto y la contabilidad se debe realizar en la columna “AJUSTES Y/O REGULARIZACIONES” del formato del mencionado reporte regulatorio.

TABLA 23. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SAN MARTÍN S.A.

CUI, SNIP u otros	Nombre del proyecto	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2597065	Reparación de captación de agua , sistema de pretratamiento y línea de conducción; en el(la) sistema de producción de agua potable de la oficina zonal de Lamas de Emapa San Martín S.A., distrito de Lamas, provincia Lamas, departamento San Martín	7,073,419.29	ND	I etapa en ejecución (13.2%)	Feb -2026	ND
2675114	Adquisición de sistema de tratamiento químico; en el(la) precloración, cloración y dosificación en las plantas de tratamiento de la Sede Central y oficinas zonales de Emapa San Martín S.A., distrito de Tarapoto, provincia San Martín, departamento San Martín	6,031,874.49	ND	En ejecución (0.5%)	Jun-2026	Oct-2026
2654060	Reparación de PTAP; construcción de caseta, laboratorio y cámara de control; en el(la) EMAPA SAN MARTIN S.A. de la localidad de Lamas distrito de Lamas, provincia Lamas, departamento San Martín	1,829,521.57	ND	En ejecución (2.6%)	Jun-2026	Ago-2026
2652934	Construcción de laboratorio; adquisición de equipo de laboratorio y equipo de ambientes de procesos operacionales; en el(la) Empresa municipal de servicios de agua potable y alcantarillado de San Martín S.A. distrito de Saposoa, provincia Huallaga, departamento San Martín	1,733,761.4	ND	Sin expediente técnico (2.9%)	ND	ND

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS


EPS SEDALORETO

El programa de inversiones total de la EPS Seda Loreto S.A. para el Periodo regulatorio 2022-2027 asciende a S/62.7 millones, de este monto, S/ 58.1 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 1.9 millones corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al cambio climático, S/ 684 mil a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), por ultimo S/ 1.9 millones orientados a la implementación del control de calidad.

Con información a diciembre de 2025, la ejecución de inversiones de SEDALORETO con cargo al Fondo de inversiones registró un **avance anual de 8.9%** para el tercer (3) año regulatorio (Dic-2024 y Nov-2025).

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 37. SEDALORETO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO DIC. 2022 A NOV. 2027)

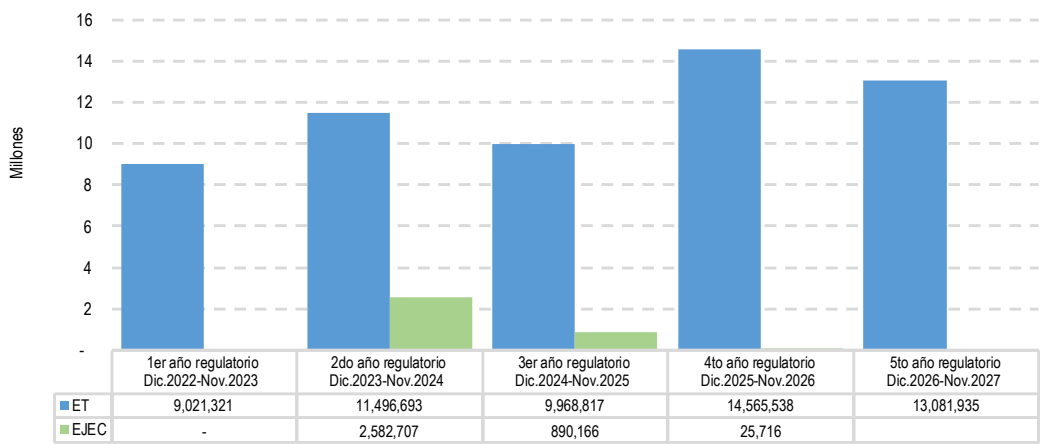


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDA SEDALORETO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO
 REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Dic.2022-Nov.2023	2do año regulatorio Dic.2023-Nov.2024	3er año regulatorio Dic.2024-Nov.2025	4to año regulatorio Dic.2025-Nov.2026	5to año regulatorio Dic.2026-Nov.2027
SEDALORETO Dic.2022-Nov.2027	0.0%	22.5%	8.9%	0.2%	0%

SEDALORETO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de la EPS SEDALORETO S.A., como parte del estudio tarifario, registra un **avance acumulado de 6.0%** respecto a lo programado para el periodo regulatorio, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3 año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

El proyecto ***“Reposición de Medidores para el mejoramiento del Sistema de medición de Agua Potable en la Ciudad de Iquitos”***, que cuenta con presupuesto programado de S/ 5,332,319 e inició su ejecución en el segundo semestre del 2024.

Asimismo, el proyecto ***“Cambio de Redes de distribución de la EPS Seda Loreto S.A. en zonas donde se modificó la Rasante de las calles - Distritos de Iquitos Belén Punchana y San Juan - Provincia de Maynas - Loreto”***, que cuenta con un presupuesto de S/ 1,930,531 e inició su ejecución en 2025.

En el marco del proyecto ***“Remodelación de Abastecimiento de Agua en la Prestación del Servicio de Agua Potable (Continuidad - Presión) para el Sector Crítico de Área de Influencia del R-3 Distrito de Punchana Maynas - Loreto Primera Etapa ”***, que se pretendía ejecutar por etapas, la inversión IOARR ***“Construcción de línea de aducción; en el(la) sector de Masusa y Bellavista Nanay distrito de Punchana, provincia Maynas, departamento Loreto”*** (con CUI N° 2632107); no obstante, esta IOARR perdió su vigencia.


EPS SEDACHIMBOTE

El programa de inversiones total de EPS SEDACHIMBOTE S.A para el Periodo regulatorio 2023-2028 asciende a **S/ 55.0 millones**. De este monto, S/ 48.5 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 2.1 millones corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación del Cambio Climático (ACC), S/ 2.5 millones a reservas orientadas a la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y S/ 1.9 millones a reservas para financiar el Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS).

La empresa SEDACHIMBOTE registró un **avance anual de 17.8%** respecto a lo programado para el tercer (3) año regulatorio del periodo regulatorio vigente, con cargo al Fondo de inversiones, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 38. SEDACHIMBOTE - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO SET. 2023 A AGO. 2028)

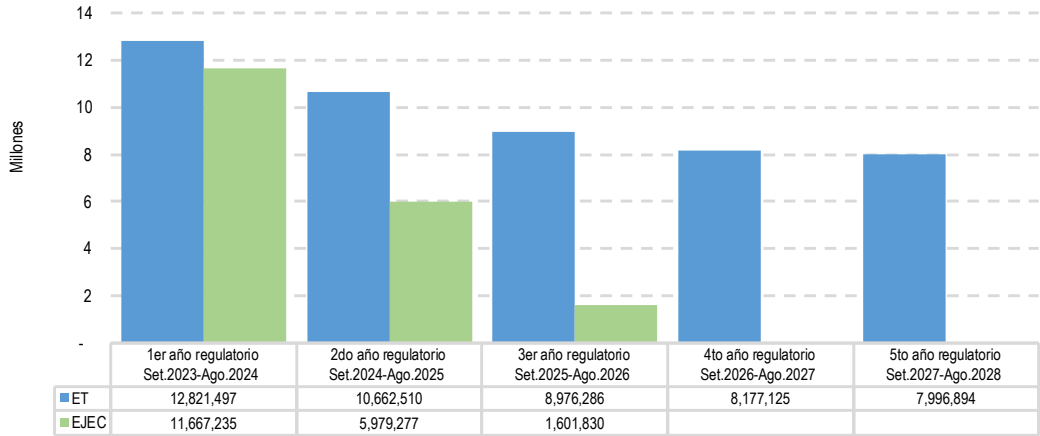

Donde:


ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario

EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDACHIMBOTE - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Set.2023-Ago.2024	2do año regulatorio Set.2024-Ago.2025	3er año regulatorio Set.2025-Ago.2026	4to año regulatorio Set.2026-Ago.2027	5to año regulatorio Set.2027-Ago.2028
SEDACHIMBOTE Set.2023-Ago.2028	91.0%	56.1%	17.8%	0%	0%

SEDACHIMBOTE - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., como parte del estudio tarifario, registra un **avance acumulado de 39.6%** respecto a lo programado para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3 año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

Sobre el proyecto **"Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano en la instalación de la línea de impulsión del pozo tubular N° 4, al reservorio R-IV, en el sector Monte Chimbote del distrito de Chimbote de la provincia de Santa del departamento de Áncash"**, con CUI 2515380. Esta inversión tenía previsto su culminación para el segundo año regulatorio con una inversión de S/ 4,440,109, a la fecha solo registra un avance financiero del 22.2% y un avance físico aproximado del 37.28%. La obra inicio en marzo del 2024, la cual beneficiaría a 45 mil habitantes de las zonas de Esperanza Baja, Primavera Alta y Baja, Santa Cruz, San Pedro, entre otros. El proyecto se encuentra paralizado tras la resolución total del Contrato N° 017-2023-SEDACHIMBOTE S.A., formalizada mediante la Resolución de Gerencia General N° 180-2024-SEDACHIMBOTE (del 26.08.2024). Dicha medida fue adoptada ante el incumplimiento contractual por parte del contratista.

Ante este escenario, la empresa prestadora llevó a cabo un nuevo proceso de selección y suscribió un contrato el 13/01/2025. El nuevo contratista ha solicitado el adelanto directo del 10% para el reinicio de las partidas pendientes y la adquisición de tubería de hierro dúctil de 400 mm.

La Empresa Prestadora se encuentra en proceso de liquidación del contrato con 2do contratista, debido a la falta de acuerdo sobre el saldo de obra y a las observaciones técnicas identificadas en la ejecución física. Ante este escenario, la empresa prestadora en octubre del 2025 contrató especialistas externos para realizar pruebas de control de calidad, incluyendo ensayos de resistencia del concreto, pruebas de estanqueidad, estudios de suelos y ensayos de diamantina.

IMAGEN 12. CREACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO TUBULAR N°4 AL RESERVORIO R-IV DE SEDACHIMBOTE



Fuente: CUI 2515380 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO TUBULAR N° 4, AL RESERVORIO R-IV, EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"

De acuerdo con el informe INGE N° 0159-2026 de fecha 11 de febrero de 2026, la Oficina de ingeniería y proyectos remite a la Gerencia técnica el resumen informativo referente a los

ensayos realizados en las ordenes de servicios 2500805, 2500806 y 500807 al proyecto de inversión con CUI 2515380. El consultor especialista determinó que, en las condiciones actuales de la ejecución paralizada de la inversión, esta no cumple con un diseño estructural adecuado que requiera una estructura hidráulica ubicada en una zona de alta sismicidad por lo que esta construcción debe ser demolida, ya que no presenta la seguridad estructural requerida siendo una estructura muy vulnerable.

Asimismo, sobre el proyecto **“Construcción de pozo de extracción y línea de impulsión; en el(la) empresa de servicio de agua potable y alcantarillado del Santa, Casma y Huarney sociedad anónima distrito de Casma, provincia Casma, departamento Áncash”**, con CUI: 2699005. El proyecto está programado su ejecución para el periodo de setiembre de 2025 a agosto de 2026 (tercer año regulatorio), con una inversión estimada de S/ 2,152,914. La obra iniciará en abril de 2026, la cual beneficiaría a 4 mil habitantes de las zonas de Casma media, alta y baja.

En noviembre de 2025, se contrató a la empresa contratista para la elaboración del expediente y la obtención de los permisos hídricos ante la Autoridad Nacional del Agua (Disponibilidad hídrica, Autorización de ejecución de obras y Licencia de uso de agua). Sin embargo, debido a retrasos que superaron el 10% del monto contractual por penalidades, el contrato fue resuelto en febrero de 2026 mediante la Resolución de Gerencia General N° 050-2026-Sedachimbote S.A. Bajo este nuevo cronograma de trabajo, se proyecta que la infraestructura del pozo y la línea de impulsión estarán operando en el mes de agosto de 2026 aproximadamente.

De otro lado, el proyecto **“Creación del pozo tubular N°23 en el sector Monte Chimbote del distrito de Chimbote - provincia de Santa - departamento de Áncash”**, con CUI 2515387, cuya ejecución estaba programada para el periodo de setiembre de 2023 a agosto de 2024 (primer año regulatorio) con una inversión estimada de S/ 1,661,126. El expediente técnico fue aprobado el 8/01/2024 mediante Resolución de Gerencia General N° 005-2024-Sedachimbote S.A. La infraestructura está operativa desde el 10 de octubre de 2025, habiéndose alcanzado satisfactoriamente el 100% de la ejecución física y financiera. Las pruebas de rendimiento confirman que el pozo mantiene una producción promedio de 51.7 litros por segundo, la cual beneficia a 15 mil habitantes de las zonas de Monte Chimbote y demás zonas aledañas.

IMAGEN 13. POZO TUBULAR DE SEDACHIMBOTE



Fuente: CUI 2515387 CREACIÓN DEL POZO TUBULAR N°23 EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

Finalmente, sobre el proyecto **“Mejoramiento del servicio de agua potable urbano en el pozo tubular N° 20 al reservorio III-B distrito de Chimbote de la provincia de Santa del departamento de Áncash”**, con CUI 2715505. Este proyecto se encuentra programado su ejecución para el periodo de setiembre de 2025 a agosto de 2026 (tercer año regulatorio), con una inversión estimada de S/ 1,254,382. La obra permitirá optimizar la aducción de agua hacia el Reservorio III-B en el distrito de Chimbote. En enero de 2026, la Empresa Prestadora procedió con la resolución del contrato de consultoría, debido a que el consultor presentó información técnica que no guardaba conformidad con los Términos de Referencia (TDR) establecidos. Ante esta deficiencia técnica, la EPS tomó la determinación de salvaguardar

los intereses de la entidad y la calidad del proyecto. Con el objetivo de mitigar retrasos, desde el 15 de enero de 2026, el equipo técnico de la EPS asumió la elaboración de los entregables pendientes. La elaboración del expediente técnico se estima para abril de 2026. Se proyecta que el sistema estará operativo en agosto de 2026. Esta intervención beneficiará a 4,232 habitantes, fortaleciendo la continuidad del servicio.

TABLA 24. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SEDACHIMBOTE S.A.,

CUI u otros	Nombre del proyecto	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2515380	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano en la instalación de la línea de impulsión del pozo tubular N° 4, al reservorio R-IV, en el sector Monte Chimbote del distrito de Chimbote de la provincia de Santa del departamento de Ancash.	6,981,626.98	20	Suspensión de ejecución. Contrato resuelto (22.2%)	Mar 2024	Ago 2024
2699005	Construcción de pozo de extracción y línea de impulsión; en el(la) empresa de servicio de agua potable y alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima distrito de Casma, provincia Casma, departamento Ancash	2,961,692.64	ND	Posible cierre del IOARR por no inició de ejecución (0%)	ND	ND
2515387	Creación del pozo tubular n°23 en el sector Monte Chimbote del distrito de Chimbote - provincia de Santa - departamento de Ancash	1,651,229.44	15,000	En proceso de liquidación (56.4%)	Mar 2024	Jun 2024

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS


EPS SEDA AYACUCHO

El programa de inversiones total de EPS SEDA AYACUCHO S.A para el Periodo regulatorio 2022-2027 asciende a **S/ 56.07 millones**. De este monto, S/ 52.29 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 1.05 millones corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y adecuación al cambio climático (GRD y ACC); S/ 1.02 millones a reserva para el plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria (PCC y PAS) y S/ 1.71 millones a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La ejecución de inversiones de SEDA AYACUCHO financiado por recursos del Fondo de inversiones, registró **un avance anual de 58.1%** respecto a lo programado en el 4to año regulatorio (ene-dic 2025), con información al mes de diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 39. SEDA AYACUCHO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2022 A DIC. 2026)

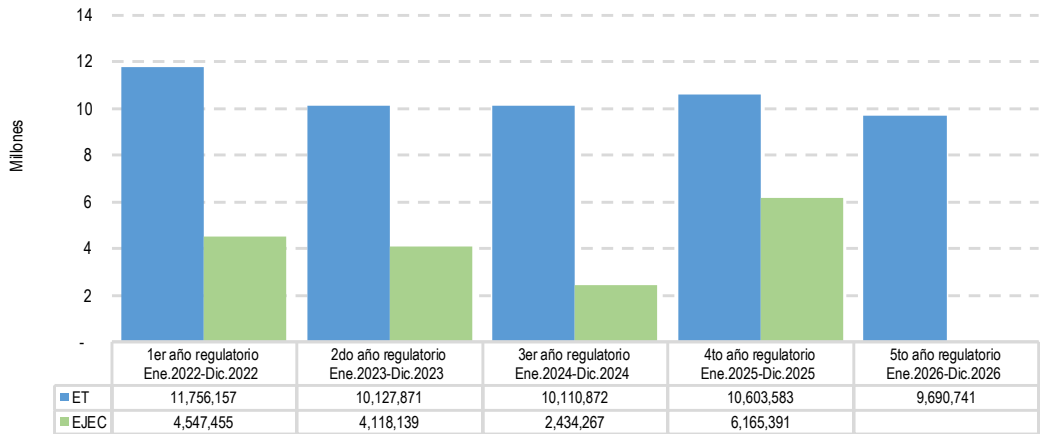


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDA AYACUCHO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2022-Dic.2022	2do año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	3er año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	4to año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	5to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026
SEDA AYACUCHO Ene.2022-Dic.2026	38.7%	40.7%	24.1%	58.1%	0%

SEDA AYACUCHO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., como parte del estudio tarifario, registra **un avance acumulado de 33.0%** respecto al Periodo regulatorio, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información al mes de diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (4 año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

El proyecto **“Adquisición de micromedidores en el servicio de agua potable y alcantarillado de Ayacucho (2024) distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho”** con CUI 2643393, contaba con una inversión programada en el estudio tarifario de S/ 1,623,174 para el año 2024, del cual se ejecutó el 85.4% durante el 2025. Esta inversión se encuentra ejecutada con 10,071 medidores al 100% y liquidada a diciembre del 2025. La IOARR inicio la ejecución con fecha 01/10/2025, con la modalidad de administración directa. actualmente se viene realizando la instalación de micro medidores.

TABLA 25. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SEDA AYACUCHO S.A.,

CUI u otros	Nombre del proyecto	Presupuesto ET (S/)	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2643393	Adquisición de micro medidores; en el(la) servicio de agua potable y alcantarillado de Ayacucho S.A. (año 2024) distrito de Ayacucho, provincia Huamanga, departamento Ayacucho	1,623,174	2,221,441.5	10,071	Ejecución (69.3%)	Set 2025	Dic 2025

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS


EPS SEDACAJ

El programa de inversiones total de EPS SEDACAJ S.A para el Periodo regulatorio 2025-2029 asciende a **S/ 49.17 millones**. De este monto, S/ 44.03 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 1.45. millón corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y S/ 3.60 millones a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

El nivel de ejecución de inversiones de SEDACAJ financiado con cargo al Fondo de inversiones, registró un **avance anual de 11.1%** respecto a lo programado en el primer (1) año regulatorio del Estudio Tarifario, con información al mes de diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 40. SEDACAJ - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2029)

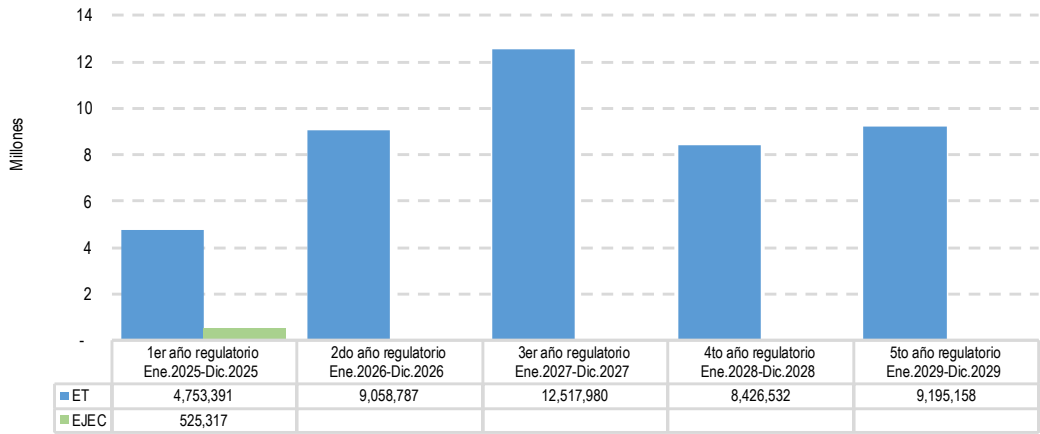

Donde:


ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario

EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDACAJ - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028	5to año regulatorio Ene.2029-Dic.2029
SEDACAJ Ene.2025-Dic.2029	11.1%	0%	0%	0%	0%

SEDACAJ - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de la EPS SEDACAJ S.A., como parte del estudio tarifario, registra un **avance acumulado de 1.2%** respecto a la inversión total programada para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1 año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

El proyecto **“Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en el (la) EPS. Sedacaj S.A. sector Alzamora Miranda distrito Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento de Cajamarca”** con CUI 2534143, por un monto de S/ 3,457,731.00 cuyos avances fueron realizados en el 2025. El proyecto considera la ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y sistema de bombeo del sector de Columbo, Alzamora Miranda. La obra se encuentra en controversia, el avance registrado al mes de junio de 2025 según valorización de obra N° 4 presenta un avance real ejecutado de 67%.

Así también en 2025, se consideró el proyecto **“Adquisición de válvulas de control y medidor de corriente de agua en la EPS. Sedacaj S.A. sede Contumaza ficha – 32”**, por un monto S/ 9,677.00 saldo de apertura. Se ejecuto al 100% en 2025. Indicar este proyecto es del estudio tarifario 2019-2024. El proyecto incluyó principalmente:

- Macro medición: Implementación de una cámara de macro medición en el reservorio para un mejor control del volumen de agua.
- Control de Presión: Renovación de válvulas reguladoras de presión en la red de la ciudad.
- Equipamiento: Adquisición de válvulas de control y medidores de corriente de agua.
- Esta inversión se enmarca en los objetivos estratégicos de la EPS para:
- Mejorar la continuidad del servicio, que en la localidad de Contumazá alcanza las 24 horas al día.
- Reducir el Agua No Facturada mediante una medición más precisa de los caudales de entrada y salida del sistema.
- Optimizar la distribución, asegurando que las presiones en las redes domiciliarias sean las adecuadas para evitar roturas o desabastecimiento.

TABLA 26. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SEDACAJ S.A.,


CUI u otros	Nombre del proyecto	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2534143	Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable; en el(la) EPS SEDACAJ SA sector Alzamora Miranda distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca	6,169,192.36	ND	En controversia (78.3%)	Mar 2024	Jul 2024

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

EMAPA CAÑETE

El programa de inversiones de EMAPA Cañete, para el periodo regulatorio 2025-2027, asciende a **S/ 23 169 376** que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 264 586 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 4 558 459 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 15 970 558 corresponden a inversiones institucionales, S/ 702 668 corresponden a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad (PCC), S/ 611 756 corresponde a inversiones relacionadas a la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD y ACC), S/ 1 061 349 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

GRÁFICO 41. EMAPA CAÑETE - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2027)

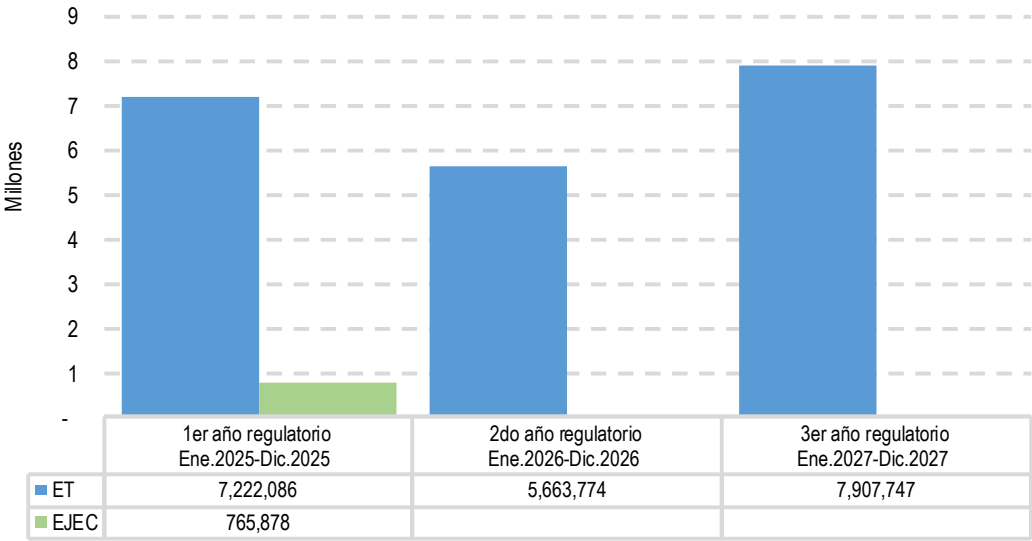


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMAPA CAÑETE - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
EMAPA CAÑETE Ene.2025-Dic.2027	10.6%	0%	0%

EMAPA CAÑETE - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de EMAPA CAÑETE financiados con cargo al **Fondo de inversiones**, como parte del estudio tarifario, registró **avance de ejecución anual de 10.6%** respecto al monto programado para el primer (1er) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

La ejecución de inversiones de la EPS EMAPA CAÑETE S.A., como parte del estudio tarifario, registra **un avance acumulado de 4.0%** respecto al monto de inversiones programadas para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

Adicionalmente, EMAPA CAÑETE S.A. indicó que ejecutó S/ 542,644 con cargo a sus reservas del Plan de Control de Calidad (PCC), Gestión de Riesgos de Desastres (GRD y ACC), y Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1 año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

Respecto a la inversión ***“Adquisición de dataloggers para el registro de continuidad y presión en las localidades de EMAPA Cañete”*** registró una ejecución de S/ 396,200 en el 2025, entre otras inversiones de menor cuantía.


EPS EMAPICA

El programa de inversiones total de EPS EMAPICA S.A para el Periodo regulatorio 2023-2028 asciende a **S/ 50,050,231**. De este monto, S/ 47,636,256 corresponde a las inversiones en agua Potable y alcantarillado que se ejecutarán con el Fondo de Inversiones, S/1,673,502 corresponde a inversiones en implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y S/ 740,473 corresponde a inversiones en Gestión del riesgo de desastres (GRD) y Adaptación al cambio climático (ACC).

La ejecución de inversiones de EMAPICA con cargo a los recursos del Fondo de inversiones registra un **avance anual de 33.0%** respecto al monto programado para el segundo (2) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 42. EMAPICA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO OCT. 2023 A SET. 2028)

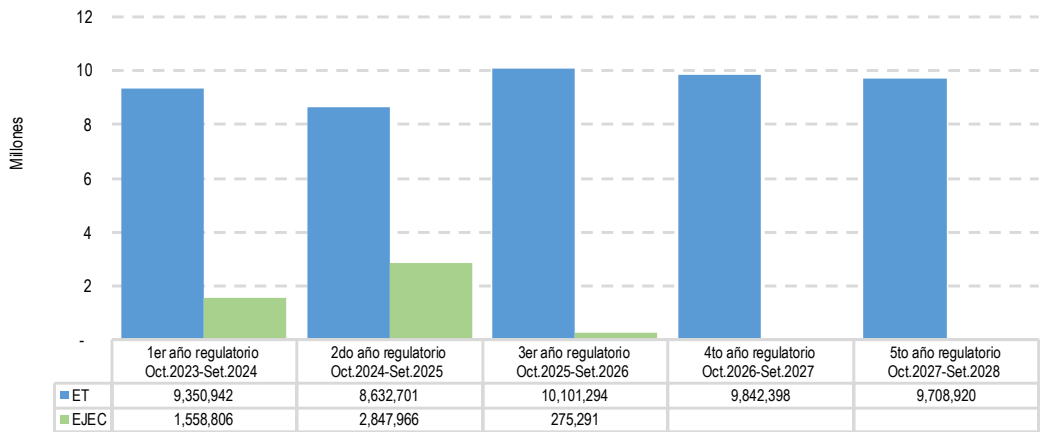

Donde:


ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario

EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMAPICA - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Oct.2023-Set.2024	2do año regulatorio Oct.2024-Set.2025	3er año regulatorio Oct.2025-Set.2026	4to año regulatorio Oct.2026-Set.2027	5to año regulatorio Oct.2027-Set.2028
EMAPICA Oct.2023-Set.2028	16.7%	33.0%	2.7%	0%	0%

EMAPICA - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de la EPS EMAPICA S.A., como parte del estudio tarifario, registra **un avance acumulado de 9.8%** respecto del monto de inversiones programado para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones:

El proyecto **"Adquisición de Dataloggers y construcción de puntos de muestreo en la redes de agua potable en la localidad de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa en la región de Ica"** con CUI 2648457, contaba con una inversión programada en el estudio tarifario de S/ 1,571,017 para el año 2023, pero contó con un monto devengado acumulado de S/ 1,418,573. Esta inversión tiene pendiente realizar la liquidación.

En relación con el proyecto **"Mejoramiento del servicio de agua potable urbano en el sector de los Aquijes mediante la construcción de un pozo y reservorio"** cuenta con expediente técnico aprobado desde febrero de 2025. Actualmente, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de contrato para la programación del segundo año. La empresa atribuye los retrasos a la incorporación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso del proyecto **"Creación del reservorio elevado 600 m³ en la localidad de Palpa"**, este se encuentra en fase de formulación. La empresa coordina con la Municipalidad Provincial de Palpa para continuar con el proceso, ya que su unidad formuladora no puede registrar proyectos fuera de la provincia de Ica.

El proyecto **"Creación de caseta y perforación de pozo tubular en la Ca. Natividad Paco, distrito de Parcona"** fue programado para el primer año regulatorio y se encuentra prácticamente culminado, con un avance del 97.75%. La operación inició en marzo de 2025 y actualmente está en proceso de liquidación de obra.

Respecto al proyecto **"Mejoramiento del servicio de agua potable urbano en el sector Virgen de Chapi, mediante la creación de caseta y perforación de pozo tubular"**, este cuenta con expediente técnico aprobado, pero presenta retrasos debido a la falta de saneamiento físico legal del terreno. La Municipalidad Provincial de Ica está gestionando la cesión en uso del mismo.

El proyecto **"Creación de caseta y perforación de pozo tubular en la Angostura Limón, distrito de San Juan Bautista"** también tiene expediente técnico aprobado. Sin embargo, presenta retrasos por falta de saneamiento físico-legal del terreno, trámite en el que la empresa se encuentra trabajando. En cuanto a la inversión **"Creación de pozo tubular profundo en el sector Cachiche"**, está programada para el segundo y tercer año regulatorio. Actualmente, se prevé formular la inversión en noviembre de 2025, en función de la priorización establecida.

El proyecto **"Mejoramiento del servicio de agua potable urbano en la Urbanización Villa Club, mediante la creación de caseta y pozo tubular"** está previsto para el tercer año regulatorio. Se cuenta con un estudio de preinversión, y se tiene programada la contratación de un consultor en noviembre de 2025 para la elaboración del expediente técnico. Finalmente, la inversión **"Creación del pozo tubular en la Angostura Fonavi I etapa, distrito de Subtanjalla"** está programada para el segundo año regulatorio. Aunque cuenta con estudio de preinversión viable, se encuentra retrasada por falta de saneamiento físico y legal del predio.

La Empresa Prestadora está gestionando la transferencia del terreno con la SBN y ha solicitado también el estudio hidrogeológico correspondiente.

TABLA 27. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS EMAPICA S.A.,

CUI u otros	Nombre del proyecto	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2648457	Adquisición de registrador de datos; construcción de cámara de ingreso (incluye el sistema Scada); en el(la) EPS EMAPICA S.A., para las zonales de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa; distrito de Ica, provincia Ica, departamento Ica	1,656,257.18	ND	En proceso de liquidación de obra (87.1%)	Feb 2025	May 2025

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS


EPS SEMAPACH

El programa de inversiones total de EPS SEMAPACH S.A para el Periodo regulatorio 2024-2028 asciende a **S/ 32,985,578**. De este monto, S/ 29,076,147 corresponde a las inversiones con el Fondo de Inversiones, S/ 231,750 corresponde a inversiones con reservas para el Plan de Control de Calidad, S/ 1,133,952 inversiones con reserva para la Gestión del Riesgo de desastres y S/ 2,133,952 con reservas para Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

La ejecución de inversiones de SEMAPACH con cargo a los recursos del Fondo de inversiones registra un **avance anual de 121.9%** respecto al monto programado para el segundo (2do) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 43. SEMAPACH - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2024 A DIC. 2028)

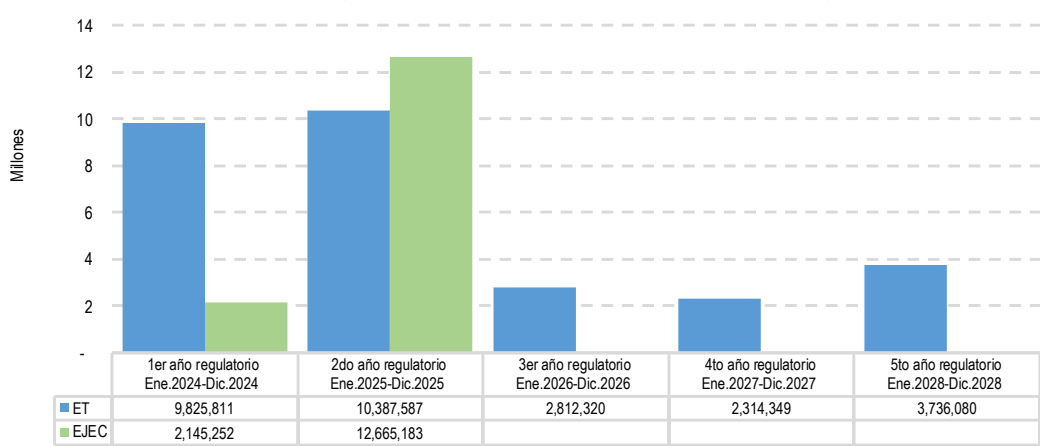

Donde:


ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario

EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEMAPACH - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	2do año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	3er año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	4to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	5to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028
SEMAPACH Ene.2024-Dic.2028	21.8%	121.9%	0%	0%	0%

SEMAPACH - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de SEMAPACH, como parte del estudio tarifario, registra un **avance acumulado de 50.9%** respecto al monto de inversión programada para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo a la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (2do año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto **"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable con sectorización en el distrito de Tambo demora, provincia de Chincha, departamento de Ica"** con CUI 2553715, que cuenta con una inversión programada en el estudio tarifario de S/ 7,771,473. El cual viene ejecutándose con un avance físico del 52.01% y una ejecución financiera a nivel de devengado de **S/ 4.16 millones** (de acuerdo con los formatos 15 y 16 reportados por la EPS). Se precisa que, la ejecución de obra de la etapa I inicio el 10-04-2025 (con un plazo de ejecución de 105 días calendarios) con porcentaje de obra al mes de diciembre 2025 de 52.01%. La obra reinicio el 30-05-2025. La ejecución de obra de la etapa II inicio el 08-11-2025 (con un plazo de ejecución de 105 días calendario) con porcentaje de obra al 15 de diciembre 2025 de 46.46%

El proyecto **"Mejoramiento del servicio de agua potable urbano en la construcción de pozo tubular con equipamiento distrito de Alto Laran de la provincia de Chincha del departamento de Ica"** con CUI 2623192, que cuenta con una inversión programada en el estudio tarifario de S/ 1,821,100. El cual viene ejecutándose con un avance físico del 61.4% y una ejecución financiera acumulada a nivel de devengado de **S/ 2.4 millones** (de acuerdo con los formatos 15 y 16 reportados por la EPS). El proyecto consiste en la construcción de un pozo de extracción (pozo tubular) de 80 metros lineales, la construcción de estación de bombeo de agua de capacidad 33.33 lps y una construcción de línea de impulsión 3.8 km.

TABLA 28. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SEMAPACH S.A.

CUI u otros	Nombre del proyecto	Presupuesto ET (S/)	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero acumulado	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de operación
2553715	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable con Sectorización en el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, departamento de Ica	7,771,473	8,575,634.92	8,557	En ejecución de obra (88.2%)	Abr 2025	Feb 2026
2623192	Mejoramiento del servicio de agua potable urbano en la construcción de pozo tubular con equipamiento distrito de Alto Laran de la provincia de Chincha del departamento de Ica	1,821,100	3,738,872.95	11,594	En ejecución de obra (91.8%)	Feb 2025	Oct 2025

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

El proyecto **"Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable, con sectorización en el distrito de Tambo de Mora"** se encuentra en ejecución. La Etapa 1 inició en abril de 2025 y la Etapa 2 está en elaboración del expediente técnico. Hubo retrasos por observaciones del OSCE durante el proceso de selección, lo que obligó a retroceder el procedimiento y realizar una nueva convocatoria. Actualmente, la empresa mantiene coordinación constante con el contratista y el supervisor de la obra.

Respecto al proyecto **"Perforación y Equipamiento de un pozo profundo, instalación de una estación de bombeo y una línea de impulsión, distrito de Tambo de Mora"**, aunque está programado para el segundo año regulatorio, la Empresa Prestadora evalúa alternativas de captación. Se gestionan coordinaciones con el PSI para construir una galería filtrante y con una empresa privada para disponer de un área que permita evaluar un pozo tubular.

El proyecto **"Perforación y Equipamiento de un pozo profundo, instalación de una estación de bombeo y una línea de impulsión, en el sector de Hijalla, distrito de Alto Larán"** está actualmente en ejecución. Su inicio se vio retrasado por demoras en la obtención de autorizaciones de la ANA, factibilidad eléctrica por parte de ElectroDunas y la aprobación de la ficha técnica ambiental.

En cuanto a la inversión **"Adquisición de válvulas de aire, válvulas de purga e hidrantes para el subsistema de Chíncha Alta"**, la ejecución correspondiente al primer año ya fue completada y recepcionada. Para el segundo año, se cuenta con expediente técnico aprobado, aunque el proceso de selección fue declarado desierto por falta de postores.

El proyecto **"Adquisición de 11 válvulas de aire y 4 válvulas de purga para el subsistema de Chíncha Baja"** también fue ejecutado según lo programado en el primer año y se encuentra recepcionado. Actualmente, se desarrollan los actos preparatorios para la ejecución del segundo año, con expediente técnico ya aprobado.

En cuanto a la inversión **"Perforación y equipamiento de un pozo profundo, instalación de una estación de bombeo y una línea de impulsión, distrito de Sunampe"** está prevista para el tercer año regulatorio. La empresa ha informado que se iniciará la búsqueda de un área adecuada para realizar los estudios preliminares correspondientes.


EPS SEDAHUANUCO

El programa de inversiones total de la EPS Seda Huánuco S.A. para el Periodo regulatorio 2023-2028 asciende **S/43.2 millones**, de este monto, S/ 39.8 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 973 mil corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al cambio climático, S/ 743 mil a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), por ultimo S/ 1.6 millones orientados a la implementación del control de calidad.

La ejecución de inversiones de SEDA HUÁNUCO con cargo a los recursos del Fondo de inversiones registra un **avance anual de 64.7%** respecto al monto programado en el tercer (3er) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 44. SEDAHUANUCO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO MAY. 2023 A ABR. 2028)

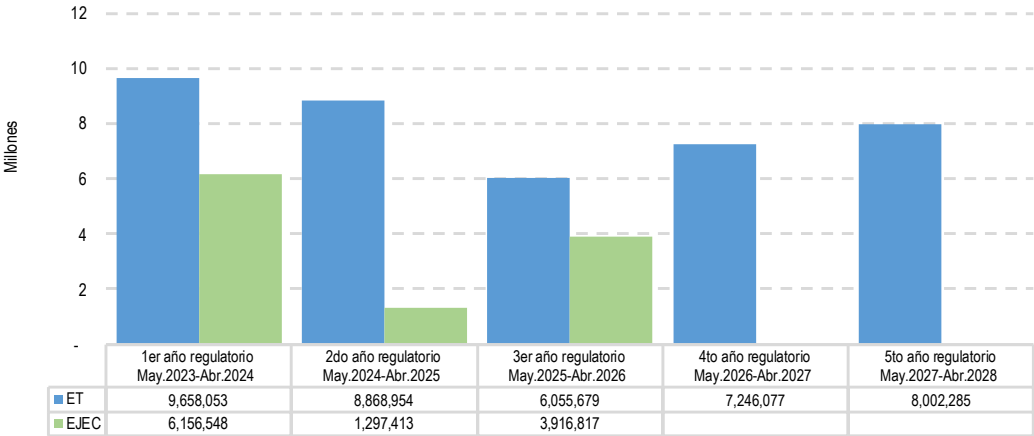


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDAHUANUCO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio May.2023-Abr.2024	2do año regulatorio May.2024-Abr.2025	3er año regulatorio May.2025-Abr.2026	4to año regulatorio May.2026-Abr.2027	5to año regulatorio May.2027-Abr.2028
SEDAHUANUCO May.2023-Abr.2028	63.7%	14.6%	64.7%	0%	0%

SEDAHUANUCO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de SEDAHUANUCO, como parte del estudio tarifario, registra un **avance acumulado de 28.5%** respecto al monto de inversión programado para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto ***“Renovación de Conexiones Domiciliarias; en dos Sistemas de Agua Potable a Nivel Distrital (Huánuco - Leoncio Prado - Rupa Rupa y Jose Crespo y Castillo”*** cuenta con presupuesto de S/2,513,413. Y se encuentra culminado con acta de recepción de obra.

Respecto al proyecto ***“Programa de Micromedición y Adecuación de cajas de registro de conexiones de Agua Potable - Huánuco - Huánuco -Huánuco”***, que iniciaron su ejecución en el segundo semestre del 2023 y 2024, por lo que su ejecución se encuentra dentro de lo programado. Esta inversión cuenta con un presupuesto de S/7,209,363 y se encuentra en Ejecución.


EPS EMSAPUNO

El programa de inversiones de EMSAPUNO S.A. para el Periodo regulatorio 2023–2027 asciende a **S/ 22,783,039** de los cuales S/ 5,974,350.00 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 3,180,088.00 corresponden a inversiones en mejoramiento y S/ 13,628,601.00 corresponden a inversiones institucionales.

La ejecución de inversiones de EMSA PUNO con cargo a los recursos del Fondo de inversiones registra un **avance anual de 137.3%** respecto al monto programado para el tercer (3er) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 45. EMSAPUNO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2023 A DIC. 2027)

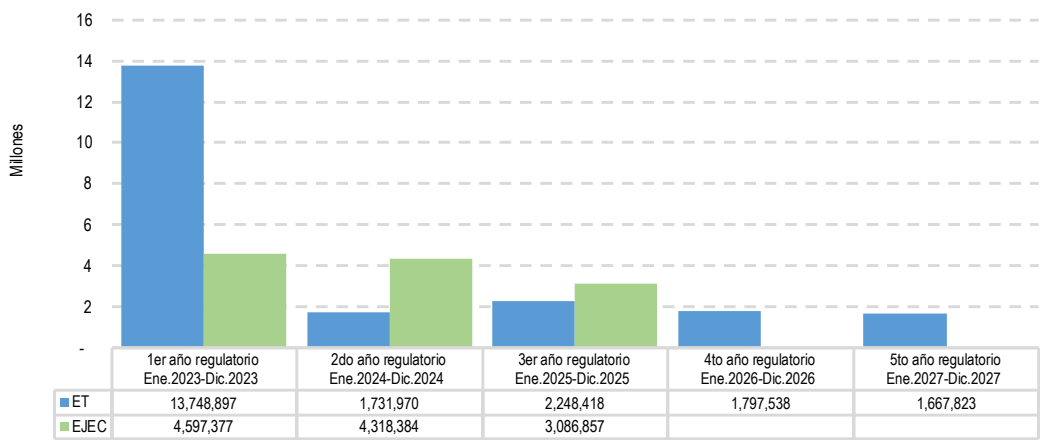

Donde:


ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario

EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMSAPUNO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	2do año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	3er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	4to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	5to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
EMSAPUNO Ene.2023-Dic.2027	33.4%	249.3%	137.3%	0%	0%

EMSAPUNO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de EMSA PUNO, como parte del estudio tarifario, registra un **avance acumulado de 56.6%** respecto al Periodo regulatorio, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

Sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 del programa de inversiones del estudio tarifario; es importante señalar que el proyecto **"Captación Totorani - EBA - Línea de Impulsión a Reservorio Aracmayo"** su ejecución se inició el 15 de mayo de 2023 y, a la fecha, el proyecto ha sido liquidado. Entró en operación el 6 de mayo de 2025.

Asimismo, el proyecto **"Mejoramiento Electromecánico de las Estaciones de Bombeo y Reservorios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Puno"** se encuentra en proceso de adjudicación de buena pro para el equipamiento, contando con financiamiento del Fondo de Inversiones. Se tiene previsto que el proyecto entre en operación el 15 de diciembre de 2025.

Sobre el proyecto **"Renovación y Reposición de Medidores de Agua en la Ciudad de Puno"** se encuentra a la espera de la certificación correspondiente por parte de INACAL.

Por otro lado, el proyecto **"Implementación del Control de Pérdidas y Fugas en Redes de Distribución y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable de la Ciudad de Puno"** ha sido modificado debido al estado de emergencia y a nuevas disposiciones legales (Decreto Supremo N° 128-2023). Se ha efectuado una transferencia a favor de la Entidad Prestadora (EP) para su ejecución.

Sobre el proyecto **"Obras de Cabecera en el Sector Uros Chulluni – Puno"** se encuentra liquidado y está a la espera de la autorización de suministro de energía por parte de la empresa Electro Puno.

Asimismo, el proyecto **"Equipamiento y Mobiliario del Proyecto Mejoramiento Institucional de EMSAPUNO S.A"** inició su ejecución en julio de 2023 y terminó en septiembre de 2023. El proyecto ha sido culminado; sin embargo, actualmente se encuentra en un proceso de arbitraje.

Finalmente, sobre la **"Adquisición, Renovación e Instalación de Válvulas de Purga de Aire en la Ciudad de Puno"** se encuentra liquidado, así como la **"Adquisición de Micromedidores en el Sistema de Agua Potable de EMSAPUNO S.A"** ha sido culminado y liquidado.


UE AGUA TUMBES

El programa de inversiones de la UESST financiado con recursos ordinarios, a través de la asignación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, para el Periodo regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 18.69 millones; de este monto, S/ 16.95 millones corresponde a inversiones en servicio de agua potable y S/1.72 millones a servicio de alcantarillado. Adicionalmente, con cargo a los recursos de las reservas de Mecanismos por Servicios Ecosistémicos se programó S/ 0.30 millones y por Gestión de Riesgo de Desastres por S/ 0.125 millones. En total, el monto asciende a S/ **19.12 millones**.

La ejecución de inversiones de AGUA TUMBES, como parte del estudio tarifario, no registró avance respecto al periodo regulatorio, financiados con cargo al Fondo de inversiones y reservas, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 46. AGUA TUMBES - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2023 A DIC. 2027)

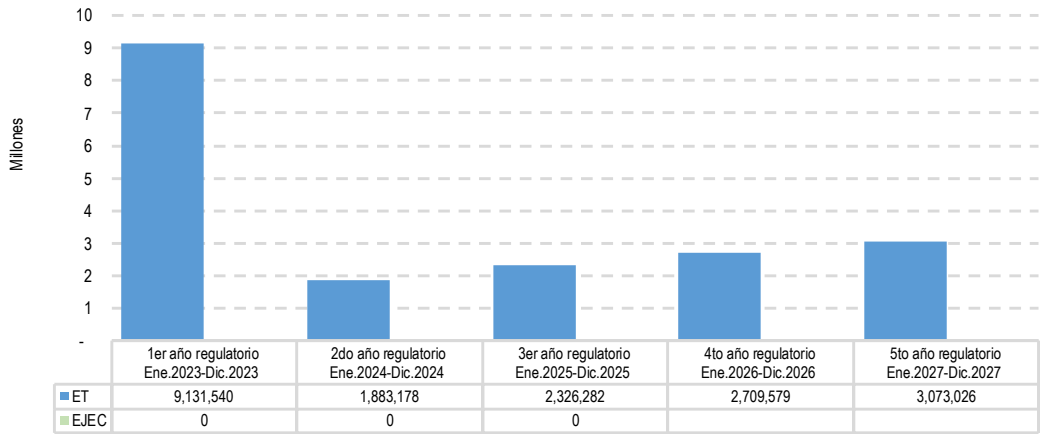


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

AGUA TUMBES - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	2do año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	3er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	4to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	5to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
AGUA TUMBES Ene.2023-Dic.2027	0%	0%	0%	0%	0%

AGUA TUMBES - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y eficaz** en el 2025.

Cabe señalar que, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS creó a través de la Resolución Directoral N° 095-2018-OTASS/DE la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes (UE002SST), con fines de garantizar la continuidad la mejora de la prestación total de los servicios de saneamiento en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. Asimismo, la UE002SST precisó que la ejecución de inversiones del Estudio Tarifario está condicionada por factores exógenos vinculados a la disponibilidad presupuestal autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas¹⁵.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones y reservas, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

La Unidad Ejecutora 002 – Servicios de Saneamiento Tumbes, denominada *AGUA TUMBES*, cumplió con la ejecución del proyecto **"Instalación del equipo de bombeo en la cámara de desagüe de San Juan de la Virgen"**. Fue ejecutado en el segundo año regulatorio (2024) y verificado como instalado por parte de la ODS en junio 2025, donde se constató que el equipo estaba operativo, aunque en mal estado.

En contraste, el proyecto **"Instalación del equipo de bombeo en la cámara de desagüe de Puerto Pizarro"** instalado el 3 de diciembre de 2025 y actualmente se encuentra operativo.

IMAGEN 14. CÁMARAS DE BOMBEO EN UE AGUA TUMBES

VERIFICACIÓN DEL EXTERIOR DEL MOTOR DE LA
CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE –
PUERTO PIZARRO



Fuente: ODS Tumbes

VERIFICACIÓN DEL EXTERIOR DEL MOTOR DE LA
CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE –
SAN JUAN DE LA VIRGEN



¹⁵ Remitido a Sunass mediante Oficio N° 482-2026-UE002SST/GG e Informe N° 18 - 2026/GG/GACS/OC.


EPS SEDA JULIACA

El programa de inversiones de SEDA JULIACA, para el periodo regulatorio 2025–2029, asciende a **S/ 25,035,395** que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 3,608,627 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 9,309,997 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 10,900,373.00 corresponden a inversiones institucionales, S/ 626,115 corresponden a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad, S/ 241 000 corresponde a inversiones relacionadas a la gestión de Riesgos de Desastres y S/ 349,284 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

La ejecución de inversiones de SEDA JULIACA, como parte del estudio tarifario, no registró avance a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 47. SEDA JULIACA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET (PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2029)

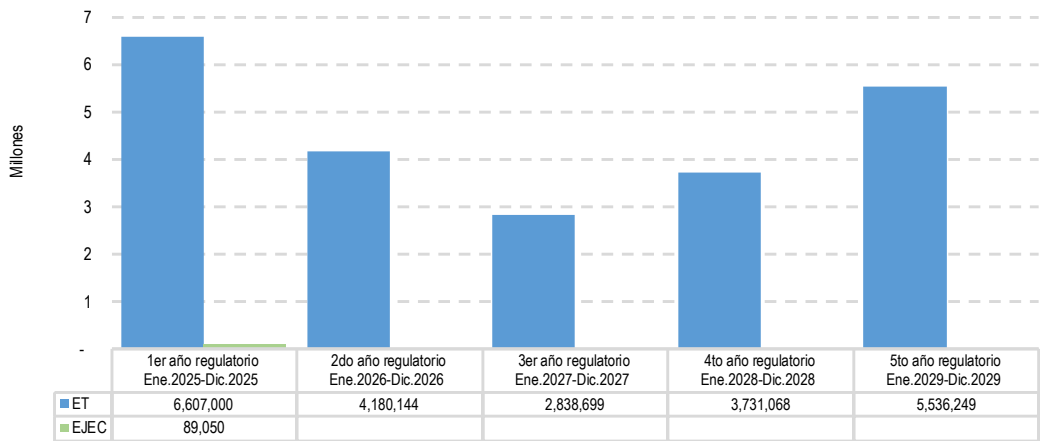


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDA JULIACA - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028	5to año regulatorio Ene.2029-Dic.2029
SEDA JULIACA Ene.2025-Dic.2029	1.3%	0%	0%	0%	0%

SEDA JULIACA - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto de ***“Adquisición e Instalación de 7,361 Micromedidores por Ampliación en la Localidad de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento de Puno”***, está programado para iniciar el 3 de febrero de 2025, y se prevé que entre en operación el 15 de septiembre de 2025. Actualmente, el personal se encuentra desarrollando actividades preliminares, enfocadas en la reglamentación de las cajas de registro de los medidores.

El proyecto de ***“Adquisición de Equipos Multiloglog (Datalogger con Telemetría) para la EPS SEDA JULIACA S.A”***. se está llevando a cabo la identificación de los puntos estratégicos para la instalación de los equipos Datalogger. El inicio de operaciones está previsto para el 30 de diciembre de 2025.

El ***“Programa de Optimización para la Regularización de Conexiones Ilegales (Clandestinos) en la EPS SEDA JULIACA S.A”***. cuenta con la compra del 100% de las llaves necesarias, dispositivos electrónicos, equipos de protección personal (EPP), así como motocicletas. Asimismo, se viene elaborando el cuadro de necesidades de personal para su adecuada implementación. El inicio de operaciones está previsto para el 30 de diciembre de 2025.


EPS SEDAMHUANCAYO

El programa de inversiones total de EPS SEDAM HUANCAYO S.A. para el Periodo regulatorio 2023-2028 asciende a **S/ 79,890,149**. De este monto, S/ 70,044,595 corresponde a inversiones financiadas con el Fondo de Inversiones; S/ 5,137,321 corresponde a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE); S/ 2,797,365 para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC) y S/ 1,910,868 para financiar la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC y PAS).

La ejecución de inversiones de SEDAM HUANCAYO con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 99.9%** respecto al monto programado para el tercer (3do) año regulatorio, con información a diciembre de 2025¹⁶.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 48. SEDAMHUANCAYO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO JUL. 2023 A JUN. 2028)

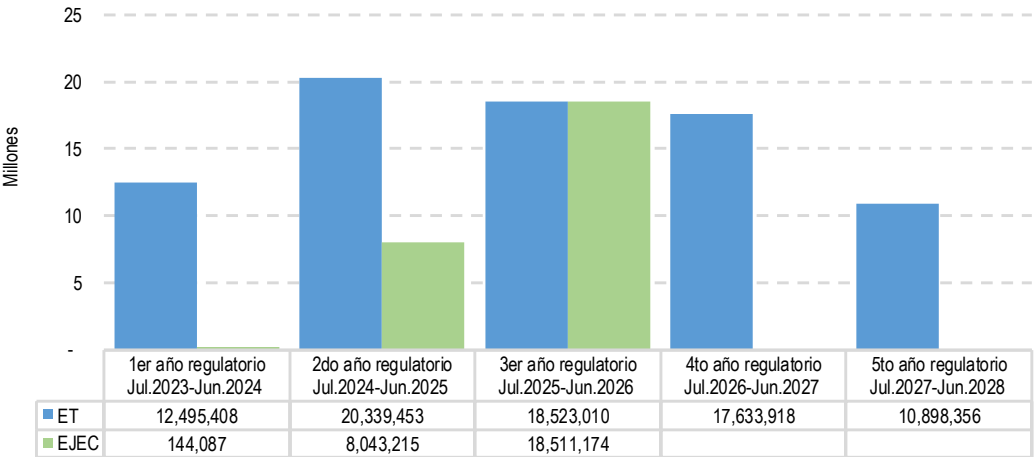

Donde:


ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario

EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SEDAMHUANCAYO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Jul.2023-Jun.2024	2do año regulatorio Jul.2024-Jun.2025	3er año regulatorio Jul.2025-Jun.2026	4to año regulatorio Jul.2026-Jun.2027	5to año regulatorio Jul.2027-Jun.2028
SEDAHUANCAYO Jul.2023-Jun.2028	1.2%	39.5%	99.9%	0%	0%

SEDAMHUANCAYO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

¹⁶ La información histórica fue revisada considerando la información remitida a Sunass mediante el Oficio N° 000245-2026-SEDAM/GG y Oficio N° 0008-2026-SEDAM/GPP.

La ejecución de inversiones de SEDAMHUANCAYO, como parte del estudio tarifario, registra un **avance acumulado de 33.4%** respecto al monto de inversiones programado para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el Fondo de Inversiones y reservas, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto de inversión **“Mejoramiento y Ampliación del servicio de tratamiento de agua potable para área metropolitana de la provincia de Huancayo (Distritos de Huancayo, Tambo y Chilca) – Administración de SEDAM Huancayo S.A. provincia de Huancayo, Departamento de Junín”** con CUI N° 2313512, cuyo monto programado en el estudio tarifario asciende a S/. 28,112,544 (sin IGV), contempla la construcción de una **Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)** con capacidad de producción de **500 L/s**, incorporando unidades y equipos especializado, tales como medidores electromagnéticos de caudal en línea de ingreso y salida, sistemas de mezcla rápida, unidades de floculación, decantación y un sistema integral de desinfección. Asimismo, la construcción de **02 tanques cisterna subterráneos** con capacidades de **2500 m3 y 500 m3** respectivamente. Con el objeto de optimizar la continuidad, confiabilidad, cobertura y calidad del servicio a una población beneficiaria de 301,487 habitantes. Es importante indicar que la aprobación de Expediente Técnico se realizó con la Resolución de Gerencia General N° 86 - 2025 EPS Sedam Huancayo S.A./GG. Asimismo, se suscribió el Contrato de ejecución de obra N° 29 - 2025 EPS Sedam Huancayo S.A., iniciando la ejecución de obra el 06 de octubre 2025, el avance físico a diciembre 2025 fue del 6.86%. Mientras que, el avance físico acumulado a marzo de 2026 ascendente a 16.41%.

IMAGEN 15. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) POR SEDAM HUANCAYO



Fuente: CUI N° 2313512 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ÁREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO (DISTRITOS DE HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA) – ADMINISTRACIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Sobre el proyecto de inversión **“Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Esquema Azapampa, Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Junín - Construcción de Reservorio Apoyado”** con CUI N° 2344695, en el mes de junio ha concluido con la ejecución de la obra, con un avance físico del 100%, iniciando la operación en el mes de octubre del 2025. El proyecto busca tiene como población beneficiaria a aproximadamente 5,300 habitantes del sector consolidado de Chilca (Sector de Azapampa)

a través de un total de 3,215 conexiones domiciliarias. La infraestructura técnica se fundamenta en la construcción de un **reservorio elevado** de **900 m³** de capacidad, diseñado para operar mediante un sistema de bombeo y gravedad, el cual cumple las metas de regular las presiones hidráulicas y asegurar una reserva constante para el consumo poblacional y emergencias. Este sistema integral se complementa con el **pozo tubular** ubicado en el mismo sector que tiene una producción de **20 L/s**, la instalación de una línea de impulsión y una línea de aducción. El proyecto cuenta con el Acta de recepción de los componentes de pozo, línea de impulsión, equipamiento hidráulico - eléctrico y reservorio.

IMAGEN 16. CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO SEDAM HUANCAYO



Fuente: CUI N° 2313512 "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNÍN

Finalmente, sobre el proyecto de inversión **"Construcción de laboratorio; en el(la) sistema de agua potable en la localidad Vilcacoto, distrito de Huancayo, provincia Huancayo, departamento Junín"** con CUI N° 2607847, tiene un avance financiero y físico del 100%, la obra se ejecutó en dos etapas: Primera etapa Laboratorio de Control de Calidad financiado con la reserva del Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), liquidado con avance de 100% por un costo de S/ 1,055,213.53. La segunda etapa Laboratorio de Procesos culminado el 16 de diciembre del 2025 al 100% y financiado con el Fondo de Inversión.

IMAGEN 17. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN SEDAM HUANCAYO



Fuente: "Construcción de laboratorio; en el(la) sistema de agua potable en la localidad Vilcacoto, distrito de Huancayo, provincia Huancayo, departamento Junín" con CUI N° 2607847

TABLA 29. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS SEDAM HUANCAYO S.A.,

CUI u otros	Nombre del proyecto	Presupuesto ET (S/)	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero acumulado	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de culminación de ejecución
2313512	Mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de agua potable para área metropolitana de la provincia de Huancayo (distritos de Huancayo, Tambo y Chilca)- administración de Sedam Huancayo S.A. provincia de Huancayo, departamento de Junín	28,112,544	39,059,796.68	301,487	En ejecución de obra (33.1%)	Oct 2025	Nov 2026
2344695	Ampliación, mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el esquema de Azapampa, distrito de Chilca provincia de Huancayo - Junín	2,993,286	28,637,616.2	5,758	Inversión con obra liquidada (22%)	Oct 2024	Jun 2025
2607847	Construcción de laboratorio; en el(la) sistema de agua potable en la localidad Vilcacoto, distrito de Huancayo, provincia Huancayo, departamento Junín	691,904	2,845,598.2	ND	En proceso de liquidación (85.8%)	Set 2024	Nov 2025

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

6.4 Empresas Prestadoras Medianas

Seguidamente, se presenta la evolución de las inversiones en el primer semestre 2025, por parte de las empresas prestadoras medianas. Del mismo modo la ejecución de inversiones del estudio tarifario.

En esta sección se muestra para cada empresa prestadora del grupo medianas que cuentan con estudio tarifario vigente, la siguiente información:

- Monto de inversión programado para cada año del periodo regulatorio.
- Nivel de ejecución financiera por cada año del periodo regulatorio.
- Nivel de ejecución financiera durante el periodo regulatorio.


EPS BARRANCA

El programa de inversiones total de EPS BARRANCA S.A para el periodo regulatorio 2025-2028 asciende a **S/ 14,314,015**. De este monto, S/ 12,571,855 corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 1,442,160 corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) y S/ 300,000 a reservas orientadas a la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La ejecución de inversiones de EPS BARRANCA con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 35.9%** respecto a lo programado para el primer (1er) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass

GRÁFICO 49. EPS BARRANCA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2029)

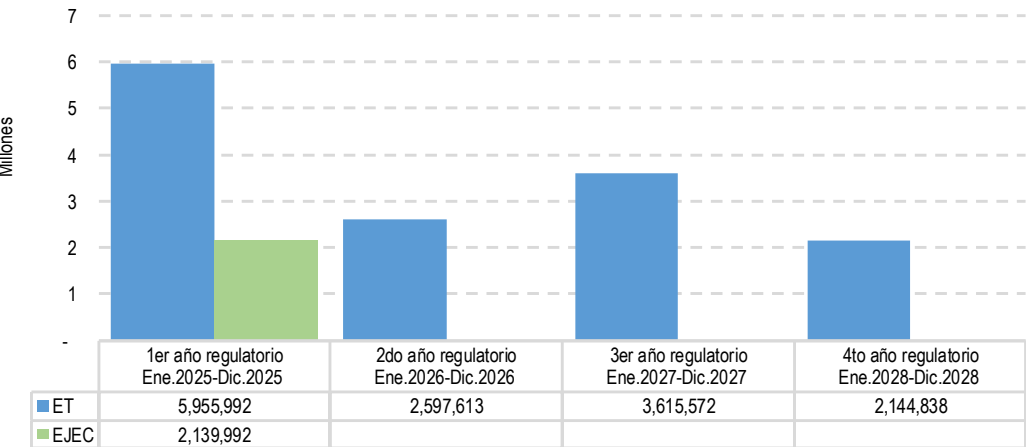


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

BARRANCA - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028
BARRANCA Ene.2025-Dic.2028	35.9%	0.0%	0%	0%

BARRANCA - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

El nivel de ejecución de inversiones de EPS BARRANCA, como parte del estudio tarifario, registra un **avance acumulado de 15.0%** respecto al monto de inversión programado para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto ***“Renovación de red de distribución y red de alcantarillado; en el(la) ca. Pampa de Lara, ca. Belén distrito de Barranca, provincia Barranca, departamento Lima”***

El proyecto ***“Renovación de red de distribución y red de alcantarillado; en el(la) AA.HH. Señor de los Milagros, distrito de Barranca, provincia Barranca, departamento Lima”***, que iniciaron su ejecución en marzo y agosto de 2025 respectivamente, por lo que su ejecución se encuentra dentro de lo programado.

Respecto al proyecto ***“Suministro e instalación de 3200 medidores para instalación de conexiones domiciliarias a todo costo”***, a diciembre 2025, se tiene un porcentaje de avance ejecutado acumulado financiero de 20.57% y avance físico de 25%, por lo que inició operación en noviembre de 2025.


Con respecto al proyecto ***“Mejoramiento del sistema de agua potable mediante creación de nuevas fuentes de captación, en el centro poblado Vinto del distrito de Barranca, provincia de Barranca, departamento de Lima”***, cuenta con una inversión programada de más S/ 3.5 millones para los años 2025 a 2027, el cual presenta retrasos debido al proceso de adquisición y saneamiento de terrenos. Actualmente, se avanza con el registro de la Ficha Técnica Estándar bajo los lineamientos de saneamiento urbano. Se prevé que la ejecución física inicie en febrero de 2027, una vez subsanada la disponibilidad predial.

EPS MOYOBAMBA

El programa de inversiones de la EPS MOYOBAMBA S.A. para el Periodo regulatorio 2021–2026 asciende a **S/ 19 133 372** de los cuales S/ 16,808,066 corresponden a inversiones del servicio de agua potable y S/ 2,325,306 corresponden al servicio de alcantarillado. Al respecto, las inversiones con cargo al Fondo de Inversiones ascienden a S/16 930 406; asimismo, los recursos de la Reserva para la elaboración se implementación del plan de control de calidad (PCC) y elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) ascienden a S/ 15 000, los recursos de la Reserva para la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) suman S/ 1 700 296 y los recursos de la Reserva para implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) totalizan S/ 487 670.

La ejecución de inversiones de EPS MOYOBAMBA con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 0%** respecto a lo programado para el cuarto (4) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

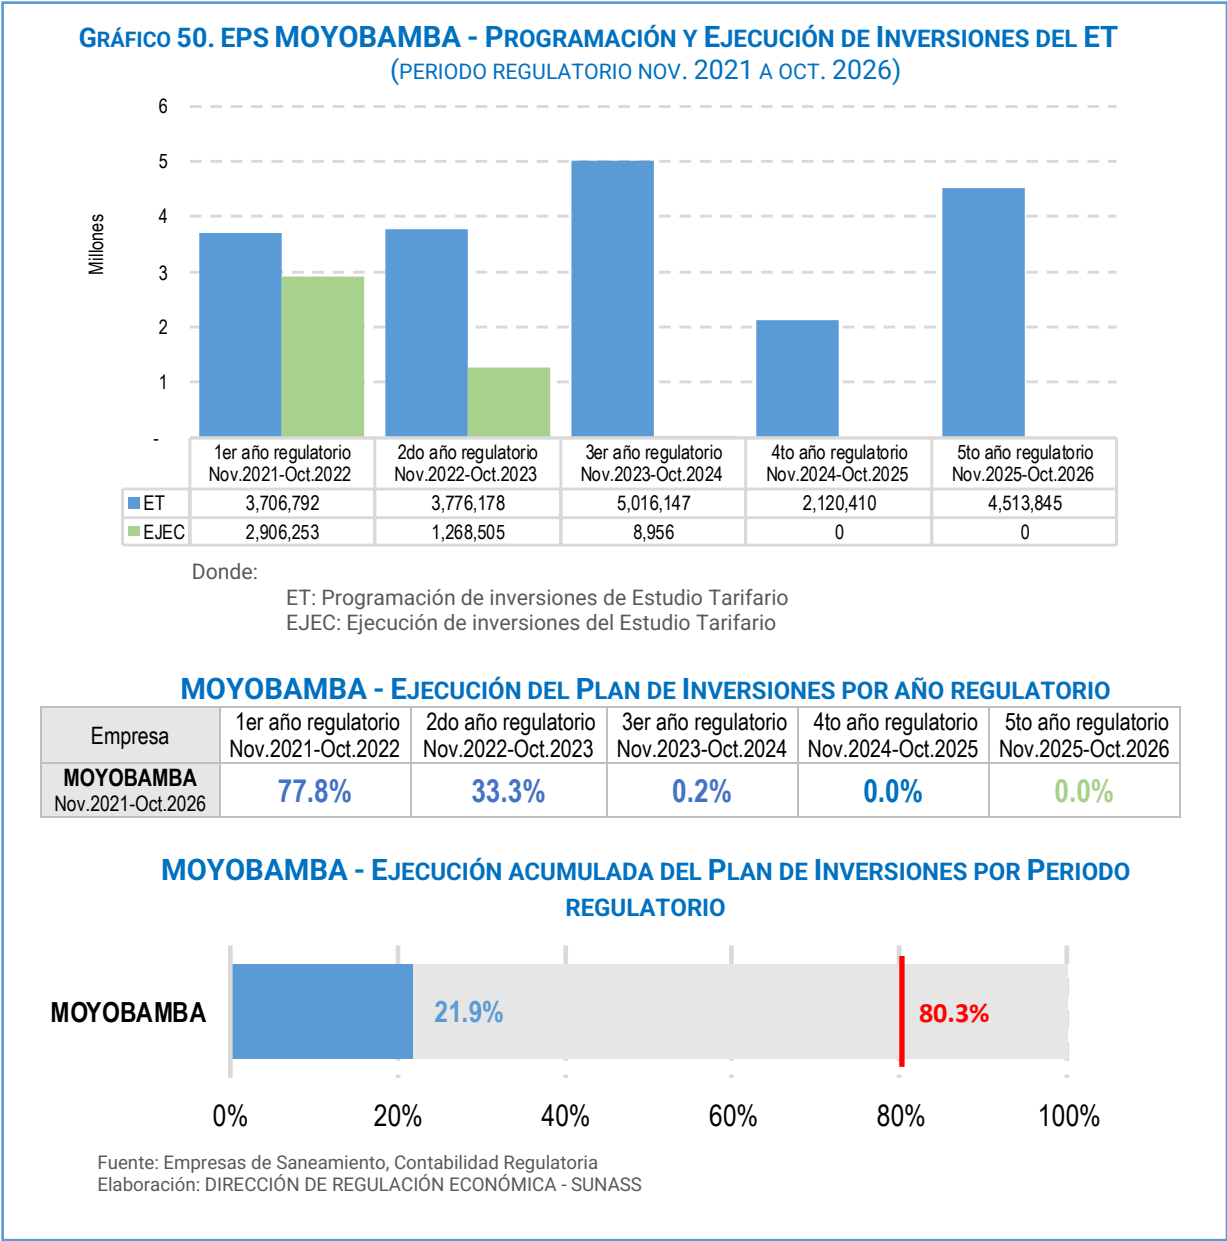

La ejecución de inversiones de EPS MOYOBAMBA, como parte del estudio tarifario, registró un **avance acumulado de 21.9%** respecto al Periodo regulatorio, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (4to año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto ***"Mejoramiento y Renovación de las Redes de Distribución de Agua Potable de los Sectores 1, 2, 3 y 4 de la Localidad de Moyobamba"*** se encuentra en actos preparatorios para la contratación de la consultoría que elaborará el expediente técnico, sin avances físicos. Además, se ha identificado que este proyecto no coincide en casi su totalidad con una IOARR previamente registrada, lo cual genera inconsistencias.

El proyecto ***"Construcción de un (01) Pozo Tubular en los sectores de la localidad de Moyobamba"*** también está en etapa preparatoria, a la espera de contratar estudios de suelos y expediente técnico.

Por su parte, el proyecto ***"Renovación del Emisor Prolongación Moquegua"*** cuenta con contrato suscrito, aunque no se ha reportado ejecución física.

Respecto a los proyectos ***"Reubicación del Tanque Séptico TS-02 y TS-03"*** se encuentra en trámite para su modificación ante la Sunass por ubicarse en una zona vulnerable a deslizamientos.

Finalmente, el proyecto ***"Reubicación del Tanque Séptico TS-05"***, en proceso de contratación de estudios básicos.


EMAPA HUARAL

El programa de inversiones total de EPS EMAPA HUARAL S.A para el periodo regulatorio 2025-2027 asciende a **S/ 13,642,987**. De este monto, S/ 12,415,790 corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 418,223 corresponde a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), S/ 273,593 corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y S/ 535,380 a reservas orientadas a la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La ejecución de inversiones de EPS EMAPA HUARAL con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 44.8%** respecto a lo programado para el primer (1) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 51. EMAPA HUARAL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2027)

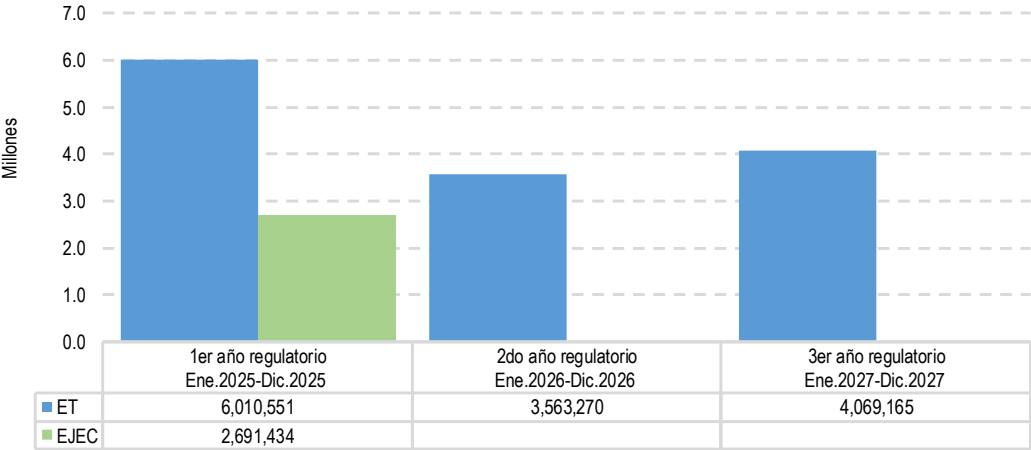


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

HUARAL - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
EMAPA HUARAL Ene.2025-Dic.2027	44.8%	0%	0%

EMAPA HUARAL - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de EMAPA HUARAL registró un **avance acumulado de 19.7%** respecto a lo programado en el periodo regulatorio, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que, para el periodo de transición y las inversiones del periodo 2019-2024, EMAPA Huaral ejecutó S/ 618,896 en 2025.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto ***“Adquisición e instalación de medidores para usuarios promediados por vida útil en el ámbito de EMAPA HUARAL S.A.”*** con una inversión de S/ 3,595,360, la obra inició su ejecución en julio de 2025 y entró en operación en octubre de 2025. A la fecha, reporta un cumplimiento del 100% tanto en avance físico como financiero, logrando la instalación de 10,860 medidores en beneficio de más de 43 mil habitantes.

Respecto al proyecto ***“Construcción de redes y accesorios de agua potable; en el (la) sectores operativos 1 y 4, distrito de Huaral, provincia Huaral, departamento de Lima”*** fue declarado desierto en octubre de 2025 por falta de postores, la obra se encuentra actualmente en la fase de elaboración del expediente técnico. Una vez aprobado este documento, se procederá con la licitación para la ejecución física. En consecuencia, se ha reprogramado el inicio de obra para septiembre de 2026, estimando su entrada en operación en octubre de 2026. El proyecto contempla la instalación de redes de 1" y 3/4" en beneficio de más de 21,000 habitantes.

Con respecto al proyecto programado para el periodo 2025-2027, ***“Suministro e instalación de macromedidores en las redes de agua en las Troncales (Líneas de aducción) de los diferentes sectores en la localidad de Huaral”***, se encuentra actualmente en la fase de elaboración del expediente técnico. Este estado se deriva de que la primera convocatoria para su formulación, realizada en octubre de 2025, fue declarada desierta por falta de postores. En consecuencia, se ha proyectado el inicio de ejecución para julio de 2026 y su operación para agosto del mismo año. Esta obra instalará dos macromedidores, los cuales impactará en el control de caudales para más de 128 mil habitantes.


EMUSAP ABANCAY

El programa de inversiones total de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. para el Periodo regulatorio 2019 - 2024 asciende a **S/ 12,560,651.87**. De este monto, S/ 8,708,495.25 será financiado con los recursos del Fondo de Inversiones; S/ 2,239,156.63 corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) y S/ 1,613,000.00 a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La empresa EMUSAP ABANCAY finalizó su Periodo regulatorio con un avance acumulado del 48.9%, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, al cierre de diciembre de 2024. Actualmente, se encuentra en un periodo de transición.

Finalmente, Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 52. EMUSAP ABANCAY - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2020 A DIC. 2024)

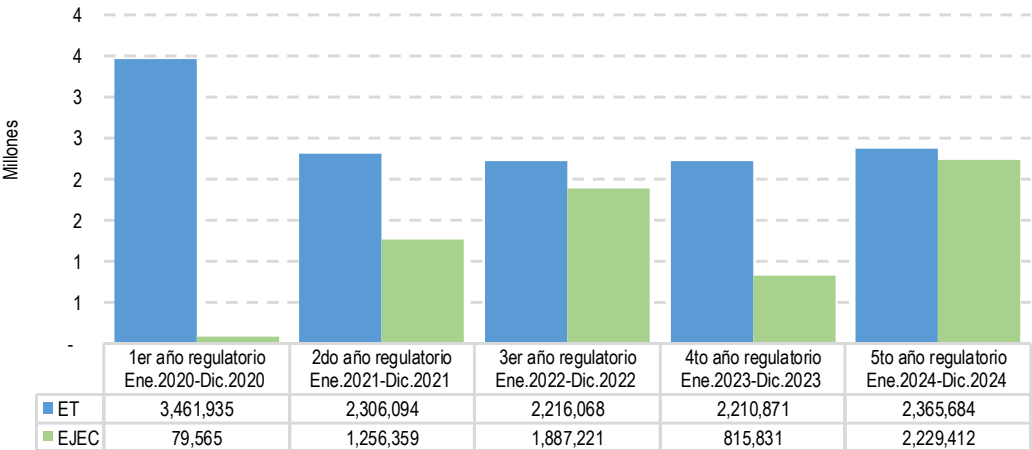


Donde:

- ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
- RT: Revisión Tarifaria - modificación del programa de inversiones
- EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMUSAP ABANCAY - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO
 REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2020-Dic.2020	2do año regulatorio Ene.2021-Dic.2021	3er año regulatorio Ene.2022-Dic.2022	4to año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	5to año regulatorio Ene.2024-Dic.2024
EMUSAP ABANCAY Ene.2020-Dic.2024	2.3%	54.5%	85.2%	36.9%	48.9%

EMUSAP ABANCAY - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR
 PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (periodo de transición) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

Sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025, del programa de inversiones del estudio tarifario el proyecto **“Ampliación del servicio de agua potable urbano y ampliación del servicio de alcantarillado en urbanizaciones Los Portales, San Faustino y prolongación Sinchi Roca del sector Patibamba Baja, distrito de Abancay, provincia de Abancay, departamento de Apurímac”** con CUI 2706346, el monto de inversión fue de S/ 698,406.87 y esto represento la construcción de 1,383.65 ml de red de alcantarillado y 1,361.20 ml de red de sistema de agua potable.

Así mismo, se ejecutó el proyecto **“Ampliación del servicio de alcantarillado en la Asociación Santa Rosa, Los Ángeles, Quinta Valverde, Construyendo Futuro, Juan Pablo Gutiérrez y Virgen del Carmen del distrito de Tamburco, provincia de Abancay, departamento de Apurímac”** con CUI 2702366, el monto de inversión fue de S/ 950,931.28 y esto represento la construcción de 2,415.71 ml de red de alcantarillado.

Finalmente, sobre el proyecto **“Renovación de red secundaria en el sistema de alcantarillado del Pasaje Santa Lucía, sector Patibamba Baja, y en la nueva urbanización Villa El Paraíso de Marcahuasi”** (con CUI 2695649) financiado con recursos del Fondo de Reserva, el proyecto se encuentra operativo, habiendo finalizado su ejecución física el 27 de agosto de 2025. Su implementación ha fortalecido la infraestructura sanitaria en zonas urbanas de expansión reciente, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio de alcantarillado.

TABLA 30. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS EMUSAP ABANCAY S.A.,

CUI u otros	Nombre del proyecto	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero acumulado	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de culminación de ejecución
2706346	Ampliación del servicio de agua potable urbano y ampliación del servicio de alcantarillado en urbanizaciones Los Portales, San Faustino, y prolongación Sinchi Roca del sector Patibamba Baja distrito de Abancay de la provincia de Abancay del departamento de Apurímac	698,406.87	103	Concluido (36.6%)	Set 2025	Dic 2025
2702366	Ampliación del servicio de alcantarillado en Asoc. Santa Rosa, Los Ángeles, quinta Valverde, construyendo futuro, Juan Pablo Gutierrez y Virgen del Carmen distrito de Tamburco de la provincia de Abancay del departamento de Apurímac	950,931.28	792	(0%)	ND	ND
2695649	Renovación de red secundaria; en el(la) sistema de alcantarillado del Psje Santa Lucía sector de Patibamba Baja y en la nueva Urbanización Villa El Paraíso de Marcahuasi distrito de Abancay, provincia Abancay, departamento Apurímac	154,613.47	ND	Ejecutado (82%)	Jul 2025	Ago 2025

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS


EPS ILO

El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2025-2028 asciende a **S/ 24,102,923** que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 575,261.00 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 14,432,032.00 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 6,631,630.00 corresponden a inversiones institucionales, S/ 502,000.00 corresponde a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria (PCC y PAS), S/ 1,045,000.00 corresponde inversiones relacionadas a la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al cambio climático (GRD y ACC), S/ 917,000.00 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La ejecución de inversiones de EPS ILO con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 30.3%** respecto a lo programado para el primer (1) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 53. EPS ILO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2028)

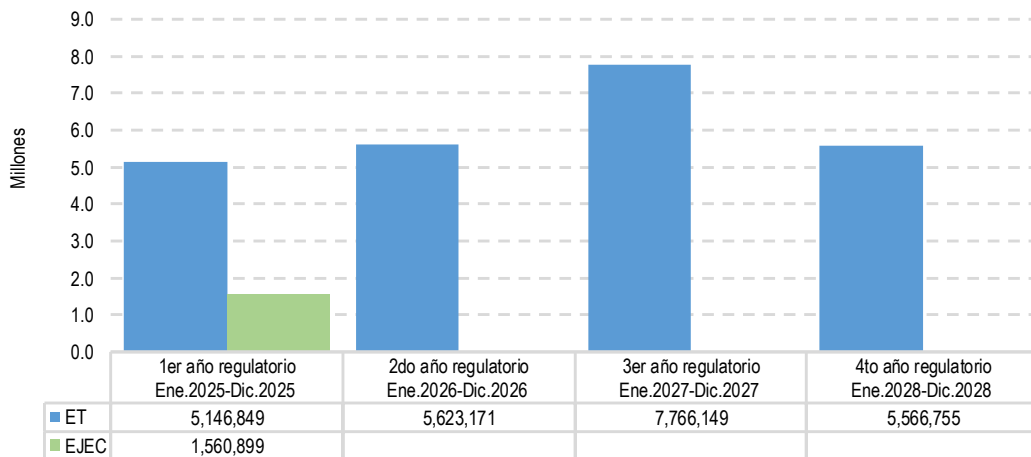


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EPS ILO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028
EPS ILO Ene.2025-Dic.2028	30.3%	0%	0%	0%

EPS ILO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de EPS ILO registró un **avance acumulado de 6.5%** respecto a lo programado en el periodo regulatorio, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

La EPS ILO precisa que aprobó el Plan **"Renovación de Micromedidores"** para instalar medidores en 9,248 conexiones de agua en Ilo, Moquegua, como parte de sus metas de gestión del primer y segundo año. En el primer año se adquirirán e instalarán 2,200 medidores de agua. El proceso fue adjudicado y el contrato firmado en agosto de 2025, y actualmente se están ejecutando los trabajos. Para el segundo año se aprobó un expediente técnico para adquirir 7,048 medidores más, cuya instalación se realizará en 2026. Además, se hicieron algunos ajustes al plan para mejorar su ejecución y asegurar el cumplimiento de las metas.

Finalmente, el proyecto **"Mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado en colector primario en la Av. de ingreso a la ciudad de Ilo, desde la descarga de la Urb. Magisterio de la Pampa Inalámbrica hasta el by-pass Alto Ilo, distrito de Ilo, provincia de Ilo, departamento de Moquegua"** (con CUI 2521623) según la información más reciente, se tuvo previsto iniciar su ejecución física en agosto, con la expectativa de culminarlo dentro del 2025, sin embargo, no se registran avances en el Sistema de seguimiento de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

TABLA 31. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS ILO S.A.,

CUI u otros	Nombre del proyecto	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero acumulado	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de culminación de ejecución
2521623	Remodelación de colector primario; en el(la) Av. de ingreso a ciudad de Ilo, desde la descarga de la Urb. magisterio de La Pampa inalámbrica hasta el by-pass alto Ilo distrito de Ilo, provincia Ilo, departamento Moquegua	850,224.88	ND	Estudio aprobado (0%)	Ago 2022	Oct 2022

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS


EPS MOQUEGUA

El programa de inversiones de EPS MOQUEGUA S.A. financiado con recursos propios para el Periodo regulatorio 2023-2027 asciende a **S/ 15,979,768** de los cuales S/14,519,162 corresponden a inversiones en agua y alcantarillado que se ejecutarán con el fondo de inversiones, S/ 632,532 corresponden a inversiones en Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos (MRSE) y S/ 828,075 corresponden a inversiones en Gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC).

La ejecución de inversiones de EPS MOQUEGUA con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 75.3%** respecto a lo programado para el tercer (3) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 54. EPS MOQUEGUA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2023 A DIC. 2027)

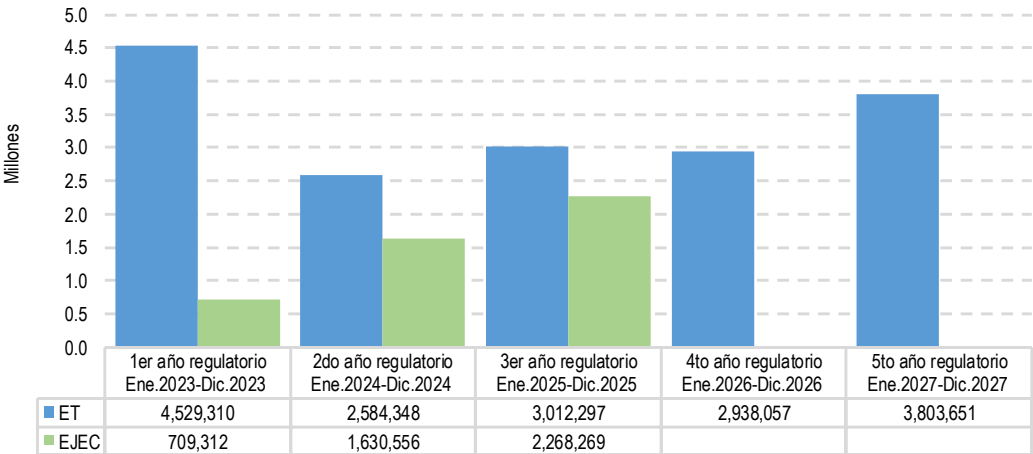

Donde:


ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario

EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

MOQUEGUA - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	2do año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	3er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	4to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	5to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
MOQUEGUA Ene.2018-Dic.2022	15.7%	63.1%	75.3%	0%	0%

MOQUEGUA - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de proyectos EPS MOQUEGUA registró un **avance acumulado de 27.3%** respecto a lo programado en el Periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto **“Renovación de micromedidores; en el(la) ciudad de Moquegua con la instalación de 11537 medidores en el distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua”** con CUI 2604877, inició su ejecución en el 04 de noviembre de 2024 y finalizó el 17 de febrero del 2025. En el estudio tarifario programó una inversión de S/ 1,621,127 para el año 2024 y culminó su ejecución el año 2025; con un avance financiero de ejecución acumulado del 77%4 y avance físico de 100.0%, por lo que inició su operación en setiembre de 2025. El proyecto beneficia a 46,148 habitantes de la ciudad de Moquegua.

Con relación a la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chen Chen, se viene desarrollando el proyecto denominado **“Renovación y optimización de equipamiento de medición de pH-turbidez, dosificación y mezclado, medidor de caudal portátil, dosificador, filtro prensa”**, ubicado en el distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Esta inversión está registrada en el sistema INVIERTE.PE bajo el nombre **“Adquisición de analizador de metales, renovación de equipos complementarios”**. La formulación del IOARR se encuentra retrasada por temas legales.

Respecto al proyecto **“Adquisición y renovación de maquinarias y vehículos para la EPS Moquegua S.A.”**, este se ejecuta conforme al cronograma previsto. Se programó iniciar los actos preparatorios para el proceso de adquisición en la última semana de agosto del presente año.

La inversión **“Renovación de 11,537 medidores, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua”** concluyó según lo programado en febrero de 2025. Actualmente, se encuentra en proceso de liquidación.

En cuanto al proyecto **“Mejoramiento de reservorio 4, 5, 7, 9, 10 y 11 y cámaras de válvula, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua”**, el presupuesto para el expediente técnico es insuficiente, la empresa continuará con el proceso, previendo un avance del 90 % en 2025.

TABLA 32. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS MOQUEGUA S.A.,

CUI u otros	Nombre del proyecto	Presupuesto ET (S/)	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero acumulado	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de culminación de ejecución
2604877	Renovación de micromedidores; en el(la) ciudad de Moquegua con la instalación de 11,537 medidores en el distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua	1,621,127	1,895,997.89	11,537	Inversión en operación / funcionamiento (77%)	Nov 2024	Feb 2025

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS


EMPSSAPAL

El programa de inversiones de EMPSSAPAL S.A. para el Periodo regulatorio 2023–2028 asciende a **S/ 6 240 736** de los cuales S/ 41 794 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 3 076 524 a inversiones en mejoramiento y S/ 3 122 418 a inversiones institucionales. En los siguientes cuadros se detalla las inversiones por cada una de las localidades que se encuentran bajo el ámbito de responsabilidad de EMPSSAPAL S.A.

La empresa no realizó inversiones, por lo que su **avance acumulado de 0%**, con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas, según la información disponible a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 55. EMPSSAPAL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO AGO. 2023 A JUL. 2028)

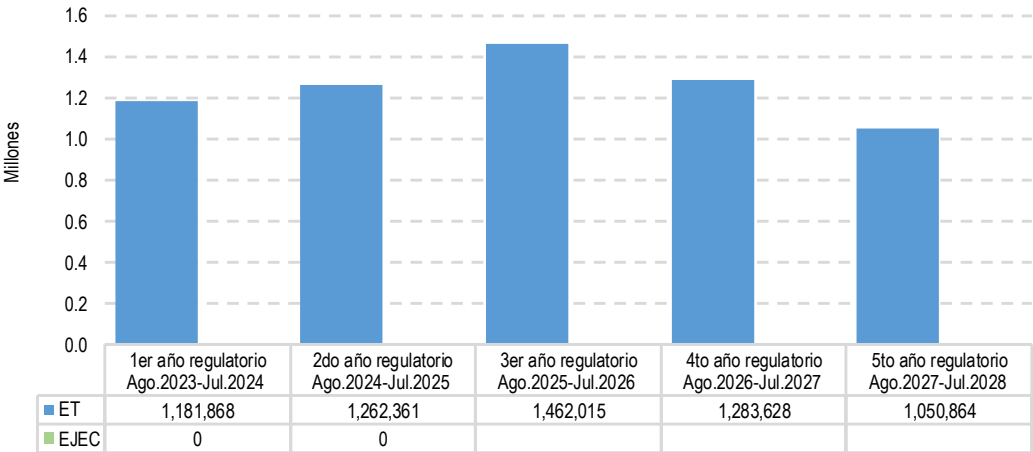


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMPSSAPAL - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ago.2023-Jul.2024	2do año regulatorio Ago.2024-Jul.2025	3er año regulatorio Ago.2025-Jul.2026	4to año regulatorio Ago.2026-Jul.2027	5to año regulatorio Ago.2027-Jul.2028
EMPSSAPAL Ago.2023-Jul.2028	0%	0%	0%	0%	0%

EMPSSAPAL - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

De acuerdo a la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto de ***“Renovación de micromedidores en Sicuani, provincia de Canchis”***, que contempla la instalación de 4,500 más 1,500 unidades, ha sido concluido satisfactoriamente. A julio, se completó la adquisición de los medidores y se confirmó su instalación al 100 %, cumpliendo con los objetivos planteados.

El proyecto de ***“Mejoramiento en la planta de tratamiento de aguas residuales de Sicuani”*** se encuentra actualmente en la etapa de conformación del comité encargado del proceso de selección para la adquisición de bienes o servicios necesarios. No obstante, el avance se ha visto afectado por demoras en la gestión administrativa, lo que ha retrasado el inicio de la ejecución.

Por otro lado, los proyectos ***“Implementación y Actualización del Catastro Comercial de la localidad de Sicuani”***, este ha sido ejecutado en su totalidad. Solo queda pendiente la implementación del sistema de información geográfica (GIS), etapa final necesaria para completar completamente el proyecto.


EPS MUNICIPAL MANTARO

El programa de inversiones total de EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. para el Periodo regulatorio 2023-2028 asciende a **S/ 16,311,334**. De este monto, S/ 15,055,839 corresponde a inversiones financiadas con el Fondo de Inversiones; S/ 235,000 corresponde a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE); S/ 490,495 para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC) y S/ 530,000 para financiar la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC).

La ejecución de inversiones de EPS MUNICIPAL MANTARO con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 40.8%** respecto a lo programado para el segundo (2) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 56. EPS MANTARO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO DIC. 2023 A NOV. 2028)

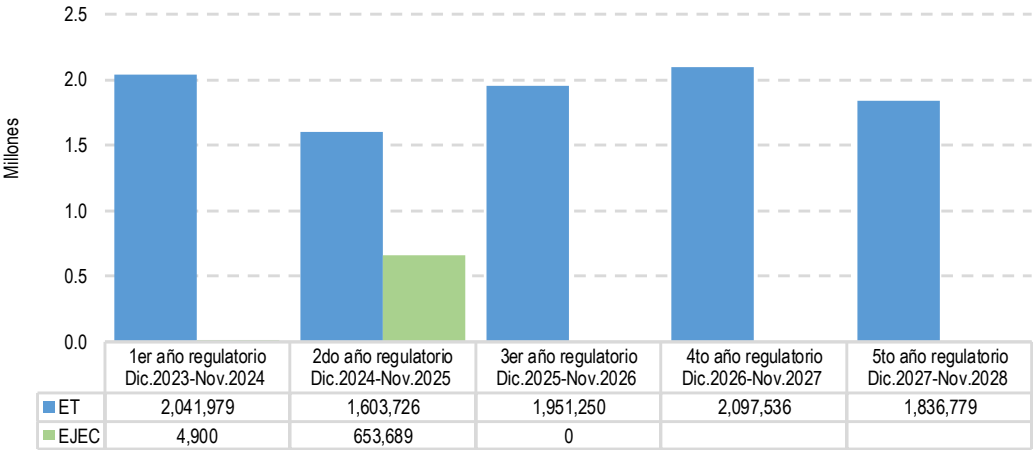


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

MANTARO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Dic.2023-Nov.2024	2do año regulatorio Dic.2024-Nov.2025	3er año regulatorio Dic.2025-Nov.2026	4to año regulatorio Dic.2026-Nov.2027	5to año regulatorio Dic.2027-Nov.2028
MANTARO Dic.2023-Nov.2028	0.2%	40.8%	0%	0%	0%

MANTARO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La empresa registró un **avance acumulado de 6.9%** de sus inversiones respecto a lo programado el Periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (2do año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto ***"Ampliación de micromedidores de la localidad de Jauja, provincia de Junín, región Junín"***, en el Año 1 se instalaron 250 medidores, con un avance físico del 100%, la empresa prestadora solicitó el adelanto de la inversión a la SUNASS. Respecto al Año 2 y parte del Año 3, se instaló 900 medidores de ampliación y 250 medidores de renovación, con un avance físico del 100%.

Respecto al proyecto ***"Rehabilitación de tubería de HDF DN 200 mm sector Yurajcunya, incluye By-pass al R2"***, con el CUI 2608789, en el año regulatorio 1 se ejecutó el By-pass al R2 por el importe de S/. 59,127. Para el año regulatorio 2 se registró otro IOARR ***"Adquisición de línea de Conducción, Válvula de Control y Cámara de Válvulas; en el(La) La EPS Mantaro S.A Zonal Jauja del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Sector Yurajcunya, Distrito de Parco, Provincia Jauja, Departamento Junín"*** con CUI 2699940. El costo del proyecto asciende a S/. 441,781. Se cuenta con el expediente técnico aprobado, asimismo se encuentra en proceso de selección los bienes y servicios solicitados por el área usuaria.

Respecto al proyecto ***"Instalación de 57 válvulas de purga de aire en redes de agua potable"***, de la localidad de Chupaca, el año regulatorio 1 y 2 se culminó con la instalación de válvulas, tienen un avance físico del 100%.

Respecto al proyecto ***"Ampliación de micromedidores de la localidad de Chupaca, provincia de Junín, región Junín"***, en el año regulatorio 1 se instalaron 260 medidores, con un avance físico 100%. En el año regulatorio 2 se aprobó la IOARR ***"Adquisición de equipo hidráulico; en el(la) sistema de agua potable e instalación de micromedidores, en el distrito de Chupaca, provincia Chupaca, departamento Junín"*** con CUI 2690406, se culminó con la instalación de 600 medidores, tiene un avance físico 100%.

TABLA 33. PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE EPS MANTARO S.A.

CUI u otros	Nombre del proyecto	Costo total actualizado (a dic. 2025)	Beneficiarios (habitantes)	Nivel de avance financiero acumulado	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de culminación de ejecución
2608789	Construcción de línea de conducción; en el(la) Yuraccunya tramo del reservorio R1 al reservorio R2 distrito de Yauyos, provincia Jauja, departamento Junín	65,701.44	ND	Ejecución culminada, no recepcionada (40%)	Oct 2023	Nov 2023
2699940	Adquisición de línea de conducción, válvula de control y cámara de válvulas; en el(la) la EPS MANTARO S.A zonal Jauja del sistema de abastecimiento de agua potable del sector Yurajcunya distrito de Parco, provincia Jauja, departamento Junín	441,780.79	ND	En convocatoria (2.2%)	Nov 2025	Dic 2025
2690406	Adquisición de equipo hidráulico; en el(la) sistema de agua potable e instalación de micromedidores, en el distrito de Chupaca, provincia Chupaca, departamento Junín	187,088.00	ND	Con liquidación (69%)	May 2025	Nov 2025

Fuente: Sistema de seguimiento de inversiones del MEF
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS


EPS MARAÑON

El programa de inversiones total de EPS MARAÑON S.A para el Periodo regulatorio 2023-2028 asciende a **S/ 18.94 millones**. De este monto, S/ 15.99 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 800. mil corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y S/ 2.03 millones a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE). La empresa registró un avance acumulado de 2.0% de sus inversiones en lo que va de su Periodo regulatorio, con información al mes de junio 2025.

La ejecución de inversiones de EPS MARAÑON con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 26.3%** respecto a lo programado para el tercer (3) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 57. EPS MARAÑON - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET (PERIODO REGULATORIO DIC. 2023 A NOV. 2028)

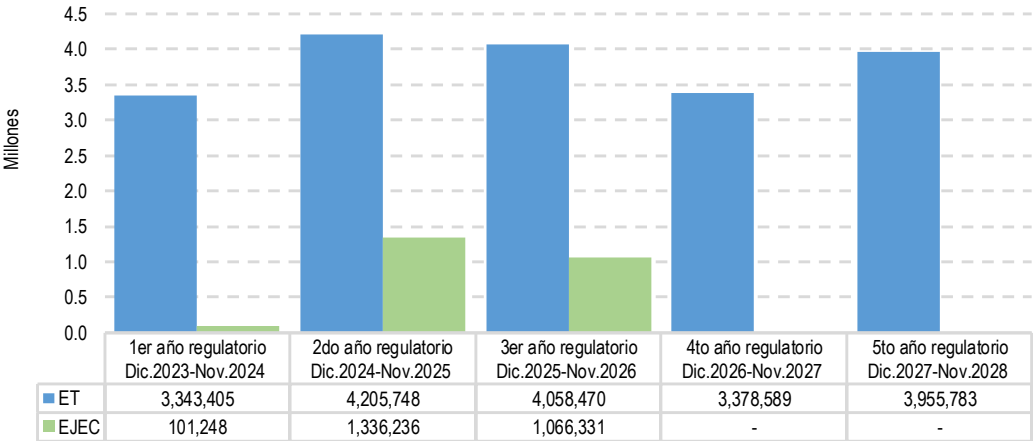


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

MARAÑON - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Dic.2023-Nov.2024	2do año regulatorio Dic.2024-Nov.2025	3er año regulatorio Dic.2025-Nov.2026	4to año regulatorio Dic.2026-Nov.2027	5to año regulatorio Dic.2027-Nov.2028
MARAÑON Dic.2023-Nov.2028	3.0%	31.8%	26.3%	0%	0%

MARAÑON - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La empresa registró un **avance acumulado de 13.2%** de sus inversiones respecto a lo programado el Periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto ***“Renovación de 10,786 medidores de agua potable en la ciudad de Jaén”***, por un monto de S/ 3,418.470.00 cuyos avances fueron realizados en el 2025 se ha llegado a un gasto de S/ 116,141.68 con un avance financiero del 3.4%. En cuanto al avance físico indicar que este proyecto se ejecutó en los 5 años regulatorios considerando que el 1 año regulatorio se logró la renovación 1,000 medidores, obteniendo un 9.3% de avance, para el año 2 se logró renovar 2,000 medidores, obteniendo un 32.4% de avance, para este 3 año se tiene previsto la renovación de 2,646 medidores cuyo proceso se encuentra ya en términos de referencia para la licitación.

El proyecto ***“Renovación de Válvula de Aire de las 13 Cámaras Reductoras de Presión en el Distrito de Jaén, Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca”*** se encuentra en operación financiado por recursos directamente recaudados.


EPS EMAPISCO

El programa de inversiones total de EPS EMAPISCO S.A para el Periodo regulatorio 2024-2027 asciende a **S/ 8,254,299**. De este monto, S/ 7,389,511 corresponde a las inversiones con el Fondo de Inversiones, S/ 361,500 corresponde a inversiones con reservas para el Plan de Control de Calidad, S/ 296,522 inversiones con reserva para la Gestión del Riesgo de desastres y S/ 206,766 con reservas para Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

La ejecución de inversiones de EPS EMAPISCO con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 48.9%** respecto a lo programado para el segundo (2) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.


GRÁFICO 58. EMAPISCO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2024 A DIC. 2026)

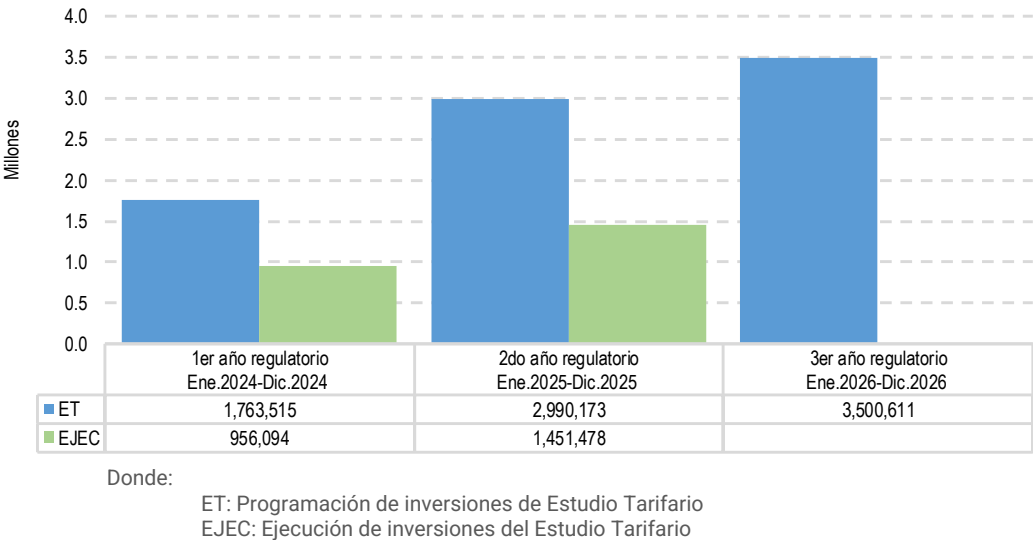

EMAPISCO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	2do año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	3er año regulatorio Ene.2026-Dic.2026
EMAPISCO Ene.2024-Dic.2026	54.2%	48.5%	0%

EMAPISCO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR TRIENIO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de EMAPISCO registró un **avance acumulado de 29.2%** respecto a lo programado en el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la **clasificación de empresas** según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** (pero cercano al umbral de eficacia) en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (2do año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto **"Recuperación de los pozos tubulares N° 01 y N° 04, distrito de Humay – provincia de Pisco - departamento de Ica"** con CUI 2471997, que cuenta con una inversión programada en el estudio tarifario de S/ 1,295,548. El cual se encuentra culminada y recepcionada al 100% física y financieramente, a la fecha se encuentra en proceso de liquidación.

Sobre el proyecto **"Recuperación del pozo tubular N°04, distrito de Humay"** se encuentra en etapa de recepción de obra, con un avance del 94.09%. El retraso registrado se debió a la presentación de un expediente adicional relacionado con el cableado eléctrico. La empresa ha sostenido reuniones con la contratista y el supervisor para subsanar esta observación y asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

La inversión **"Rehabilitación en el sistema de captación de agua cruda de la galería filtrante 'Pampa de Ocas'"** se encuentra en proceso para la elaboración del proyecto de inversión conforme al marco de Invierte.pe.

En cuanto al proyecto **"Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en usuarios de la localidad de Pisco"**, su ejecución está prevista para noviembre de 2025. Sin embargo, se encuentra suspendido debido a un recurso de apelación presentado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, a la espera de un pronunciamiento oficial.

Respecto a la inversión **"Disminución de usuarios morosos e inactivos de la EPS EMAPISCO S.A."**, en 2024 se ejecutó sin inconvenientes. Asimismo, se inició la ejecución en mayo de 2025, con un plazo previsto de siete meses.

El proyecto **"Rehabilitación estructural de la cúpula del reservorio N°2 de agua potable del distrito de Pisco"** tiene como fecha de inicio de obra el 15 de setiembre de 2025. Además, cuenta con contrato de obra y orden de servicio para la supervisión. La ejecución fue programada estratégicamente para esa fecha, a fin de evitar afectaciones al abastecimiento de agua durante las pruebas piloto del sistema en la ciudad.


EMAPAT

El programa de inversiones total de la EPS EMAPAT S.A. para el Periodo regulatorio 2023-2027 asciende a S/27.5 millones son con recursos propios. De los S/27.5 millones con recursos propios se conforman de la siguiente manera: S/23.2 millones corresponde a inversiones para los servicios de agua y alcantarillado; S/2.8 millones corresponde a reservas para financiar la gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación del cambio climático (ACC); S/1.2 millones a reservas orientadas a la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) y S/0.38 millones corresponde a reservas a financiar el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS).

La ejecución de inversiones de EPS EMAPAT con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 10.3%** respecto a lo programado para el tercer (3) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.


GRÁFICO 59. EMAPAT - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2023 A DIC. 2027)

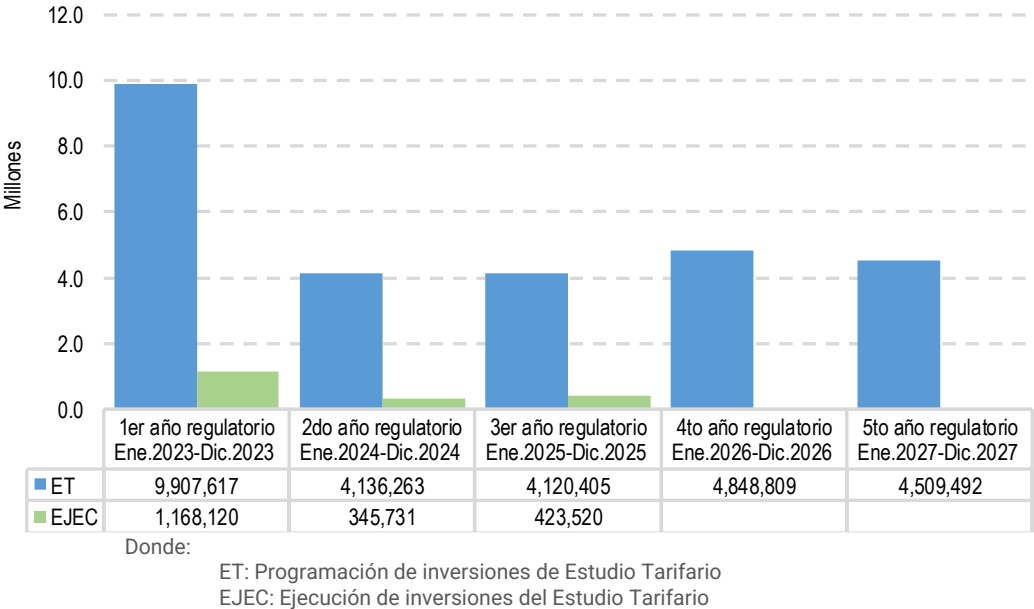

EMAPAT - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	2do año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	3er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	4to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	5to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
EMAPAT Jul.2023-Jun.2028	11.8%	8.4%	10.3%	0%	0%

EMAPAT - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de EMAPAT registró un **avance acumulado de 7.0%** respecto a lo programado para el Periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo a la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

La inversión "**Implementación del catastro técnico en el sector El Triunfo**" tiene como objetivo sistematizar información técnico-comercial en zonas periféricas de Puerto Maldonado. Presenta un avance del 99.87% y, aunque fue programada para concluir en 2024, aún se encuentra en ejecución. Esta herramienta permite mejorar la facturación, detectar conexiones clandestinas y actualizar la base de datos de usuarios.

La inversión "**Monitoreo de los Valores Máximos Admisibles (VMA)**" para descargas no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, presentó un avance acumulado del 50%. Se prevé alcanzar el 100% hacia finales de 2025.

La inversión "**Modernización de servicios de saneamiento con sistema de gestión integrada**" busca fortalecer la trazabilidad de procesos, la atención al usuario y la eficiencia operativa mediante herramientas tecnológicas y administrativas. Se encuentra en ejecución desde mayo de 2023, con un avance físico del 43.8% y operación parcial iniciada en diciembre de 2023.

El proyecto "**Implementación del catastro comercial y técnico en zonas de expansión urbana**", orientado a registrar y sistematizar información de nuevas zonas urbanas de Puerto Maldonado, tiene un avance del 99.4%. Aunque debía concluir en 2024, aún se encuentra en ejecución.

En relación con la "**Adquisición de equipo de cómputo para el área de facturación y cobranzas**", se viene cumpliendo conforme al cronograma, con un avance acumulado del 75%.

La inversión "**Implementación de una impresora de alta velocidad para el área de facturación y cobranza**" también avanza según lo previsto, alcanzando un 66.7% de ejecución acumulada.

La "**Renovación de 10 motos lineales para el traslado de personal lector**" se viene ejecutando progresivamente durante el periodo regulatorio, con un avance acumulado del 60%.

Por otro lado, cabe mencionar que el proyecto "**Construcción de línea de conducción en la PTAP Billinghurst y sistema de agua potable El Triunfo**", ubicado en el distrito de Las Piedras, reinició su ejecución tras haber sido programado en el periodo anterior. Actualmente presenta un avance financiero acumulado de 31.5%. Los retrasos registrados se debieron a las lluvias intensas y a interferencias por mantenimiento de infraestructura a cargo de la concesionaria IIRSA Sur.

Respecto al proyecto "**Construcción de casa de fuerza y adquisición de grupo electrógeno en la PTAP La Pastora**", ubicado en Tambopata, se encuentra en etapa de liquidación.

El proyecto "**Construcción de talud y renovación de línea de conducción en la captación La Pastora**", en Puerto Maldonado, fue reprogramado para el tercer año regulatorio (2025) y actualmente está en ejecución.

La inversión "**Construcción de sendero, central de vigilancia y oficina administrativa; reforestación del área ecológica en el Bosque Local Señor de la Cumbre**", en Inambari, continúa con trabajos pendientes de 2024.

En cuanto al proyecto "**Renovación del sistema de abastecimiento de agua potable en el Jr. Ica, ciudad de Puerto Maldonado**", programado para el segundo año regulatorio, se encuentra en etapa de cierre.

El proyecto "**Construcción de colector secundario en la Av. León Velarde del centro poblado Triunfo**", inició su ejecución en setiembre de 2025. A la fecha, registra un avance financiero acumulado del 6.6%.

Respecto al proyecto "**Construcción de red secundaria en varias calles del centro poblado El Triunfo**", también en Las Piedras, se encuentra culminado.


EMAPACOP

El programa de inversiones total de la EPS Seda Huánuco S.A. para el Periodo regulatorio 2023-2028 asciende **S/20.9 millones**, de este monto, S/ 18.6 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 584 mil corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al cambio climático, S/ 1.3 millones a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), por ultimo S/233 mil orientados a la implementación del control de calidad.

La ejecución de inversiones de EMAPACOP con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 112.5%** respecto a lo programado para el primer (1) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 60. EMAPACOP - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2029)

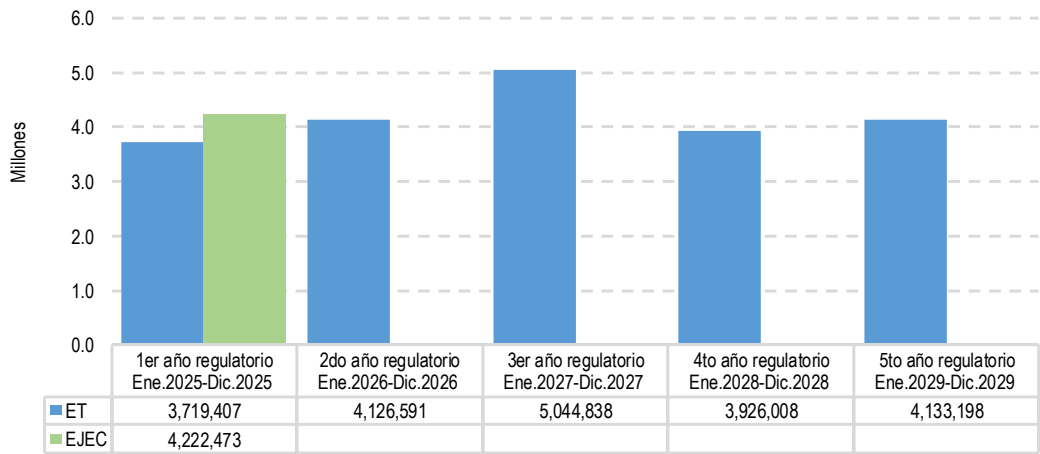


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMAPACOP - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028	5to año regulatorio Ene.2029-Dic.2029
EMAPACOP Ene.2025-Dic.2029	113.5%	0%	0%	0%	0%

EMAPACOP - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO VIGENTE



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de EMAPACOP registró un **avance acumulado de 20%** respecto a lo programado para el Periodo regulatorio vigente, financiadas con el Fondo de Inversiones y reservas, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo a la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

La inversión ***“Servicio de Reposición de Grifos contra Incendio en los sectores 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a y 3b de los distritos de Callería y Manantay”*** y ***“Adquisición de 42 Dataloggers con Adecuación de Caja para registro de datos de Continuidad y Presión”***, que iniciaron su ejecución en el segundo semestre del 2025, por lo que su ejecución se encuentra dentro de lo programado.

Respecto al proyecto ***“Actualización del Catastro Comercial Georeferenciado del Sector 12 en la Ciudad de Pucallpa”***, inversión que se encuentra en conformidad del servicio, hasta la fecha se ha cumplido con la Elaboración de Estudios y Ejecución de actualización del Catastro Comercial, con una inversión actualizada de S/ 143,750.00 (sin IGV).

Con respecto a la inversión ***“Optimización de sectorización progresiva de áreas operativas críticas (Sectores 1c, 2a, 4, 7 y 14) en los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha de la Ciudad de Pucallpa, provincia de coronel portillo, departamento Ucayali., Item 01”*** se encuentra en evaluación para solicitar el cambio en el programa de inversiones de la meta de gestión, debido a que el Ministerio de Vivienda viene realizando un proyecto integral, que tiene el mismo ámbito de intervención.

Asimismo, se contempla el proyecto ***“Mejoramiento y/o rehabilitación de la cisterna de 5,000 m³ de la PTAP de EMAPACOP S.A.”***, para el cual está previsto iniciar la elaboración del expediente técnico a partir de julio de 2025.

Por otro lado, la inversión ***“Adquisición e instalación de 4,199 micromedidores para el incremento de la micromedición en la ciudad de Pucallpa”*** tiene como fecha programada de inicio agosto de 2025 y de culminación octubre del mismo año, encontrándose también en fase preparatoria.

AGUAS LIMA NORTE


El programa de inversiones total de EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A para el Periodo regulatorio 2025-2029 asciende a **S/ 36,151,810**. De este monto, S/ 32,709,860 corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 145,000 corresponde a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) y S/ 966,510 a reservas orientadas a la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climática (ACC), S/ 1,588,914 a reservas orientadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y S/ 741,525 corresponden a reposición de equipos y maquinarias.

La ejecución de inversiones de AGUAS DE LIMA NORTE con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance de 70.7%** respecto a lo programado para el primer (1) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 61. AGUAS DE LIMA NORTE - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET

(PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2029)

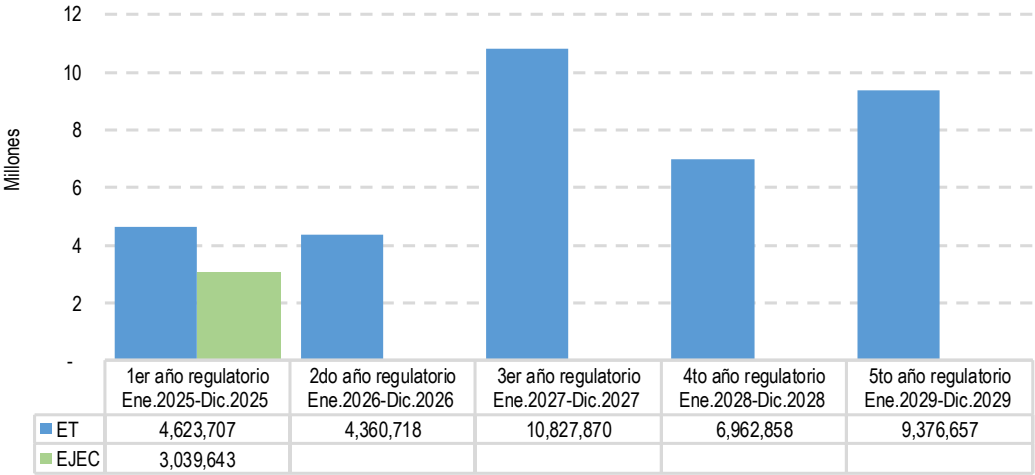


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

AGUAS DE LIMA NORTE - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028	5to año regulatorio Ene.2029-Dic.2029
AGUAS LN Ene.2025-Dic.2029	65.7%	0%	0%	0%	0%

AGUAS DE LIMA NORTE - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de AGUAS LIMA NORTE, registró un **avance acumulado de 9.3%** respecto a lo programado en el Periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

La inversión **“Optimización del sistema comercial mediante la renovación de medidores”**, que inició su ejecución en enero de 2025, por lo que su ejecución se encuentra dentro de lo programado, con un avance financiero de 27% y un avance físico de 43%. Esta obra realizó la renovación de 11,120 medidores, beneficiando a más de 44,480 habitantes.

Respecto al proyecto **“Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias de la prolong. Santa Rosa y calles aledañas del distrito de Hualmay - prov. Huaura - dpto. Lima”**, a diciembre 2025, se tiene un porcentaje de avance ejecutado acumulado financiero de 100% y avance físico de 100%, por lo que inició operación en enero de 2026. La obra contempló la instalación de 833.4 metros lineales de redes de agua potable y 710 metros lineales de redes de alcantarillado, beneficiando a más de 276 habitantes la prolongación Santa Rosas y calles aledañas.

Con respecto al Proyecto **“Optimización de las estaciones de bombeo de la localidad de huacho, Végueta y Sayán mediante la renovación y adquisición de equipos e instalación del sistema RECLOSER”**, contaba con una inversión programada de S/ 2,364,407 para el año 2026 y 2027, con un avance financiero de 0.32% y un avance físico de 7%. Actualmente, la empresa prestadora se encuentra en la etapa de adquisición de equipos de producción y distribución de agua potable. Tras el inicio de su ejecución en marzo de 2026, se proyecta su puesta en operación para octubre de 2026. Esta obra beneficiará a más de 88 mil habitantes en las localidades de Huacho, Végueta y Sayán.


EPS SELVA CENTRAL

El programa de inversiones total de EPS SELVA CENTRAL S.A para el Periodo regulatorio 2023-2028 asciende a **S/ 16,311,334**. De este monto, S/ 15,055,839 corresponde a inversiones financiadas con el Fondo de Inversiones; S/ 235,000 corresponde a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE); S/ 490,495 para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC) y S/ 530,000 para financiar la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC).

La ejecución de inversiones de EPS SELVA CENTRAL con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 67.0%** respecto a lo programado para el tercer (3) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 62. EPS SELVA CENTRAL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET (PERIODO REGULATORIO ENE. 2023 A DIC. 2027)

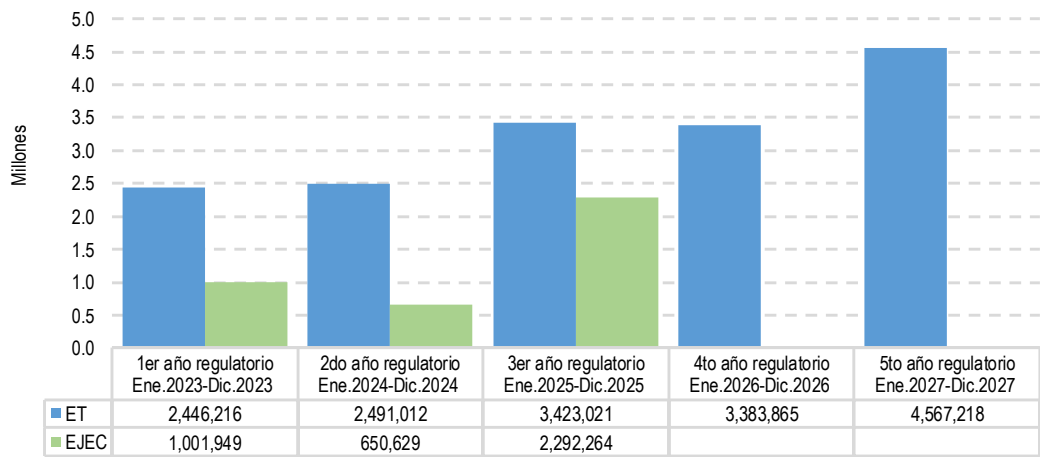


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SELVA CENTRAL - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	2do año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	3er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	4to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	5to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
SELVA CENTRAL Ene.2023-Dic.2027	41.0%	26.1%	67.0%	0%	0%

SELVA CENTRAL - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de SELVA CENTRAL registró un **avance acumulado de 24.2%** respecto a lo programado en el Periodo regulatorio vigente, financiadas con el Fondo de Inversiones y reservas, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto de ***“Instalación y reemplazo de medidores desagregado por cada Unidad operativa”***, al respecto la empresa prestadora ha registrado en una sola ficha IOARR la instalación y reemplazo de medidores por provincia y por cada año regulatorio.

- Las localidades de la Merced, Pichanaqui y San Ramón de la Provincia de Chanchamayo, tiene registrado para el Año 1 el CUI N° 2598282, el Año 2 el CUI N° 2640700 y para el Año 3 el CUI N° 2673164.
- Las localidades de Villa Rica y Oxapampa de la Provincia de Oxapampa, tiene registrado para el Año 1 el CUI N° 2600782, el Año 2 el CUI N° 2654221 y el Año 3 el CUI N° 2673411.
- La localidad de Satipo de la Provincia de Satipo, tiene registrado para el Año 1 el CUI N° 2600665, el Año 2 el CUI N° 2648229 y el Año 3 el CUI N° 2673144.

Las IOARR de instalación y reemplazo del Año 1 para las tres provincias, se encuentran culminadas, tienen un avance de ejecución del 100%, se instalaron 1,756 medidores.

Las IOARR de instalación y reemplazo del Año 2 para las tres provincias, se encuentran en ejecución, las causas del retraso se deben a las observaciones de los postores ante el OSCE en la etapa del proceso de selección, asimismo la renuncia del residente de obra. Se encuentra programado instalar 5,214 medidores.

Las IOARR de instalación y reemplazo del Año 3 para las tres provincias, se encuentran en proceso de selección, la modalidad de ejecución es por contrata. Se encuentra programado instalar 5,111 medidores.

Por otro lado, el proyecto ***“Línea de conducción de la captación Müller a la PTAP y al reservorio 1 – Oxapampa”*** está programado para ejecutarse en el quinto periodo regulatorio.

En cuanto a las inversiones complementarias, durante el primer periodo regulatorio se ejecutaron satisfactoriamente la *“Adquisición de software comercial”*, *“Mejora del sistema AVALON”*, *“Adquisición de servidor para la sede central de La Merced”* y *“Adquisición de 02 mini hidrojet”*, cumpliendo con lo programado.


EPS CHAVIN

El programa de inversiones total de EPS CHAVIN S.A para el Periodo regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 21.6 millones. De este monto, S/ 20.4 millones corresponde a inversiones para los servicios de agua y alcantarillado; S/ 0.36 millones corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación del Cambio Climático (ACC), S/ 0.36 millones a reservas orientadas a la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y S/ 0.49 millones a reservas orientadas al Pan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS).

La ejecución de inversiones de EPS CHAVIN con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 62.4%** respecto a lo programado para el tercer (3) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 63. EPS CHAVIN - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2023 A DIC. 2027)

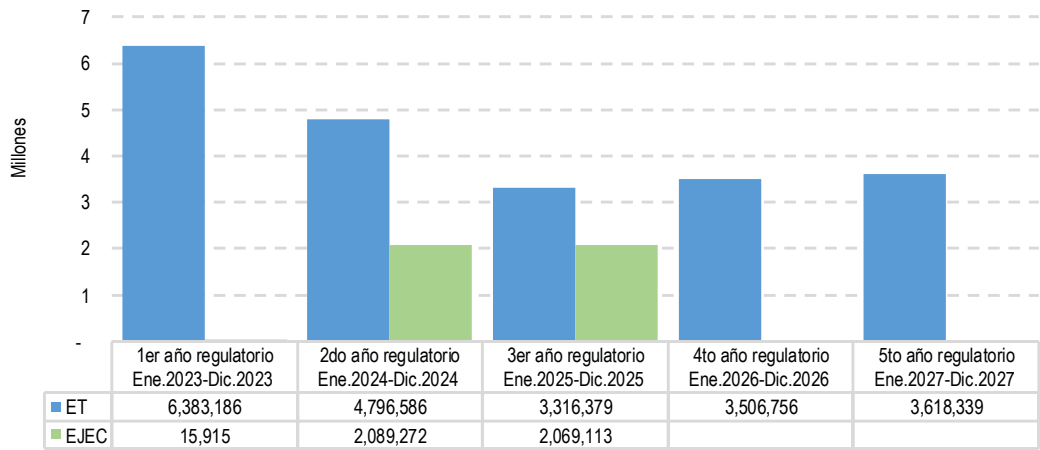


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

CHAVIN - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	2do año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	3er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	4to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	5to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
CHAVIN Ene.2023-Dic.2027	0.2%	43.6%	62.4%	0%	0%

CHAVIN - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de CHAVIN, registró un **avance acumulado de 19.3%** respecto a lo programado en el Periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo a la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

Sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3 año regulatorio) del programa de inversiones del estudio tarifario, los proyectos **“Adquisición de micro medidores; en el(la) optimización de medidores en conexiones domiciliarias de agua potable de la ciudad de Huaraz distrito de Huaraz, provincia Huaraz, departamento Áncash”**, quien iniciará su ejecución en abril de 2026 y **“Adquisición de equipo hidráulico; en el(la) optimización de macromedidores de las plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad de Huaraz, Caraz, Chiquian y Aija distrito de Huaraz, provincia Huaraz, departamento Áncash”**, quien tiene un porcentaje de avance ejecutado acumulado financiero de 84.5% y avance físico de 97.8%. Se prevé que entre en operación en septiembre de 2026, tras las ampliaciones de plazo y adendas derivadas de la importación de equipos por parte del contratista.

Respecto al proyecto **“Construcción de línea de aducción; en el(la) red asbesto cemento del reservorio Batan al sector de Nicrupampa distrito de Huaraz, provincia Huaraz, departamento Áncash”**, a diciembre 2024, se tiene un porcentaje de avance ejecutado acumulado financiero de 100% y avance físico de 100%, por lo que inició operación en octubre de 2024, beneficiando a más de 18 mil habitantes de la ciudad de Huaraz.

Con respecto a los proyectos **“Renovación de red primaria; en el(la) sistema de agua potable del sector ribera del río seco distrito de Huaraz, provincia Huaraz, departamento Áncash”** y **“Adquisición de equipo hidráulico; en el(la) optimización hidráulica de la red de distribución de agua potable en el jr. Ricardo palma y sector nueva esperanza, distrito de Huaraz, provincia Huaraz, departamento Áncash”**, con CUI 2648782, con una inversión de S/ 481,445 y S/ 260,241 respectivamente. Ambas intervenciones están programadas para iniciar su ejecución en julio de 2026, permitiendo mejorar la continuidad del servicio para más de 13 mil habitantes del sector Ribera del Río Seco, jr. Ricardo Palma y sector Nueva Esperanza.

Sobre el proyecto **“Adquisición de micromedidores en la ciudad de Caraz”** (CUI 2648824), relacionada a las fichas 66, 66A y 67, correspondientes a renovación y reposición de medidores en la ciudad de Caraz, fueron integradas en un solo IOARR con un presupuesto total de S/ 2,8 millones. Su ejecución inició en setiembre de 2024 debido a observaciones en el expediente técnico.

Sobre el proyecto **“Mejoramiento de la red de asbesto cemento – Sector Nicrupampa”** (Código 79) se ha sido ejecutado al 100%. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

Sobre el proyecto **“Optimización y evaluación del sistema hidráulico en PTAP de Huaraz”** (Código 7): el proyecto se encuentra en la etapa de elaboración del expediente técnico.

Sobre el proyecto **“Rehabilitación de la red primaria en el sector Ribera del Río Seco – Huaraz”** (Código 53): el proyecto también se encuentra en etapa de elaboración del expediente técnico.

Sobre el proyecto “**Estudios de factibilidad del sistema de producción “Auqui - Bellavista” – Huaraz** (Código 17) se encuentra en proceso de evaluación por parte de la EPS, que analiza la viabilidad de su ejecución.

6.5 Empresas Prestadoras Pequeñas

Finalmente, en esta sección, se detalla la información correspondiente a las inversiones realizadas durante el 2025 por las empresas prestadoras de menor tamaño, además de abordar la ejecución de las inversiones contempladas en el estudio tarifario.

En esta sección se muestra para cada empresa prestadora del grupo pequeñas que cuentan con estudio tarifario vigente, la siguiente información:

- Monto de inversión programado para cada año del periodo regulatorio.
- Nivel de ejecución financiera por cada año del periodo regulatorio.
- Nivel de ejecución financiera durante el periodo regulatorio.


EMUSAP

El programa de inversiones total de EPS EMUSAP S.A para el Periodo regulatorio 2021-2026 asciende a **S/ 10.24 millones**. De este monto, S/ 9.27 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios del Fondo de inversiones; S/ 223 mil corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y S/ 751 mil a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La ejecución de inversiones de EPS EMUSAP con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 80.2%** respecto a lo programado para el cuarto (4) año regulatorio, con información a diciembre de 2025¹⁷.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 64. EMUSAP - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO NOV. 2021 A OCT. 2026)

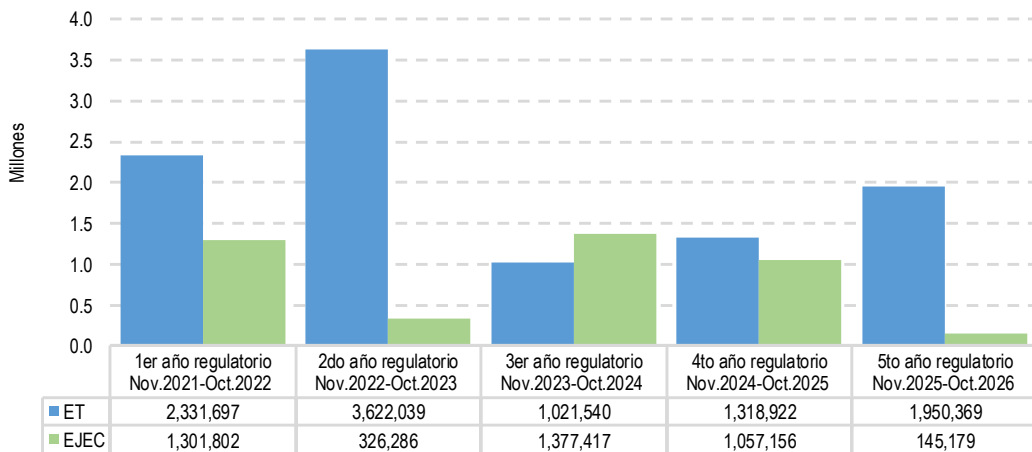


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMUSAP - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Nov. 2021-Oct. 2022	2do año regulatorio Nov. 2022-Oct. 2023	3er año regulatorio Nov. 2023-Oct. 2024	4to año regulatorio Nov. 2024-Oct. 2025	5to año regulatorio Nov. 2025-Oct. 2026
EMUSAP Nov. 2021-Oct. 2026	55.8%	9.0%	134.8%	80.2%	7.4%

EMUSAP - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

¹⁷ La información histórica fue revisada considerando la información remitida a Sunass mediante el Oficio N° 00237 - 2026- EMUSAP S.A.- GG -Ama3.

La ejecución de proyectos EMUSAP registró un **avance acumulado de 41.1%** respecto a lo programado en el Periodo regulatorio vigente, financiadas con el Fondo de Inversiones y reservas, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo a la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (4to año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto **“Construcción de sistema: en el(la) de filtración en la PTAP el Prado distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas”** con CUI 2609665. El costo total del proyecto según Resolución de Gerencia General N° 156-2025-EMUSAP S.A. de fecha 19/11/2025, asciende a S/ 805,176.55, cuya fuente de financiamiento corresponde al Fondo de inversiones (S/ 785,376.55) y Fondo operativo (S/ 19,800). El avance físico de la PTAP es de 100%. Y el proyecto IOARR se encuentra en proceso de liquidación técnico financiera. La población beneficiaria es aproximadamente 32,000 habitantes.

El proyecto **“Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y redes de alcantarillado en el(la) ciudad de Chachapoyas en los sectores: Los Castaños, Higos Urcos, Santa Isabel, El Alfalfar, distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazona”** con CUI 2599551. El costo total del proyecto según Resolución de Gerencia General N° 147-2024-EMUSAP S.A. de fecha 31/10/2024, asciende a S/ 1,377,416.56, cuya fuente de financiamiento corresponde al Fondo de inversiones. La IOARR se encuentra ejecutada físicamente al 100% y liquidada 100%.

El proyecto de **“Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias en el sector El Alfalfar – El Molino, en Chachapoyas”** (CUI: 2663423), cuenta con expediente técnico aprobado y una meta presupuestal de S/ 849 655 soles, financiado con fondos de inversión y programado para ejecución en 2025. A la fecha se han aprobado bases para 130 conexiones, quedando pendiente completar el expediente para las restantes.

Asimismo, la **“Renovación de la línea de impulsión en la caseta de bombeo Pedro Castro Alva”** (CUI: 2662126), con un presupuesto de S/ 339 500 soles, se encuentra en proceso de convocatoria, gestionándose la disponibilidad del terreno ante la Municipalidad.

Finalmente, el proyecto **“Renovación de la línea de impulsión del asilo de ancianos al reservorio Santo Toribio de Mogrovejo”** (CUI: 2662132) se encuentra en proceso de aprobación del expediente técnico.

YAULI LA OROYA


El programa de inversiones total de EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. para el Periodo regulatorio 2022-2026 asciende a S/ 986,661. De este monto, S/ 696,574 corresponde a inversiones financiadas con el Fondo de Inversiones; S/ 60,500 corresponde a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE); S/ 70,000 para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC) y S/ 159,587 para financiar la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC), Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Máximos Admisibles (VMA).

La ejecución de inversiones de EPS EMSAPA YAULI LA ORIYA con cargo a los recursos del Fondo de inversiones registra un **avance anual de 72.6%** respecto a lo programado para el cuarto (4) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 65. EMSAPA YAULI LA OROYA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET

(PERIODO REGULATORIO ENE. 2022 A DIC. 2026)

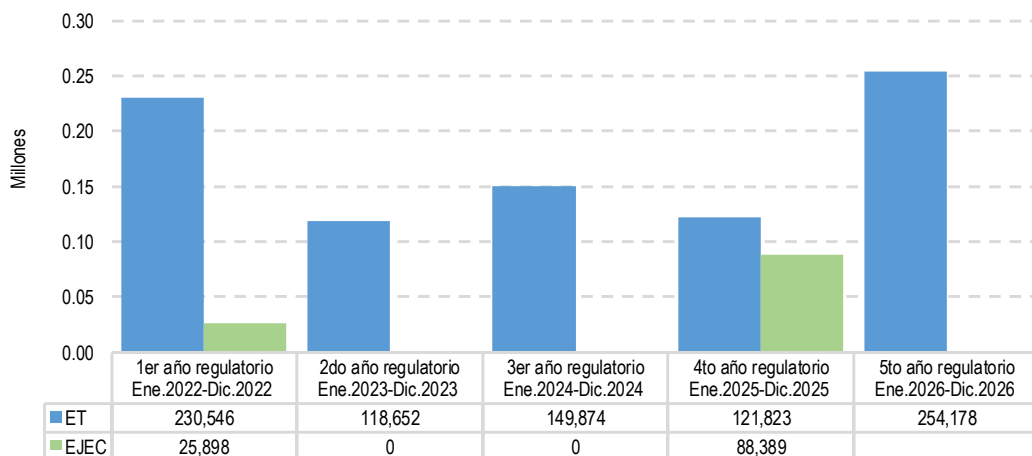

Donde:


ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario

EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

YAULI LA OROYA - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2022-Dic.2022	2do año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	3er año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	4to año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	5to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026
Y AULI LA OROYA Ene.2022-Dic.2026	11.2%	0%	0%	72.6%	0%

Y AULI LA OROYA - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de EMASAPA YAULI LA OROYA registró un **avance acumulado de 13.1%** respecto a lo programado en el Periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (4to año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto ***“Renovación de 1,081 Micromedidores de 1/2” en la ciudad de Yauli - La Oroya. No incluye cajas, marcos y tapas***, se ha concluido según lo programado en el estudio tarifario en los años regulatorios 2 y 3. Respecto al año regulatorio 4 se instaló 270 medidores, con avance físico del 100%.

Respecto al proyecto ***“Mejoramiento de las estructuras de almacenamiento de la EPS EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L”***, manifestaron que se encuentra en evaluación, van a replantear la ficha de inversión de acuerdo con el Programa de Inversiones del Estudio Tarifario.

Por último, el proyecto ***“Mejoramiento de las redes matrices de agua potable”*** se encuentra previsto para su ejecución en el quinto periodo regulatorio, de acuerdo con la programación establecida en el estudio tarifario.


EPS RIOJA

El programa de inversiones para el Periodo regulatorio 2022-2027 por un monto de S/ 3 403 488 sería financiado con cargo a los recursos del Fondo de Inversiones por un monto de S/ 2 797 588, S/ 146 500 será financiado con los recursos de la Reserva para la implementación del plan de control de calidad (PCC), elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) y. S/ 133 400 será financiado con los recursos de la Reserva para la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), S/ 326 000 será financiado con los recursos de la Reserva para implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC).

La ejecución de inversiones de EPS RIOJA con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 0.0%** respecto a lo programado para el tercer (3) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 66. EPS RIOJA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO DIC. 2022 A NOV. 2027)

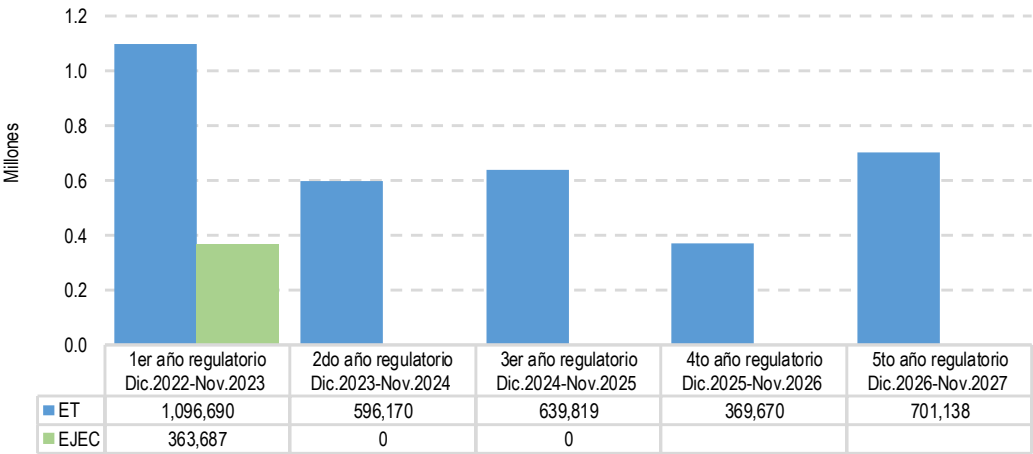


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

RIOJA - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Dic.2022-Nov.2023	2do año regulatorio Dic.2023-Nov.2024	3er año regulatorio Dic.2024-Nov.2025	4to año regulatorio Dic.2025-Nov.2026	5to año regulatorio Dic.2026-Nov.2027
RIOJA Dic.2022-Nov.2027	33.2%	0.0%	0.0%	0%	0%

RIOJA - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones correspondiente a ESP RIOJA registró un **avance acumulado de 10.7%** respecto a lo programado en el Periodo regulatorio, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y eficaz**.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

La inversión denominada **"Construcción de captación Río Negro"** no presenta ejecución física al 30 de junio de 2025. Sin embargo, el área usuaria ha solicitado la elaboración del expediente técnico correspondiente, con el objetivo de cumplir con el cronograma establecido en el estudio tarifario vigente. Actualmente, esta inversión cuenta con una orden de servicio para la elaboración del expediente técnico.

Por otro lado, la inversión **"Reforzamiento de la Línea de Conducción de Agua Cruda en la falda del Río Negro"** programada para 2023 no ha iniciado a junio de 2025, debido a que su costo supera el monto previsto. Actualmente, la EPS cuenta con el expediente técnico y ha solicitado financiamiento a la Municipalidad Provincial de Rioja.


EPS EMAPAB

El programa de inversiones de EMAPA S.A. para el Periodo regulatorio 2023-2027 asciende a **S/ 2 847 350**. Estas inversiones son financiadas con cargo al Fondo de inversiones por S/ 2 576 869 (de los cuales 88,1% están destinados para el servicio de agua potable y 11,9% para el servicio de alcantarillado), y las reservas de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos por S/ 69 000, Gestión del Riesgo de Desastres por S/ 44 000 y el Plan de control de calidad por S/ 187 481.

La ejecución de inversiones de EPS EMAPAB con cargo a los recursos del Fondo de inversiones registra un **avance anual de 117.1%** respecto a lo programado para el tercer (3) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 67. EMAPAB - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2023 A DIC. 2027)

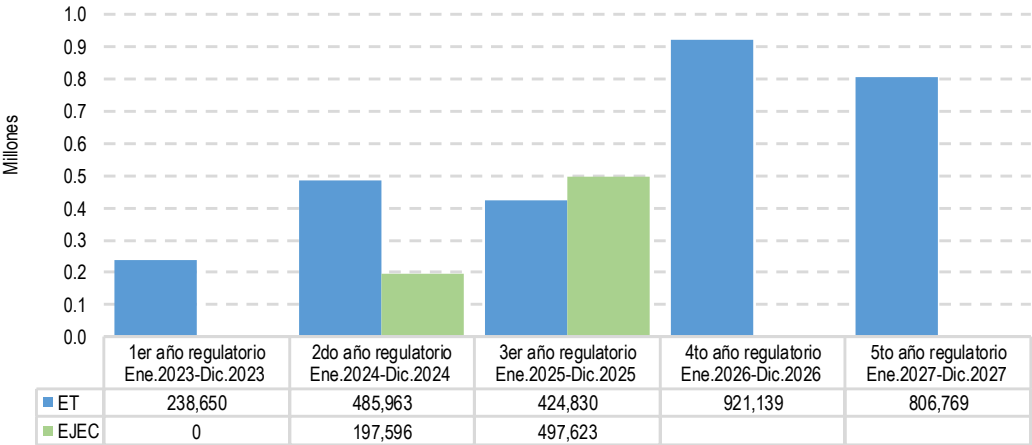


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMAPAB - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	2do año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	3er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	4to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	5to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
EMAPAB Ene.2023-Dic.2027	0%	40.7%	117.1%	0%	0%

EMAPAB - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones correspondiente a EMAPAB registró un **avance acumulado de 24.2%** respecto a lo programado en su Periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo a la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto de ***“Mejoramiento de líneas de conducción hacia los reservorios César Vallejo, PRONAP y El Edén”***, culminó su Etapa I con la instalación de 146 metros lineales de tubería PVC. No obstante, la Etapa II se identificó como duplicidad de intervenciones con un proyecto del Gobierno Regional de Amazonas, lo que llevó a la EPS a solicitar la modificación de esta actividad para redirigir los recursos hacia otras acciones de mejora del servicio, proceso actualmente en curso con licitación en marcha.

En cuanto al ***“Mejoramiento y optimización de los componentes de la PTAP César Vallejo”***, se logró culminar la gestión de expediente técnico, la instalación de macromedidores y la renovación parcial de tuberías; sin embargo, la obra ha enfrentado paralizaciones por falta de un plan de contingencia, aunque se mantienen coordinaciones para su reactivación.

Finalmente, el proyecto de ***“Mejoramiento de la red colectora en la avenida Dos de Mayo, sector César Vallejo”***, solo contempla la elaboración del expediente técnico.


EPS SIERRA CENTRAL

El programa de inversiones total de EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. para el Periodo regulatorio 2025-2029 asciende a **S/ 1,952,210**. De este monto, S/ 1,511,894 corresponde a inversiones financiadas con el Fondo de Inversiones; S/ 180,683 corresponde a la reserva para los costos de mantenimiento de las infraestructuras y reposición de equipos y maquinarias, S/ 76,211 corresponde a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE); S/ 95,921 para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y S/ 87,500 para financiar la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC).

La ejecución de inversiones de EPS SIERRA CENTRAL S.R.L con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 47.1%** respecto a lo programado para el primer (1) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 68. EPS SIERRA CENTRAL - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2029)

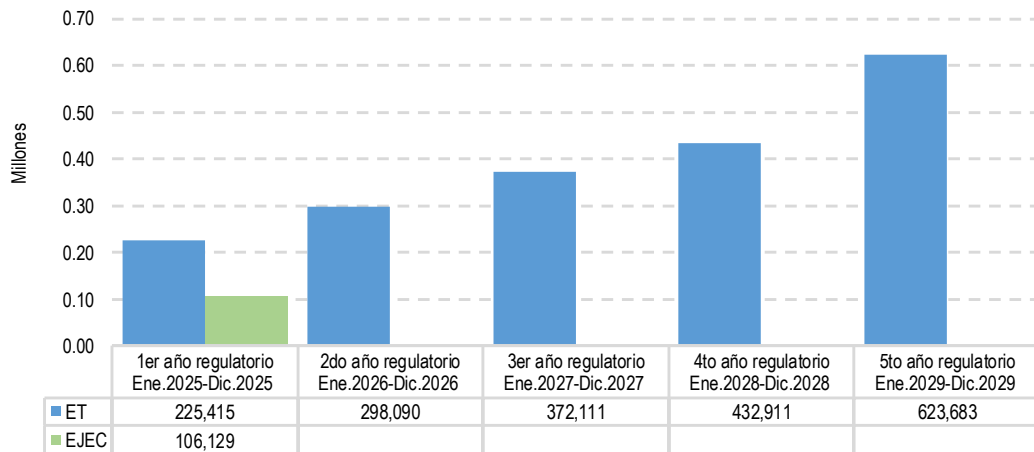


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

SIERRA CENTRAL - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028	5to año regulatorio Ene.2029-Dic.2029
SIERRA CENTRAL Ene.2025-Dic.2029	47.1%	0%	0%	0%	0%

SIERRA CENTRAL - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de SIERRA CENTRAL alcanzó un **avance acumulado del 5.4%** respecto a lo programado en su periodo regulatorio vigente, financiadas con el Fondo de Inversiones y reservas, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** (pero muy próximo al umbral de eficacia) en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones y reservas, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario¹⁸:

La inversión **“Adquisición de equipos de medición de presión y caudal para redes de distribución de agua potable de la EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.”**, con CUI N° 2702706, se ha concluido con la instalación de 10 datalogger, tiene un avance físico del 100% por el monto de S/ 38,983.05, fecha de inicio de operación en el mes de enero 2026.

La inversión **“Adquisición de micromedidores en el (la) Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Sierra Central SRL”** con CIU 2702702, se ha concluido con las conexiones vegetativas de 200 medidores cumpliendo al 100% la meta física, con un monto ejecutado total de S/ 16,969.49.

La inversión **“Adquisición de válvulas de Control en el (la) EPS Sierra Central SRL”** con CIU 2702702:habiendose realizado la adquisición e instalación de 29 válvulas cumpliendo al 100% la meta física, por un monto de S/ 4,788.20.

La inversión **“Renovación de Equipos de Control y automatización; en el (la) EPS Sierra Central S.R.L.”** con CUI 2702808; ejecutado y concluido al 100%.por el monto S/ 21,800.

Respecto al cofinanciamiento de la ficha OTASS para casetas de cloración para la EPS SIERRA CENTRAL S.R.L., se registró la IOARR **“Construcción de Cámara de Contacto de cloro; en el(la) EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. distrito de Tarma, provincia Tarma”** con CUI N° 2424940, se ha concluido con la ejecución de la obra, tiene un avance físico del 100%, fecha de inicio de operación en el mes de febrero 2026.

¹⁸ Información remitida por el Oficio N° 88-2026-GG-EPS-SC-TARMA y Oficio N°140-2026-GG-EPS-SC-TARMA.

EPS CALCA


El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2025-2027, asciende a **S/ 491,012** que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 202,557 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 97,256 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 161,715 corresponden a inversiones institucionales, S/ 12,000 corresponde a inversiones relacionadas a la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), S/ 9,000 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y S/ 8,484 corresponde a Reposición de equipos y maquinarias.

La ejecución de inversiones de EPS CALCA con cargo a los recursos del Fondo de inversiones registra un **avance anual de 90.2%** respecto a lo programado para el primer (1) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 69. EMSAPA CALCA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET

(PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2027)

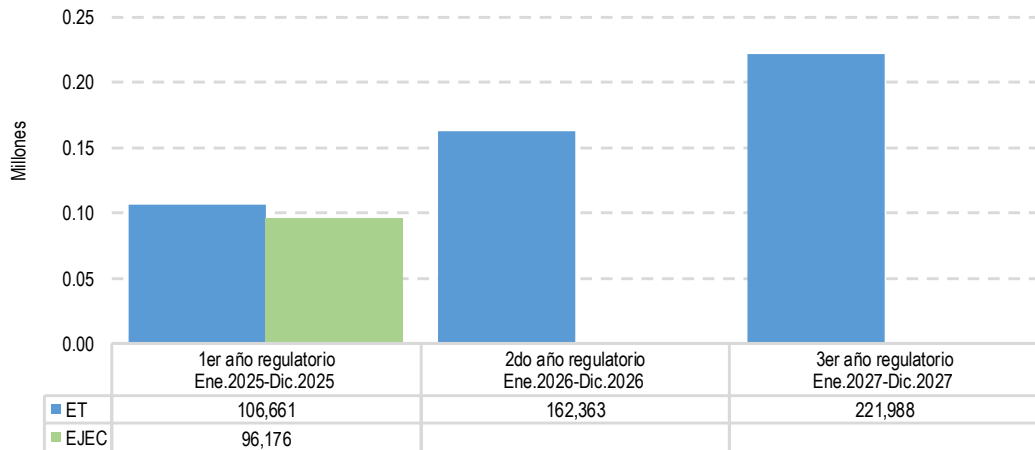


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

CALCA - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
CALCA Ene.2025-Dic.2027	90.2%	0%	0%

CALCA - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de CALCA alcanzó un **avance acumulado del 19.6%** respecto a lo programado en su periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

No obstante, se identifican algunos avances puntuales a nivel de proyectos específicos. El proyecto ***“Instalación de Nuevos Medidores en la Localidad de Calca (500 unidades)”*** se viene ejecutando de acuerdo con lo establecido en el estudio tarifario vigente. A la fecha, no se reportan contratiempos y se ha registrado un incremento en el número de beneficiarios, pasando de 500 a 568 conexiones atendidas, lo que representa un avance positivo en la cobertura del servicio.

Asimismo, el proyecto ***“Renovación de 405 Micromedidores de la Localidad de Calca e Instalación de Medidores en Conexiones Vegetativas”***, su ejecución también se desarrolla conforme a lo estipulado en el estudio tarifario. No se han reportado inconvenientes, y las actividades se mantienen dentro del cronograma previsto.

En cuanto al proyecto ***“Instalación de Medidores en Conexiones Vegetativas (516 unidades)”***, este se encuentra en proceso de ejecución y avanza sin retrasos ni contratiempos. Sin embargo, debido a limitaciones presupuestales, hasta el momento solo se han instalado 300 micromedidores. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de solicitud de requerimiento para completar la instalación de las unidades restantes.


EPS EPSSMU

El programa de inversiones total de EPS SMU S.A para el Periodo regulatorio 2023-2028 asciende a **S/ 6.92 millones**. De este monto, S/ 2.88 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; y S/ 2.79 millones financiados con transferencia del OTASS para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres y reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La ejecución de inversiones de EPSSMU con cargo a los recursos del Fondo de inversiones registra un **avance anual de 13.4%** respecto a lo programado para el tercer (3) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 70. EPSSMU - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO SET. 2023 A AGO. 2028)

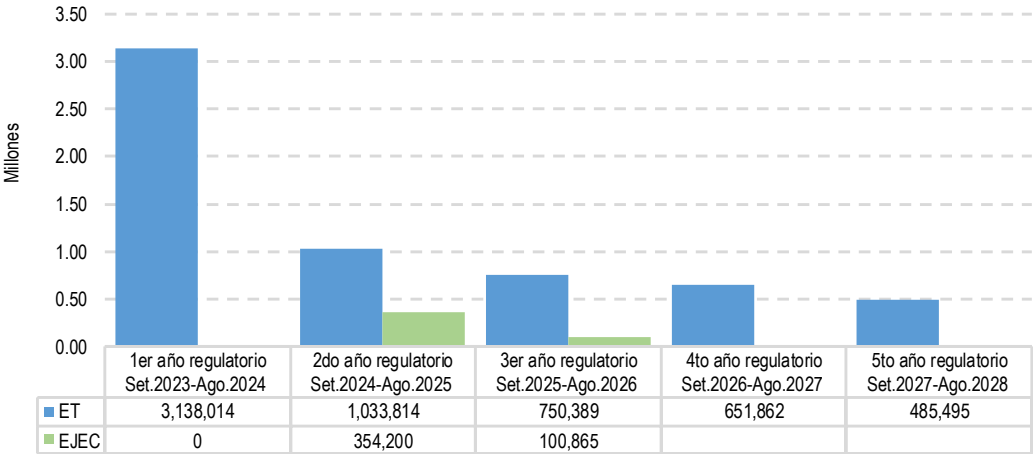

Donde:


ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario

EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EPSSMU - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Set.2023-Ago.2024	2do año regulatorio Set.2024-Ago.2025	3er año regulatorio Set.2025-Ago.2026	4to año regulatorio Set.2026-Ago.2027	5to año regulatorio Set.2027-Ago.2028
EPSSMU Set.2023-Ago.2028	0%	34.3%	13.4%	0%	0%

EPSSMU - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones correspondiente a EPSSMU registró un **avance acumulado de 7.5%** respecto a lo programado en su periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (2do año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

La inversión ***“Adquisición e instalación de 32 dataloggers”*** por un monto de S/ 227.740.00 cuyos avances fueron realizados desde el primer año regulatorio, tiene por objetivo medir el caudal de ingreso para los reservorios (01, 02, 03, 04 y 05). El 27 de noviembre del 2024, la EPSSMU otorga la buena pro a la empresa US ENGINEERS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L por un monto de S/. 76,000.00, el proyecto se encuentra culminado.

La inversión en ***“Renovación de redes de distribución de la EPS EPSSMU S.A.”***, ha sufrido retrasos por cambios en la unidad formuladora y ejecutora, encontrándose recién en etapa de creación de código de inversión, con miras a ejecutarse en el tercer año regulatorio.

De manera similar, la inversión denominada ***“Sectorización de las redes de distribución de agua potable para mejorar la eficiencia del sistema en los sectores de la ciudad de Bagua Grande y caserío San Luis del distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas”***, cuenta con un expediente técnico elaborado en 2022; sin embargo, su ejecución está prevista recién para 2026 y aún se encuentra pendiente la actualización de costos.

En cuanto a la inversión ***“Reparación del sistema de agua potable en el caserío San Luis, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas”***, por S/ 369 430 soles, el expediente fue elaborado por la EPS y la ejecución realizada por el Gobierno Regional de Amazonas, encontrándose actualmente en proceso de transferencia a la empresa.


EPS EMAPAVIGS

El programa de inversiones total de EPS EMAPAVIGS S.A para el Periodo regulatorio 2024-2027 asciende a **S/ 4,253,201**. De este monto, S/ 3,884,673 corresponde a las inversiones con el Fondo de Inversiones, S/ 199,527 corresponde a inversiones con reservas para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) y S/ 169,001 inversiones con reserva para Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La ejecución de inversiones de EPSSMU con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reseras registra un **avance anual de 7.5%** respecto a lo programado para el segundo (2) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 71. EMAPAVIGS - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2024 A DIC. 2027)

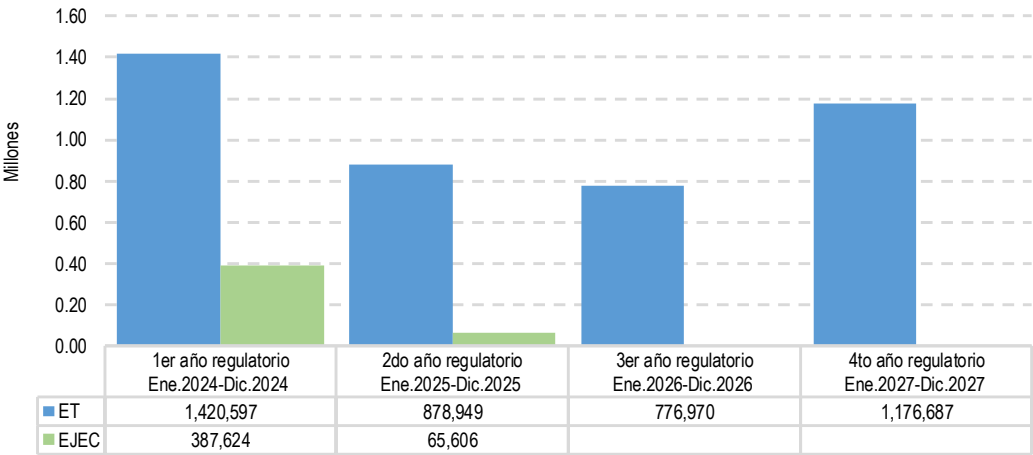


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMAPAVIGS - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	2do año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	3er año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	4to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
EMAPAVIGS Ene.2024-Dic.2027	27.3%	7.5%	0%	0%

EMAPAVIGS - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones correspondiente a EMAPAVIGS, registró un **avance acumulado de 10.7%** respecto a lo programado para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, de acuerdo con la información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025z.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (2do año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto **"Mejoramiento de la sectorización del sistema de agua potable en el cercado de Nazca, distrito de Nazca, Ica"** con CUI 2464133, que cuenta con una inversión programada en el estudio tarifario de S/ 1,770,696.06. El cual viene ejecutándose con un avance físico del 69.1% y una ejecución financiera de 85.8% (de acuerdo con el reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones, revisado el 07 de abril).

El proyecto **"Perforación de un pozo, estudio hidrológico y saneamiento físico legal para la ciudad de Nasca"** se encuentra en fase de elaboración del expediente técnico. El retraso en su ejecución se debe a problemas relacionados con el saneamiento físico legal del terreno. La empresa ha programado la intervención en la fase de ejecución a través de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI).

En cuanto al proyecto **"Renovación del sistema de desinfección en los pozos Cajuca N°1, Cajuca N°2, Cajuca N°3, Vista Alegre y Portachuelo; y renovación de macromedidor en pozo Cajuca N°2"**, este ya se encuentra culminado.


EPS EMAQ

El programa de inversiones de EMAQ S.A, para el periodo regulatorio 2024–2027, asciende a **S/ 3 387 558** que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 109 929 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 1 901 294 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 1 376 336 corresponden a inversiones institucionales, S/ 270 437 corresponden a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad, S/ 312 880 corresponde a inversiones relacionadas a la gestión de Riesgos de Desastres y S/ 144 900 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

La ejecución de inversiones de EMAQ con cargo a los recursos del Fondo de inversiones registra un **avance anual de 124.5%** respecto a lo programado para el segundo (2) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 72. EMAQ - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2024 A DIC. 2027)

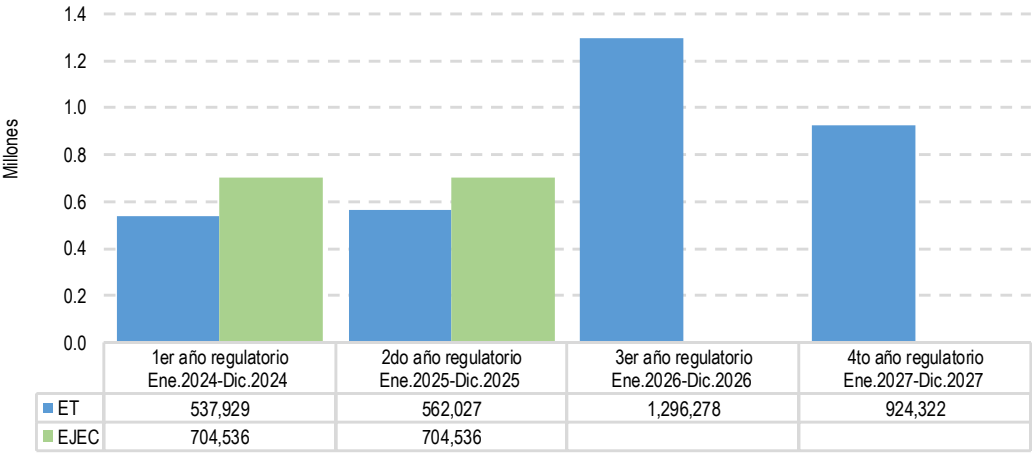


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMAQ - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	2do año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	3er año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	4to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
EMAQ Ene.2024-Dic.2027	116.5%	124.5%	0%	0%

EMAQ - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR CUADRIENIO
 REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones correspondiente a EMAQ, registró un **avance acumulado de 33.1%** respecto a lo programado para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones**, de acuerdo con la información a diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (2do año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

En cuanto al proyecto ***"Renovación de Línea de Aducción Santa Ana y Adquisición de Accesorios"***, se solicitó un cambio de inversión debido a la duplicidad con el proyecto del gobierno local denominado ***"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Quillabamba"*** (con CUI 2022722). Como resultado, la inversión fue redirigida y actualmente se encuentra en proceso de reformulación del expediente técnico, con financiamiento a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Por otro lado, los proyectos ***"Renovación de 2 681 Micromedidores por Cumplimiento de Vida Útil en el Período Regulatorio de la Localidad de Quillabamba"*** y ***"Renovación de 2 189 Micromedidores de la Localidad de Quillabamba"*** se encuentran en ejecución, conforme a lo establecido en el estudio tarifario vigente. A la fecha, presenta un avance de 40% y 45% respectivamente, sin que se hayan reportado dificultades significativas durante su implementación.

Respecto al proyecto ***"Renovación de línea de aducción Santa Ana y adquisición de accesorios"***, la EPS EMAQ S.A. informa que, a diciembre de 2025, este se encuentra paralizado. Dicha situación se debe a la duplicidad del proyecto con la Municipalidad Provincial de La Convención.


EPS HUANCVELICA

El programa de inversiones total de EPS EMAPA HUANCVELICA S.A. para el Periodo regulatorio 2025-2028 asciende a **S/ 3.81 millones**. De este monto, S/ 2.76 millones corresponde a inversiones financiadas con recursos propios; S/ 0.50 corresponde a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad (PCC), S/ 0.26 millones corresponde a reservas para financiar la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y S/ 0.28 millones a reservas orientadas a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

La ejecución de inversiones de EMAPA HUANCVELICA con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 15.2%** respecto a lo programado para el primer (1) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.


GRÁFICO 73. EPS HUANCVELICA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2028)

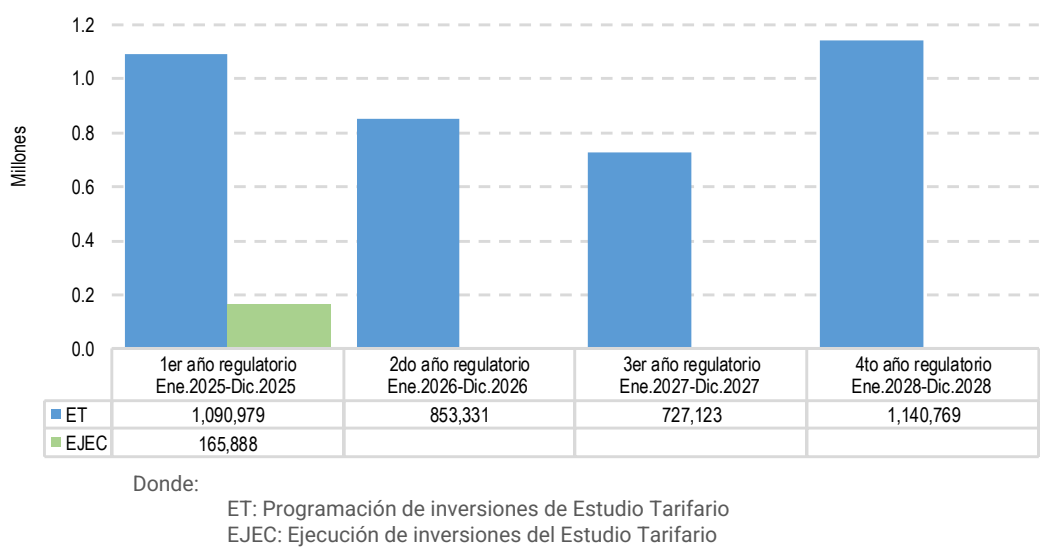

HUANCVELICA - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028
HUANCVELICA Ene.2025-Dic.2028	15.2%	0%	0%	0%

HUANCVELICA - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de EMAPA HUANCVELICA alcanzó un **avance acumulado del 4.4%** respecto a lo programado para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, según la información de diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

Sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (año regulatorio 1) del programa de inversiones del estudio tarifario, el proyecto **"Ampliación de red de agua potable y red de alcantarillado en los barrios de Santa Ana, San Cristóbal, Yananaco, Ascensión. Sectores operacionales de la EPS EMAPA HUANCVELICA S.A. en el distrito, provincia y departamento de Huancavelica"** con CUI 2664155. En el estudio tarifario se programó una inversión de S/ 218,882 para el año 2025; con un avance financiero de ejecución acumulado del 90.3% y avance físico de 100.0%, implica la construcción y/o instalación de 10 buzones, 294 ml de tubería de agua instalada y 292 ml de tubería de desagüe instalada; y su operación inició en setiembre de 2025. El proyecto beneficia a 100 habitantes del jirón Mercurio y pasaje Pachacutec de la localidad de San Gerónimo.

Por otro lado, en el periodo regulatorio 2025-2028, se han programado diversas inversiones enfocadas en la ampliación de redes de agua potable y alcantarillado:

- El proyecto **"Ampliación de red de agua potable y red de alcantarillado en los barrios de Santa Ana, San Cristóbal, Yananaco y Ascensión"** de la EPS EMAPA HVCA S.A., primera fase, fue ejecutado en su totalidad entre abril y agosto de 2025. A la fecha, se encuentra en etapa de liquidación física-financiera con cierre previsto para octubre del mismo año.
- El proyecto más avanzado es **"Ampliación de red de agua potable y red de alcantarillado en los barrios de Santa Ana, San Cristóbal, Yananaco, Ascensión"** (CUI 2664155), segunda fase, está programado para ejecutarse en los años 2026 y 2027, con montos de S/ 109,441 soles cada uno. Ambos se encuentran en fase de elaboración de estudios técnicos, por lo que aún no cuenta con expedientes aprobados ni ha iniciado ejecución.
- También destaca el proyecto **"Renovación de componentes y adquisición de equipos para la PTAP Millpo e Ichu"**, cuya ejecución comenzó en abril de 2025. Actualmente, los equipos adquiridos ya se encuentran operativos y el pago al proveedor ha sido completado.

Adicionalmente, se inició la ejecución de la renovación de 5,566 medidores de agua potable, con la adquisición de 1,009 medidores en 2025. Estos ya se encuentran almacenados, y su instalación se ejecutará como actividad conforme al cronograma establecido para los años siguientes. La renovación continuará en 2026, 2027 y 2028.

Asimismo, se completó la renovación de 5,200 medidores de agua potable, ejecutada como actividad y alcanzando el 100% de instalación. Asimismo, se ejecutaron múltiples proyectos de ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado en barrios de Huancavelica, todos con 100% de avance físico. Entre ellos destacan: Pasaje Boliviana - Ascensión (CUI 2468812), Av. San Gerónimo (CUI 2468814), Barrio Santa Anita (CUI 2497283), Red de distribución EPS EMAPA HVCA (CUI 2513722), Av. Malecón Santa Rosa (CUI 2553959), Jr. 05 Estrellas - Quintanillapampa (CUI 2565461) y Jr. Malecón - Millpo Ccachuana (CUI 2563660). Varios de estos proyectos aún están en proceso de liquidación físico-financiera, aunque algunos ya han sido cerrados en el sistema de inversiones del MEF.


EMAPA PASCO

El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2025 – 2027 asciende a **S/ 2 903 898** que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 78 570 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 713 298 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 1 778 387 corresponden a inversiones institucionales, S/ 151 010 corresponden a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad, S/ 80 989 corresponde a inversiones relacionadas a la gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático y S/ 101 644 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

La ejecución de inversiones de EMAPA PASCO con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 2.4%** respecto a lo programado para el primer (1) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Finalmente, cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 74. EMAPA PASCO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
 (PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2027)

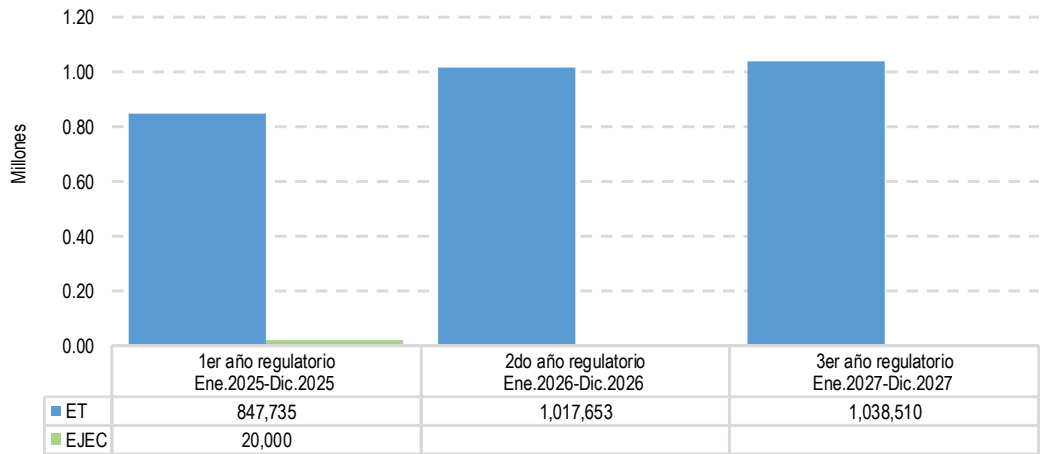


Donde:
 ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
 EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMAPA PASCO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
EMAPA PASCO Ene.2025-Dic.2027	2.4%	0%	0%

EMAPA PASCO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
 Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

La ejecución de inversiones de EMAPA PASCO alcanzó un **avance acumulado del 0.7%** respecto a lo programado para el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, según lo registrado hasta diciembre de 2025.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

Del total de 16 proyectos programados para el primer año regulatorio, se observa que 12 proyectos alcanzaron una ejecución física y financiera del 100%, lo que refleja su culminación satisfactoria. En contraste, los 4 proyectos restantes presentan un avance físico y financiero de 0%, evidenciando que aún no han iniciado su ejecución.

- "Adquisición de baterías internas para los caudalímetros electromagnéticos de la EMAPA PASCO S.A."
- "Implementación del catastro técnico operacional de redes de agua potable y alcantarillado de la EMAPA PASCO S.A."
- " Instalación de 02 caudalímetros electromagnéticos y data logger de 02 canales para los reservorios de la localidad de Vicco de la EMAPA PASCO S.A."
- *"Adquisición de equipos para el registro de datos en tiempo real del volumen de agua y presión en los reservorios de la localidad de Pasco"*
- Adquisición de equipo multifuncional (impresora, fotocopidora)

IMAGEN 18. INSTALACIÓN DE GRIFOS CONTRA INCENDIO EN EPS PASCO



Fuente: ODS Pasco


EMSAP CHANKA

El programa de inversiones de EMSAP CHANKA S.A. financiado con recursos propios para el Periodo regulatorio 2023-2027 asciende a S/ **3,582,554** de los cuales S/ 1,506,451 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 1,300,493.00 corresponden a inversiones en mejoramiento y S/ 775,610.00 corresponden a inversiones institucionales.

La ejecución de inversiones de EMSAP CHANKA con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 37.6%** respecto a lo programado para el tercer (3) año regulatorio, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 75. EMSAP CHANKA - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO ENE. 2023 A DIC. 2027)

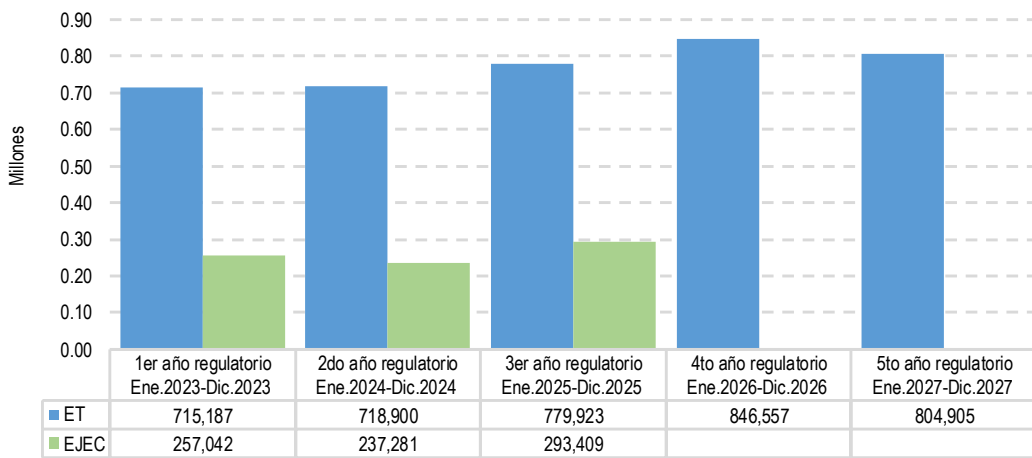


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

CHANKA - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2023-Dic.2023	2do año regulatorio Ene.2024-Dic.2024	3er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	4to año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	5to año regulatorio Ene.2027-Dic.2027
CHANKA Ene.2023-Dic.2027	35.9%	33.0%	37.6%	0%	0%

CHANKA - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA – SUNASS

La ejecución de inversiones correspondiente a CHANKA, registró un **avance acumulado de 20.4%** respecto a lo programado en el periodo regulatorio vigente, financiadas con el **Fondo de Inversiones y reservas**, con información a diciembre de 2025.

De acuerdo a la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y eficaz** en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (3er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

El proyecto **"Ampliación Marginal de Servicios mediante la Construcción de Línea de Impulsión, Sistema de Captación y Estación de Bombeo en el Servicio de Agua Potable de EMSAP Chanka S.A., distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac"** fue reemplazado por dos nuevas iniciativas. La primera, denominada **"Adquisición de terreno para la Ampliación Marginal de Servicios de Agua Potable"** (con CUI 2645821) tenía prevista la adquisición del terreno para julio. Sin embargo, aunque el proyecto inició el 21 de mayo, se encuentra actualmente paralizado por temas legales para realizar la compra del terreno. La segunda iniciativa relacionada es el proyecto **"Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano en la EPS EMSAP Chanka S.A., mediante la Construcción de Reservorio, Línea de Impulsión, Sistema de Captación y Estación de Bombeo"** (con CUI 334795), el cual se encuentra en etapa de formulación y permanece paralizado hasta que se complete la adquisición del terreno necesario para su ejecución.

En cuanto al proyecto **"Reparación de Red de Alcantarillado en la EPS Municipal Chanka S.A., en la avenida Carlos Flores Pinto del centro poblado Villa Salinas, distrito de Andahuaylas"**, se encuentra en proceso de reformulación del expediente técnico. El expediente original, elaborado en el año 2020, perdió vigencia, ya que la normativa establece un periodo máximo de tres años.

Finalmente, el proyecto original **"Renovación de 200 metros de colector secundario y conexión domiciliar de alcantarillado sanitario en la localidad de Andahuaylas"** fue reemplazado por dos nuevos proyectos. El primero, **"Renovación de Red de Alcantarillado y Red de Distribución en la Urbanización Alfredo Vásquez y Pasaje Zenobio Tello"**, fue ejecutado al 100% e inició operaciones en setiembre de 2024. El segundo, **"Renovación de colector secundario en el riachuelo Los Sauces, localidad de Andahuaylas"**, aún no ha comenzado su ejecución debido a observaciones realizadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el marco del trámite de autorización para obras en fuentes naturales o infraestructura hidráulica pública.

IMAGEN 19. RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE EPS CHANKA




Fuente: ODS Apurímac. Renovación de red de alcantarillado y red de distribución; en el(la) sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, en la Urbanización Alfredo Vásquez y pasaje Zenobio Tello del distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO

El programa de inversiones a nivel de AGUAS DEL ALTIPLANO, para el periodo regulatorio 2025–2029, asciende a S/ **651,981** que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 307,145 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 249,736 corresponden a inversiones institucionales, S/ 25,000 corresponde a inversiones relacionadas a la gestión de Riesgos de Desastres, S/ 20,000 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y S/ 50,100 corresponde a la reposición de equipos y Maquinarias. Cabe precisar que, adicionalmente, se programó inversiones para el 2024 por un monto de S/ 192,430.

GRÁFICO 76. EPS AGUAS DEL ALTIPLANO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO ENE. 2025 A DIC. 2029)

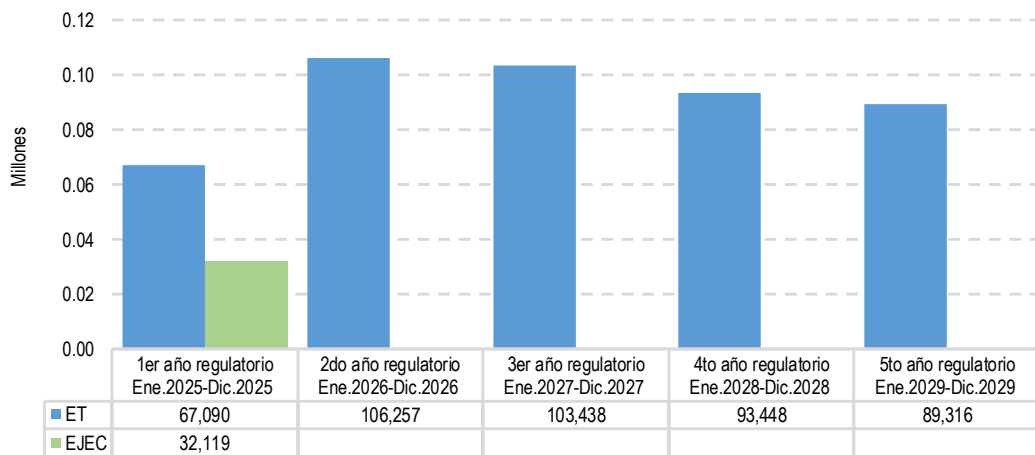


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

AGUAS DEL ALTIPLANO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028	5to año regulatorio Ene.2029-Dic.2029
AGUAS DEL ALTIPLANO Ene.2025-Dic.2029	47.9%	0%	0%	0%	0%

AGUAS DEL ALTIPLANO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES PARA EL PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA – SUNASS

La empresa AGUAS DEL ALTIPLANO con cargo a los recursos del Fondo de inversiones y reservas registra un **avance anual de 47.9%** respecto a lo programado para el primer (1) año regulatorio, según la información disponible hasta diciembre de 2025¹⁹.

La ejecución de inversiones correspondiente a AGUAS DEL ALTIPLANO, registró un **avance acumulado de 7.0%** respecto a lo programado en el periodo regulatorio vigente, financiadas con el Fondo de Inversiones y reservas, con información a diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

De acuerdo con la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como no ordenada y no eficaz en el 2025.

De acuerdo con el Reporte Regulatorio 15 Seguimiento de la ejecución financiera remitido por la empresa prestadora, sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (1er año regulatorio) financiados con recursos del Fondo de inversiones y reservas, se puede mencionar a las siguientes inversiones del Estudio Tarifario:

La inversión en **"Adquisición de medidores para las conexiones vegetativas"**, por un monto ascendente a S/ 10 mil (sin IGV). Así como la **"Adquisición de 3 data loggers con telemétrico"** por un monto de S/ 22.1 mil (sin IGV).

¹⁹ Cabe señalar que, respecto del monto reportado por la empresa prestadora se le descontó los pagos correspondientes al IGV.


EMAPA Y

El programa de inversiones de EPS EMAPA YUNGUYO S.R.L. asciende a S/ 836 076 que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 43 450 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 211 131 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 375 813 corresponden a inversiones institucionales, S/ 87 500 corresponden a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad, S/ 93 182 corresponde a inversiones relacionadas a la Gestión de Riesgos de Desastres y S/ 25 000 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

La empresa EMAPA Y no realizó inversiones, según la información disponible hasta diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 77. EMAPA Y - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO ENE. 2023 A DIC. 2027)

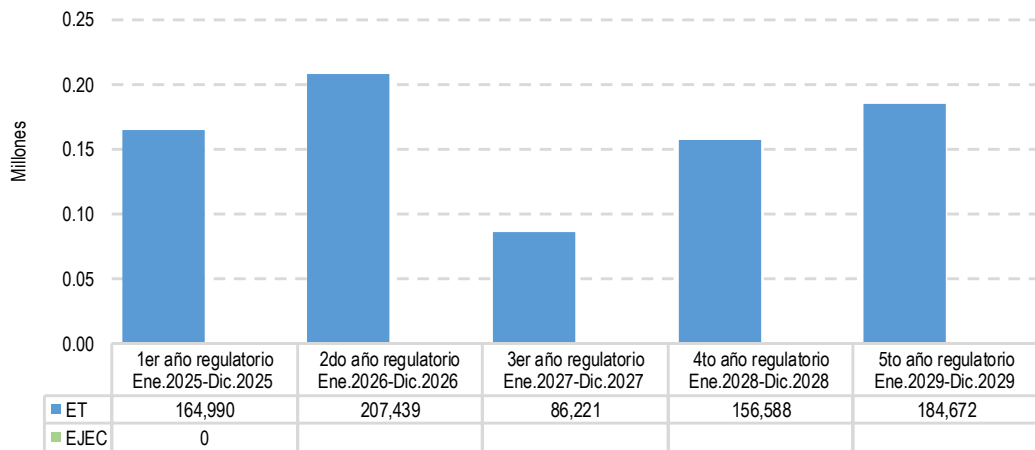


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

EMAPA Y - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028	5to año regulatorio Ene.2029-Dic.2029
EMAPA Y Ene.2025-Dic.2029	0%	0%	0%	0%	0%

EMAPA Y - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA – SUNASS

De acuerdo a la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **no ordenada y no eficaz** en el 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por la ODS Puno, el proyecto de **"Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Choquechaca"**, contemplado para el primer año regulatorio del estudio tarifario, no cuenta a la fecha con reportes sobre el inicio de su ejecución, estado operativo, situación actual, causas del retraso ni fuente de financiamiento.

Según lo indicado por la empresa, la resolución que aprueba el estudio tarifario se encuentra actualmente judicializada, razón por la cual dicho estudio no ha sido implementado. Esta información fue recabada a fines de junio de 2025. En consecuencia, la EP aún no ha puesto en marcha el estudio tarifario vigente.


EPS NOR PUNO

El programa de inversiones de EPS NOR PUNO S.A. financiado con recursos propios para el Periodo regulatorio 2025-2029 asciende a S/ 1 523 145 que serán financiados con recursos internamente generados por la EP; de los cuales S/ 323 889 corresponden a inversiones en ampliación, S/ 461 731 corresponden a inversiones en mejoramiento, S/ 344 270 corresponden a inversiones institucionales, S/ 33 100 corresponden a inversiones relacionadas al Plan de Control de Calidad, S/ 320 155 corresponde a inversiones relacionadas a la gestión de Riesgos de Desastres y S/ 40 000 corresponde a inversiones relacionadas a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

La empresa no realizó inversiones, según la información disponible hasta diciembre de 2025.

Cabe señalar que los valores presentados en este estudio corresponden a la ejecución del gasto en la fase de devengo, por lo que existe la posibilidad de variaciones en las cifras de ejecución de inversiones durante el proceso de fiscalización de la Sunass.

GRÁFICO 78. EPS NOR PUNO - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL ET
(PERIODO REGULATORIO ENE. 2023 A DIC. 2027)

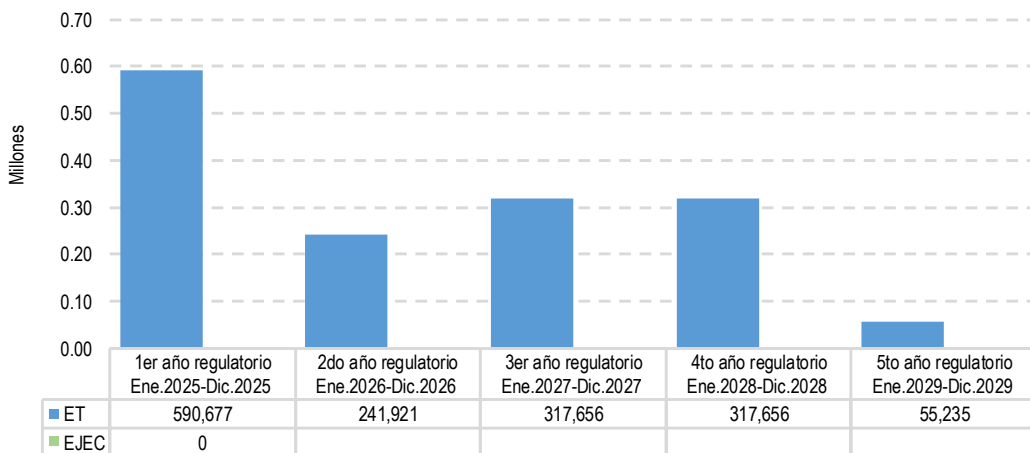


Donde:

ET: Programación de inversiones de Estudio Tarifario
EJEC: Ejecución de inversiones del Estudio Tarifario

NOR PUNO - EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES POR AÑO REGULATORIO

Empresa	1er año regulatorio Ene.2025-Dic.2025	2do año regulatorio Ene.2026-Dic.2026	3er año regulatorio Ene.2027-Dic.2027	4to año regulatorio Ene.2028-Dic.2028	5to año regulatorio Ene.2029-Dic.2029
NORPUNO Ene.2025-Dic.2029	0%	0%	0%	0%	0%

NORPUNO - EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE INVERSIONES POR PERIODO REGULATORIO



Fuente: Empresas de Saneamiento, Contabilidad Regulatoria
Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA – SUNASS

De acuerdo a la clasificación de empresas según su programación de inversiones y su ejecución, así como la programación de proyectos establecidos en el estudio tarifario y su inclusión en la programación presupuestal anual, se considera a esta empresa como **ordenada y no eficaz**.

Sobre la ejecución de las inversiones y medidas de mejora en el 2025 (año regulatorio 1) del programa de inversiones del estudio tarifario, el proyecto ***“Mejoramiento del sistema de respaldo de energía mediante grupo electrógeno para la PTAP EPS NOR PUNO de la ciudad de Azángaro Puno”***, ejecutada como actividad, inició su ejecución en el 24 de noviembre de 2025 y finalizó el 01 de febrero del 2026. En el estudio tarifario programó una inversión de S/ 320 155 para el año 2025 y culminó su ejecución el año 2026; con un avance financiero de ejecución acumulado del 70.94% y avance físico de 100.0%, por lo que inició su operación en febrero de 2026. El proyecto beneficia a 8,000 habitantes de la ciudad de Puno.

El proyecto de ***“Adquisición e instalación de 400 micromedidores por renovación y reposición en la localidad de Azángaro, provincia de Azángaro, departamento de Puno”***, la EPS ya ha adquirido los micromedidores y se encuentra ejecutando las labores de instalación correspondientes.



7. CONCLUSIONES

Con información a diciembre de 2025, las inversiones del sector saneamiento muestran un desempeño moderado, con avances importantes en la mejora de la gestión, pero aún con brechas relevantes en la ejecución presupuestal y la capacidad técnica de las empresas prestadoras.

En términos generales, la ejecución de inversiones en el ámbito urbano presenta un comportamiento diferenciado según el tamaño de las empresas. Las empresas de mayor escala mantienen niveles de ejecución superiores al promedio nacional, mientras que las medianas y pequeñas enfrentan dificultades persistentes vinculadas a su limitada capacidad operativa, procesos administrativos extensos y falta de planificación multianual efectiva.

En el caso de Sedapal, se evidencia un descenso en la programación presupuestal para inversiones. El Presupuesto aprobado anual para Inversiones (Formación bruta de capital – FBK) ascendía a **S/ 949 millones**, de cuales se ejecutaron **S/ 811 millones** en inversiones en 2025, alcanzando un **avance de ejecución presupuestal del 85.4%**.

En relación con las inversiones financiadas con cargo al Fondo de inversiones, Sedapal ejecutó **S/ 150 millones** en inversiones de agua potable y saneamiento durante el 2025, lo que representa un **avance anual de 48.1%** respecto de los **S/ 311.6 millones** programados para el cuarto (4) año regulatorio del periodo regulatorio 2022-2026, sin considerar las inversiones ejecutadas con cargo a otras reservas, tales como MRSE y GRD.

El nivel de ejecución de las empresas prestadoras (sin considerar a Sedapal) mantiene una tendencia de crecimiento sostenido desde el 2023. En el 2025, se registró una ejecución de inversión de S/ 289 millones, con un **nivel de ejecución agregado equivalente al 41.1 %**, ubicándose por encima del promedio histórico de 32% y constituyéndose como el mayor desde el 2017. Aunque la tendencia de inversión se mantiene estable, persisten desafíos estructurales: retrasos en expedientes técnicos, dificultades en contrataciones y limitaciones de gestión en la fase de ejecución.

Al analizar por tamaño, la ejecución de Proyectos de inversión de las empresas grandes 1 (G1) registró **S/ 146.9 millones**, con un avance de 46.5% respecto a lo programado en el año fiscal, que asciende a S/ 316.1 millones en el 2025. En términos de cantidad de proyectos de inversión, se programó un total de 224 proyectos de los cuales solo 145 tuvieron algún desembolso para su ejecución en el transcurso del año. Dentro de este grupo, SEDACUSCO se posiciona en primer lugar con un avance del 94.9 % de su presupuesto asignado, seguidos por SEDALIB y EPS TACNA con 48.9 %, y GRAU, que alcanza un 46.9 %. En quinto lugar, se ubica EPSEL, con una ejecución del 37.1 %, mientras que SEDAPAR, a pesar de contar con el mayor presupuesto, presenta un nivel de ejecución relativamente bajo, con apenas 33.2 %.

En 2025, de acuerdo con la información de la Consulta del Gasto Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES), la ejecución de Proyectos de inversión total alcanzó S/ 92.3 millones de los S/ 254 millones programados. De los 167 proyectos de inversión programados, solo 109 ejecutaron recursos en el año. En términos de ejecución presupuestal, el ranking es liderado por Agua de Tumbes, que alcanzó el 95.3 % de ejecución, seguida por SEMAPACH, con un destacado 77.9 %, y SEDAM HUANCAYO, con 73.7 %. En cuarto lugar, se encuentra SEDACAJ, con una ejecución de 37.7 %, mientras que SEDA JULIACA y SEDA HUÁNUCO registraron niveles de 33.3 % y 33.1 %, respectivamente. Mientras que, empresas como EMSA PUNO (32.5 %), EMAPA SAN MARTIN (24.0 %), EMAPICA (21.3 %), SEDALORETO (18.8 %), SEDA AYACUCHO, que registró una ejecución de 13.0 %. En los últimos lugares empresas que tuvieron desempeños bajos, como EMAPA CAÑETE con 3.1 % y SEDA CHIMBOTE que no registró ejecución en Proyectos de inversión.

En cuanto a las empresas medianas, en 2025, de acuerdo con la información de la Consulta del Gasto Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES), la ejecución de Proyectos de inversión total alcanzó S/ 41.0 millones de los S/ 105.6 millones programados.

En términos de cantidad de proyectos de inversión, se programó un total de 203 proyectos de los cuales 144 tuvieron algún desembolso para su ejecución en el transcurso del año. Los 3 primeros lugares se ubicaron las empresas prestadoras Aguas de Lima Norte en primer lugar con 100 %, seguido de EPS Municipal Mantaro con 76.5% y Emusap Abancay con 75.2%. Mientras que los últimos 3 lugares en las empresas medianas, se ubicaron Emapa Huaral (19.8 %), EMAPAT (19.1 %) y EMPSSAPAL (0.5%).

De acuerdo con la información de la Consulta del Gasto Presupuestal de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES), durante el 2025, las inversiones sumaron un total de S/ 8.7 millones, respecto a los S/ 27 millones programados. En cuanto al número de proyectos de inversión planificados, se contemplaron un total de 47, de los cuales únicamente 26 recibieron recursos para su implementación a lo largo del año. Este bajo nivel de avance refleja la persistencia de dificultades estructurales –falta de personal técnico especializado, escasa planificación y problemas en los procesos de contratación– que limitan su capacidad para materializar los proyectos previstos. Se observa que Aguas del Altiplano lidera el nivel de ejecución anual con un 89.1 %, seguida por Nor Puno con 72.5% y EPS Rioja con 70.7%.

A nivel agregado, la información a diciembre de 2025 revela que las empresas más grandes (G1 y G2) concentran más del 82.8 % de la inversión total ejecutada, mientras que las medianas y pequeñas continúan con una participación reducida. Esto confirma que la escala operativa y la solidez institucional siguen siendo determinantes en la capacidad de ejecución de inversiones.

En conjunto, los resultados del 2025 evidencian que, si bien el sector mantiene un esfuerzo sostenido por mejorar la gestión de inversiones, la eficacia en la ejecución presupuestal aún se encuentra por debajo del potencial esperado. Se requiere reforzar la planificación multianual, el seguimiento de proyectos estratégicos, la asistencia técnica y la coordinación interinstitucional, especialmente para las empresas con menor capacidad de gestión.

Finalmente, cabe señalar que, las cifras reportadas corresponden a la etapa de devengado del gasto, por lo que podrían ajustarse tras el proceso de fiscalización que realiza la Sunass.

ANEXOS

8. ANEXOS

8.1 Metodología para la calificación de las empresas prestadoras

a) Calcular los porcentajes correspondientes a empresas ordenadas y empresas eficaz

Se calcula los porcentajes correspondientes a los conceptos de empresa ordenada y empresa eficaz.

Empresa ordenada:

$$\text{Empresa ordenada (\%)} = \frac{PIMET}{PIPET} * 100$$

Donde:

PIMET: Monto del Presupuesto Institucional Modificado de inversiones del Estudio Tarifario programados por la empresa prestadora en el año en curso

PIPET: Monto del Programa de Inversión programado en el estudio tarifario para el año regulatorio en evaluación.

Empresa eficaz:

$$\text{Empresa eficaz (\%)} = \frac{12}{\lambda} * \frac{EPIMI}{PIMI} * 100$$

Donde:

EPIMI: Monto de ejecución presupuestal en todas las inversiones de la empresa prestadora, considerando todas las fuentes de financiamiento

PIMI: Monto de inversiones programadas en el Presupuesto Institucional Modificado del año en curso, considerando todas las fuentes de financiamiento.

λ : Número de meses considerados en la evaluación

b) Calcular el score (puntaje) de cada una de las empresas prestadoras

Se calcula el score considerando porcentajes antes calculados para empresa ordenada y empresa eficaz y los ponderadores correspondientes.

$$\text{Score} = 10 * \text{Ordenada (\%)} + 10 * \text{Eficaz (\%)}$$

Para calcular el score, los porcentajes calculados para empresa ordenada y empresa eficaz se encuentran truncados en 100%. Por lo que, en el mejor de los casos, el mayor score sería 20.

Finalmente, el score se redondea hacia el valor entero menor, ya que la clasificación del umbral "Desde" es un extremo cerrado del intervalo. Esto implica que, para obtener la clasificación correspondiente, el score tiene que pasar efectivamente el umbral.

c) Calificación de las empresas prestadoras de acuerdo con su score:

TABLA 34. UMBRALES DEL CLASIFICADOR DE EMPRESAS PRESTADORAS

Clasificación	Score	
	Desde (*)	Hasta
Muy Bueno	[19	20]
Bueno	[16	19 >
Aceptable	[13	16 >
Regular	[10	13 >
Crítico	[0	10 >

Nota: (*) Incluyendo el valor, inclusive.

Elaboración: DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA - SUNASS

TABLA 35. CÁLCULO DEL SCORE DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS

Nro.	Empresa	Empresa ordenada (%)	Empresa eficaz (%)	Score
Lima Metropolitana				
1	SEDAPAL S.A.	100.0%	85.4%	18
Empresas Grandes 1				
2	TACNA	89.9%	48.9%	13
3	SEDALIB S.A.	79.3%	48.9%	12
4	EPSEL S.A.	100.0%	37.1%	13
5	SEDAPAR S.A.	100.0%	33.2%	13
6	EPS GRAU S.A.	25.0%	46.9%	7
Empresas Grandes 2				
7	SEDACAJ	100.0%	37.7%	13
8	AGUA TUMBES	0.0%	95.3%	9
9	SEDA AYACUCHO	100.0%	13.0%	11
10	EMAPA SAN MARTIN	40.9%	24.0%	6
11	SEMAPACH	31.7%	77.9%	10
12	CAÑETE	100.0%	3.1%	10
13	SEDALORETO	0.0%	18.8%	1
14	EMSAPUNO	100.0%	32.5%	13
15	SEDAHUANUCO	61.7%	33.1%	9
16	SEDAMHUANCAYO	100.0%	73.7%	17
17	SEDACHIMBOTE	100.0%	0.0%	10
18	EMAPICA	53.3%	21.3%	7
19	SEDAJULIACA	21.6%	33.3%	5
Empresas Medianas				
20	EMAPISCO	85.3%	47.3%	13
21	ILO	83.3%	22.1%	11
22	MOQUEGUA	100.0%	51.9%	15
23	CHAVIN	0.0%	46.2%	4
24	AGUAS DE LIMA NORTE	70.5%	100.0%	16
25	SELVA CENTRAL	100.0%	48.7%	14
26	EPS BARRANCA	42.4%	30.5%	7
27	EMAPACOP	100.0%	35.7%	13
28	MOYOBAMBA	0.0%	52.2%	5
29	EMAPAT	77.0%	19.1%	9
30	EMAPA HUARAL	66.3%	19.8%	8
31	EMPSSAPAL	0.0%	0.5%	0
32	MANTARO	100.0%	76.5%	17
33	MARAÑON	100.0%	31.1%	13
Empresas Pequeñas				
34	EMUSAP SA	58.2%	39.7%	9
35	YAULI LA OROYA	100.0%	0.0%	10
36	EMAQ	92.3%	0.0%	9
37	SIERRA CENTRAL	100.0%	47.6%	14
38	CHANKA	37.6%	51.9%	8
39	EMAPAB	100.0%	6.7%	10
40	EMAPAVIGSSA	100.0%	4.3%	10
41	RIOJA	0.0%	70.7%	7
42	HUANCVELICA	0.0%	6.8%	0
43	CALCA	100.0%	0.0%	10
44	EMAPA PASCO	0.0%	12.3%	1
45	EPSSMU	0.0%	0.0%	0
46	EMAPA-Y	0.0%	0.0%	0
47	AGUAS DEL ALTIPLANO	47.9%	89.1%	13
48	NOR PUNO	0.0%	72.5%	7

8.2 Tablas detalladas sobre la programación y ejecución Inversiones Totales por empresa con datos del Sistema de Contabilidad Regulatoria

EMUSAP

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2629852	REHABILITACION DEL EJE DE PLATAFORMA Y ESTABILIZACION DE TALUD EN LA LINEA DE CONDUCCION ASPACHACA EN EL KMM10+815, SECTOR BARRETA CUCHO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	425,937	RDR	ET	-	-	0.0%
2	2514973	RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) RIGIDAS POR FLEXIBLES EN EL KM 2+785 AL KM 3+070 (LONGITUD L= 285ML) DE LA LINEA DE CONDUCCION ASPACHACA EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS	226,308	RDR	ET	-	-	0.0%
3	S/N	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR BOCA NEGRA Y CHUNCHULA (JR.KUELAP)AA.HH. SANTO TROIBIO DE MOGROVEJO - DISTRITO CHACHAPOYAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1,893,601	RDR	NO ET	-	-	0.0%
4	2609665	CONSTRUCCION SISTEMA DE FILTRACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PRADO - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	889,867	RDR	ET	434,354	334,408	77.0%
5	2647136	CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULA E INSTALACIONES DE VALVULAS DE AIRE EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	278,711	RDR	ET	332,990	274,090	82.3%
6	2662126	RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION EN LA CASETA DE BOMBEO AL RESERVOIRIO DE LA UU.PP. PEDRO CASTRO ALVA - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	351,500	RDR	ET	-	-	0.0%
7	2663423	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA ABAST. AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES EN LOS SECTORES EL ALFALFAR Y EL MOLINO EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS-DISTRITO Y PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	677,241	RDR	ET	-	156,868	0.0%
8	2662132	RENOVACION DE LA LINEA DE IMPULSION EN LA CASETA DE BOMBEO DEL ASILO DE ANCIANOS AL RESERVOIRIO DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO -DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - CUI N°26622132	270,419	RDR	NO ET	-	12,000	0.0%
9	N.A.	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA PARA INSUMOS QUIMICOS LIQUIDOS EN LA PTAP.	84,000	RDR	NO ET	-	42,000	0.0%
10	N.A	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - PTAP - EL PRADO.	929,282	RDR	ET	-	15,000	0.0%
11	N.A	COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	360,600	RDR	NO ET	-	19,400	0.0%
12	N.A	COMPRENDE LA INSTALACION DE SISTEMA DE DESINFECCION EN LA PTAP EL PRADO	-	RDR	NO ET	-	15,000	0.0%

SEDAHUANUCO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	0	ADQUISICIONES DE SERVIDORES E IMPRESORAS.	255,000	RDR	NO ET	79,450	-	0.0%
2	0	AMPLIACION Y ANULACION DE RED MATRIZ DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS SANTA ELENA II-RINCONADA DE LLICUA-AMARILIS-HUANUCO.	14,316	RDR	ET	-279	-	0.0%
3	0	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE REBOSE, REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS EN EL (LA) CAMARA ROMPE PRESION DE LA LINEA 24" DEL RESERVOIRIO QUE ABASTECE A LA CIUDAD DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO (OBRA).	658,196	RDR	ET	-40,887	-	0.0%
4	0	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE REBOSE, REMODELACION DE CAMARA DE VALVULAS EN EL (LA) CAMARA ROMPE PRESION DE LA LINEA 24" DEL RESERVOIRIO QUE ABASTECE A LA CIUDAD DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO (SUPERVISION).	30,265	RDR	ET	2,135	-	0.0%
5	0	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN, CANAL Y CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL DE CONDUCCION AGUA CRUDA - DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO (OBRA).	560,422	RDR	ET	-76,582	-	0.0%
6	0	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN, CANAL Y CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL DE CONDUCCION AGUA CRUDA - DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO (SUPERVISION).	23,646	RDR	ET	-5,910	-	0.0%
7	0	IMPLEMENTACION DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA GERENCIA DE INGENIERIA DE LA SEDE CENTRAL - EPS SEDA HUANUCO SA.	39,096	RDR	ET	4,594	-	0.0%
8	0	OPTIMIZACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA EPS SEDA HUANUCO SA - ZONAL AUCAYACU.	16,520	RDR	ET	32	14,702	45872.1%
9	0	OPTIMIZACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA EPS SEDA HUANUCO SA - SUCURSAL LEONCIO PRADO.	33,040	RDR	ET	40	-	0.0%
10	0	OPTIMIZACION DEL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIOS DE LA EPS SEDA HUANUCO SA - SUCURSAL LEONCIO PRADO - RUPA RUPA - LEONCIO PRADO HUANUCO.	6,381	RDR	ET	2,990	12,794	427.9%
11	0	OPTIMIZACION DEL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIOS DE LA EPS SEDA HUANUCO SA - ZONAL AUCAYACU - JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO.	10,200	RDR	ET	2,621	9,437	360.1%
12	0	OPTIMIZACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN EL CAISSON DE RECARGA DE LA EPS SEDA HUANUCO SA - SUCURSAL LEONCIO PRADO.	296,416	RDR	ET	216,814	-	0.0%
13	0	PROGRAMA DE MICROMEDICION Y ADECUACION DE CAJAS DE REGISTRO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE - HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO.	1,502,149	RDR	ET	653,518	2,908,177	445.0%

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
14	0	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA: EN LA PTAP DE EPS SEDA HUÁNUCO SA EN LA LOCALIDAD DE CANCHÁN, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO (OBRA)	599,321	RDR	ET	3,960	-	0.0%
15	0	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA: EN LA PTAP DE EPS SEDA HUÁNUCO SA EN LA LOCALIDAD DE CANCHÁN, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO (SUPERVISIÓN)	22,739	RDR	ET	-12,771	-	0.0%
16	0	RENOVACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE A NIVEL DISTRITAL-(HUÁNUCO - LEONCIO PRADO - RUPA RUPA Y JOSÉ CRESPO CASTILLO (EJECUCIÓN).	2,513,413	RDR	ET	94,732	11,820	12.5%
17	0	RENOVACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE A NIVEL DISTRITAL-(HUÁNUCO - LEONCIO PRADO - RUPA RUPA Y JOSÉ CRESPO CASTILLO (SUPERVISIÓN).	139,482	RDR	ET	56,774	-	0.0%
18	0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y MEDICIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDA HUÁNUCO SA - SUCURSAL LEONCIO PRADO.	1,223,423	RDR	ET	1,105,392	-	0.0%
19	0	COMPONENTE 01: INSERCIÓN DE VÁLVULA DE PURGA DE AIRE Y SEDIMENTOS, GRIFOS CONTRA INCENDIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN. COMPONENTE 02: INSERCIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA DE AIRE Y SEDIMENTOS EN LA LÍNEA DE ADUCCIÓN, COMPONENTE 03: REHABILITACIÓN DE VÁLVULAS, COMPUERTAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIOS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. (IOARR)	-	RDR	ET	-31,204	-	0.0%
20	0	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE REBOSE; EN EL (LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y REGIÓN DE HUÁNUCO.	-	RDR	ET	95,045	134,600	141.6%
21	0	CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS SEDA HUÁNUCO SA - SEDE CENTRAL	164,964	RDR	ET	48,150	30,740	63.8%
22	0	INSTALACIÓN DE NUEVOS MEDIDORES - HUÁNUCO.	112,560	RDR	ET	69,452	72,776	104.8%
23	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE LA CAPTACIÓN HASTA LA PTAP ALTO YAUSISA - ZONAL DE AUCAYACU - JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO..	-	RDR	ET	-3,920	-	0.0%
24	0	OPTIMIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A - SUCURSAL LEONCIO PRADO - RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO.	198,176	RDR	ET	-51,875	20,702	-39.9%
25	0	REHABILITACIÓN DE LA SALA DE MANDOS Y ZONA DE GALERÍA DE OPERACIÓN DE FILTROS DE LA PTAP 1 PTAP 2 DE LA EPS SEDA HUÁNUCO SA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	95,108	RDR	ET	1,017,938	324,756	31.9%
26	0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BAFLES EN LOS FLOCULADORES DE LA PTAP 1 Y 2 DE LA EPS SEDA HUÁNUCO SA, DISTRITO HUÁNUCO, PROVINCIA HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	945,103	RDR	ET	945,103	890,000	94.2%
27	0	INSTALACIÓN DE NUEVOS MEDIDORES - AUCAYACU	14,445	RDR	ET	28,703	26,554	92.5%
28	0	INSTALACIÓN DE NUEVOS MEDIDORES - TINGO MARÍA	29,266	RDR	ET	54,029	80,241	148.5%
29	0	OPTIMIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA EPS SEDA HUÁNUCO SA, ZONAL AUCAYACU - JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO -HUÁNUCO.	-	RDR	ET	198,176	50,920	25.7%
30	0	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA TUBERÍA DE AC. 10"-DESDE EL PUENTE ETEBAN PAVLETICH AL CLUB LAWN TENNIS.	-	RDR	ET	55,930	41,004	73.3%
31	0	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO Y COMECIAL DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA EPS SEDA HUÁNUCO SA - U.O. LEONCIO PRADO	-	RDR	ET	725,962	31,281	4.3%
32	0	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO Y COMECIAL DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	-	RDR	ET	-	1,890	0.0%
33	0	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO Y COMECIAL DE LA CIUDAD DE AUCAYACU COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	-	RDR	ET	309,067	31,378	10.2%

EMAPACOP

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2408201	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE DATOS; EN EL(LA) OPTIMIZACIÓN DE SECTORIZACIÓN PROGRESIVA DE ÁREAS OPERATIVAS CRÍTICAS (SECTORE 1C, 2A, 4, 7), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI - ÍTEM 1	1,896,434	DT	ET	6,705,040	-	0.0%
2	2607274	EJECUCION DE LA OBRA IOARR: ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL (LA) AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A., CON SUS RESPECTIVAS REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DE AGUA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2607274.	4,229,979	DT	NO ET	325,547	3,562,219	1094.2%
3	2689463	REMODELACION DE RESERVORIO; ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) RESERVORIO DE AGUA POTABLE DE 5000 M3 DE LA EPS EMAPACOP S.A DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	40,198	DT	NO ET	-	-	0.0%
4	2700744	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; EN EL(LA) PARAMETROS DE CONTINUIDAD Y PRESION MEDIANTE LA ADQUISICION DE 42 DATA LOGGERS CON ADECUACION DE CAJAS DE REGISTRO DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	412,350	DT	NO ET	350,174	360,000	102.8%
5	0	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL SECTOR 12 EN LA CIUDAD DE PUCALLPA	143,813	RDR	NO ET	-	-	0.0%
6	0	FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL EN LA EPS EMAPACOP S.A.	188,566	RDR	NO ET	-	-	0.0%
7	2700608	ADQUISICION DE GRIFO CONTRA INCENDIO; EN EL(LA) PARA LOS SECTORES 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A Y 3B DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	237,516	DT	NO ET	-	-	0.0%

SEDALORETO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	9523932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SECTOR R-11 EPS SEDALORETO SA, DISTRITO DE JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO – ETAPA 1	1,284,844	RDR	NO ET	-	25,327	0.0%
2	2632107	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN EN EL (LA) SECTOR MASUSA Y BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	1,510,044	RDR	ET	-	502,174	0.0%
3	2618794	REUBICACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACIÓN DEL PMD "CORONEL FRANCISCO SECADA VIGNETTA", DEL SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS – DEPARTAMENTO LORETO	339,990	RDR	NO ET	-	110,907	0.0%
4	2644403	CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRIMARIA, EN EL (LA) RED DE AGUA POTABLE DENTRO DE LOS AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y NUEVA VENECIA, EN LAS CALLES: PSJE. LAGUNAS (ENTRE CA. BELGRANO Y CA. SAN VALENTÍN); CA. 03 DE JUNIO (ENTRE PSJE. AMISTAD Y CA. BELGRANO), DISTRITO PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO	216,838	DT	NO ET	-	637,236	0.0%

EMAPA CAÑETE

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	INGEN.	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PROLONGACION SANTA ROSA	8,937	RDR	NO ET	8,937	-	0.0%
2	NO APLICA	INGEN.	2,850	RDR	NO ET	2,850	-	0.0%
3	NO APLICA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS VIALE BAJO	12,415	RDR	NO ET	12,415	-	0.0%
4	NO APLICA	INGEN.	713	RDR	NO ET	713	-	0.0%
5	NO APLICA	PROGRAMA AMPLIACIÓN A LA COBERTURA SAN VICENTE	67,576	RDR	NO ET	67,576	-	0.0%
6	INGEN.	INGEN.	31,526	RDR	NO ET	31,526	-	0.0%
7	NO APLICA	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JR. COLON CDRA 1 IMPERIAL	21,231	RDR	NO ET	21,231	-	0.0%
8	NO APLICA	INGEN.	3,236	RDR	NO ET	3,236	-	0.0%
9	NO APLICA	REG. GG 107-04 PRO. NUEVA SEDE	25,101	RDR	NO ET	25,101	-	0.0%
10	INGEN.	INGEN.	3,644	RDR	NO ET	3,644	-	0.0%
11	NO APLICA	INGEN.	85	RDR	NO ET	85	-	0.0%
12	NO APLICA	INGEN.	1,800	RDR	NO ET	1,800	-	0.0%
13	NO APLICA	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SECTOR SAN MIGUEL	12,195	RDR	NO ET	12,195	-	0.0%
14	NO APLICA	RENOVACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JR. BOLIVAR CDRA. 2.3, Y 4 CUADRA	5,550	RDR	NO ET	5,550	-	0.0%
15	NO APLICA	RED DE AGUA POTABLE II ETAPA CALLE CIPRESSES SAN VICENTE	31,753	RDR	NO ET	31,753	-	0.0%
16	NO APLICA	CONV. 05-08 CONSTRUCCION ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARIA MAGDALENA	8,282	RDR	NO ET	8,282	-	0.0%
17	NO APLICA	INGEN.	2,500	RDR	NO ET	2,500	-	0.0%
18	NO APLICA	REHABILITACION DE REDES DE REDES DE DESAGUE Y RECONEXION SAN VICENTE	19,585	RDR	NO ET	19,585	-	0.0%
19	NO APLICA	INGEN.	1,550	RDR	NO ET	1,550	-	0.0%
20	NO APLICA	CAPTACION DE AGUA MANIAITALES IMPERIAL	30,962	RDR	NO ET	30,962	-	0.0%
21	NO APLICA	INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN JUAN BARCELONA MALA	6,960	RDR	NO ET	6,960	-	0.0%
22	NO APLICA	AMPLIACION RED AGUA Y DESAGUE ASOCIACION VIVIENDA MELCHORITA	904	RDR	NO ET	904	-	0.0%
23	NO APLICA	INGEN.	4,345	RDR	NO ET	4,345	-	0.0%
24	NO APLICA	INGEN.	1,918	RDR	NO ET	1,918	-	0.0%
25	NO APLICA	RED DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS AV. IQUITOS QUILMANA	39	RDR	NO ET	39	-	0.0%
26	NO APLICA	AMPLIACION RED DESAGUE A.H. RAMOS LARREA IMPERIAL	115	RDR	NO ET	115	-	0.0%
27	NO APLICA	RED AGUA POTABLE A.H. SAN JOSE SAN VICENTE	3,760	RDR	NO ET	3,760	-	0.0%
28	NO APLICA	INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS URB POPULAR EL SOL	7,450	RDR	NO ET	7,450	-	0.0%
29	NO APLICA	EMPALME RED AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS C.P. DON OSCAR SAN LUIS	4,742	RDR	NO ET	4,742	-	0.0%
30	NO APLICA	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CONDORAY SAN VICENTE	5,755	RDR	NO ET	5,755	-	0.0%
31	NO APLICA	AMPLIACION RED AGUA POTABLE JR. AMAZONAS CUADRA 6 ANCASH	780	RDR	NO ET	780	-	0.0%
32	NO APLICA	RED DE DESAGUE Y CONEXIONES PROLONGACION JOSE GALBES SAN VICENTE	10,758	RDR	NO ET	10,758	-	0.0%
33	NO APLICA	INGEN.	1,100	RDR	NO ET	1,100	-	0.0%
34	NO APLICA	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ALMINARES	35,620	RDR	NO ET	35,620	-	0.0%
35	NO APLICA	INGEN.	574	RDR	NO ET	574	-	0.0%
36	NO APLICA	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO JR AYACUCHO CUADRA 9 Y CUADRA 10 QUILMANA	1,500	RDR	NO ET	1,500	-	0.0%
37	NO APLICA	RENOVACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE JOSEFINA RAMOS IMPERIAL	13,268	RDR	NO ET	13,268	-	0.0%
38	NO APLICA	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE JR. COLON 2 Y 3 IMPERIAL	6,365	RDR	NO ET	6,365	-	0.0%
39	INGEN.	INGEN.	243,779	RDR	NO ET	243,779	-	0.0%
40	NO APLICA	PROYECTO AGUA POTABLE ANEXO SANTA CRUZ DE ASIA	2,052	RDR	NO ET	2,052	-	0.0%

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
41	NO APLICA	INGEN.	70	RDR	NO ET	70	-	0.0%
42	NO APLICA	INGEN.	881	RDR	NO ET	881	-	0.0%
43	INGEN.	INGEN.	1,510	RDR	NO ET	1,510	-	0.0%
44	NO APLICA	INGEN.	144	RDR	NO ET	144	-	0.0%
45	NO APLICA	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SEMINARIO MAYOR	13,257	RDR	NO ET	13,257	-	0.0%
46	NO APLICA	RENOVACION DE REDES DESAGUE CALLE COMERCIO SAN LUIS	6,420	RDR	NO ET	6,420	-	0.0%
47	NO APLICA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE POZO AGUA QUILMANA	32,622	RDR	NO ET	32,622	-	0.0%
48	NO APLICA	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO LAS FLORES JR. CRUZ QUILMANA	16,160	RDR	NO ET	16,160	-	0.0%
49	NO APLICA	INGEN.	1,821	RDR	NO ET	1,821	-	0.0%
50	NO APLICA	INGEN.	1,718	RDR	NO ET	1,718	-	0.0%
51	INGEN.	INGEN.	80,198	RDR	NO ET	80,198	-	0.0%
52	NO APLICA	INGEN.	3,012	RDR	NO ET	3,012	-	0.0%
53	NO APLICA	RED AGUA SS.HH. SAN ANTONIO SECTOR 1 IMPERIAL	7,074	RDR	NO ET	7,074	-	0.0%
54	NO APLICA	AMPLIACION DE RED AGUA Y DESAGUE DEL JR. CARMEN 1 CUADRA IMPERIAL	7,354	RDR	NO ET	7,354	-	0.0%
55	NO APLICA	INGEN.	140	RDR	NO ET	140	-	0.0%
56	NO APLICA	CONV. 15-01 RED AGUA ASENTAMIENTO HUMANO SAN J	7,461	RDR	NO ET	7,461	-	0.0%
57	NO APLICA	RED AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS AV. IQUITOS	534	RDR	NO ET	534	-	0.0%
58	NO APLICA	INGEN.	1,998	RDR	NO ET	1,998	-	0.0%
59	NO APLICA	CONEXIONES DOMICILIAIRAS DE DESAGUE - QUILMANA	13,432	RDR	NO ET	13,432	-	0.0%
60	NO APLICA	INGEN.	350	RDR	NO ET	350	-	0.0%
61	NO APLICA	RENOVACION DE RED DESAGUE URB. CASUARINAS	9,956	RDR	NO ET	9,956	-	0.0%
62	NO APLICA	INGEN.	4,701	RDR	NO ET	4,701	-	0.0%
63	NO APLICA	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO MALECON LUNA	52,101	RDR	NO ET	52,101	-	0.0%
64	NO APLICA	RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE Y CONEXIONES DE LA AV. 28 DE JULIO	63,986	RDR	NO ET	63,986	-	0.0%
65	NO APLICA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED AGUA SECTOR 1 - QUILMANA	54,886	RDR	NO ET	54,886	-	0.0%
66	INGEN.	REHABILITACION DE REDES DE DESAGUE Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE IMPERIAL (SISMO)	524,384	RDR	NO ET	524,384	-	0.0%
67	NO APLICA	CON. 37-04 RED DE DESAGUE VIA JESUS Y OTROS	5,580	RDR	NO ET	5,580	-	0.0%
68	NO APLICA	INGEN.	2,210	RDR	NO ET	2,210	-	0.0%
69	INGEN.	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE IMPERIAL (SISMO)	672,166	RDR	NO ET	672,166	-	0.0%
70	NO APLICA	CONV 15-07 RED DE DESAGUE DE LA ASOCIACION LA PRIMAVERA	17,230	RDR	NO ET	17,230	-	0.0%
71	NO APLICA	INGEN.	1,904	RDR	NO ET	1,904	-	0.0%
72	NO APLICA	INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y COMP Y CONEXIONES DOMICILIRIAS DE SAN ANTONIO	18,008	RDR	NO ET	18,008	-	0.0%
73	NO APLICA	INGEN.	2,172	RDR	NO ET	2,172	-	0.0%
74	NO APLICA	EMPALME POR RECONSTRUCCION DE AGUA PASO DESNIVEL CER	16,288	RDR	NO ET	16,288	-	0.0%
75	NO APLICA	INGEN.	360	RDR	NO ET	360	-	0.0%
76	NO APLICA	INGEN.	3,969	RDR	NO ET	3,969	-	0.0%
77	INGEN.	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS SAN VICENTE (SISMO)	812,611	RDR	NO ET	812,611	-	0.0%
78	INGEN.	REHABILITACION DE REDES DE DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN SAN VICENTE (SISMO)	599,159	RDR	NO ET	599,159	-	0.0%
79	NO APLICA	RRPP - RENOVACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE - FRANCISCO BOLOGNESI - GRAU - 28 DE JULIO - LUNAHUANA	13,896	RDR	NO ET	13,896	-	0.0%
80	INGEN.	SISTEMA ELECTRIFICACION POZO N°03 SAN VICENTE	117,017	RDR	NO ET	117,017	-	0.0%
81	NO APLICA	SECTORIZACION BASICA DEL SECTOR SAN VICENTE	5,100	RDR	NO ET	5,100	-	0.0%
82	NO APLICA	RENOVACION RED COLECTORES AV. OSCAR RAMOS IMPERIAL	2,480	RDR	NO ET	2,480	-	0.0%
83	NO APLICA	AMPLIACION RED DESAGUE MARISCAL CACERES CERRO AZUL	4,857	RDR	NO ET	4,857	-	0.0%
84	NO APLICA	REHABILITACION BUZONES CONEXIONES AGUA POTABLE Y DESAGUE IMPERIAL	328	RDR	NO ET	328	-	0.0%
85	NO APLICA	INGEN.	2,430	RDR	NO ET	2,430	-	0.0%
86	NO APLICA	REHABILITACION LAGUNA OXIDACION ASIA	6,639	RDR	NO ET	6,639	-	0.0%
87	NO APLICA	INGEN.	4,885	RDR	NO ET	4,885	-	0.0%
88	NO APLICA	AMPLIACION DE RED AGUA Y CONEXIÓN STA CRUZ SAN LUIS	20,766	RDR	NO ET	20,766	-	0.0%
89	NO APLICA	INGEN.	1,558	RDR	NO ET	1,558	-	0.0%
90	NO APLICA	INGEN.	4,201	RDR	NO ET	4,201	-	0.0%
91	NO APLICA	INGEN.	1,266	RDR	NO ET	1,266	-	0.0%
92	NO APLICA	AMPLIACION Y RENOVACION RED ALCANTARILLADO LUNAHUANA	512	RDR	NO ET	512	-	0.0%

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
93	NO APLICA	RENOVACION DE RED DE DESAGUE CALLE COMERCIO SAN LUIS	10,794	RDR	NO ET	10,794	-	0.0%
94	NO APLICA	AMPLIACION RED AGUA POTABLE BOLOGNESI SANTA CRUZ FLORES	12	RDR	NO ET	12	-	0.0%
95	NO APLICA	CONVENIO 37-04-GG VIA JESUS SAN LUIS	5,960	RDR	NO ET	5,960	-	0.0%
96	NO APLICA	INGEN.	351	RDR	NO ET	351	-	0.0%
97	NO APLICA	INGEN.	1,472	RDR	NO ET	1,472	-	0.0%
98	NO APLICA	INGEN.	2,785	RDR	NO ET	2,785	-	0.0%
99	NO APLICA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO MECANICO POZO DE AGUA ASIA	11,483	RDR	NO ET	11,483	-	0.0%
100	NO APLICA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LAGUNA DE OXIDACION DE CERRO AZUL	12,882	RDR	NO ET	12,882	-	0.0%
101	NO APLICA	INGEN.	4,543	RDR	NO ET	4,543	-	0.0%
102	NO APLICA	CONV. 31-05-COMERCIO-SAN MARTIN- CERRO AZUL	17,876	RDR	NO ET	17,876	-	0.0%
103	NO APLICA	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO LOS OLIVOS GOBIERNO REGIONAL	46,395	RDR	NO ET	46,395	-	0.0%
104	NO APLICA	CONV-05-09 RED DE AGUA POTABLE URB. MELCHORITA MZ	11,959	RDR	NO ET	11,959	-	0.0%
105	NO APLICA	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS OLIVOS - MALA	40,933	RDR	NO ET	40,933	-	0.0%
106	NO APLICA	RENOVACION MARCO Y TAPA - SAN MARTIN , SALAVARRY - SAN LUIS	8,774	RDR	NO ET	8,774	-	0.0%
107	NO APLICA	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA AV. IQUITOS C-5 AC	5,816	RDR	NO ET	5,816	-	0.0%
108	NO APLICA	RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE SALVADOR SOLIS RI	8,864	RDR	NO ET	8,864	-	0.0%
109	NO APLICA	MEJORAMIENTO BAY PASS AGUA POTABLE AV. LIBERTADORES JR. GARRO	3,548	RDR	NO ET	3,548	-	0.0%
110	NO APLICA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN VICENTE	11,890	RDR	NO ET	11,890	-	0.0%
111	NO APLICA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SECTORIZACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - IMPERIAL	11,890	RDR	NO ET	11,890	-	0.0%
112	NO APLICA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - MALA	6,542	RDR	NO ET	6,542	-	0.0%
113	NO APLICA	INGEN.	2,000	RDR	NO ET	2,000	-	0.0%
114	305211	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA	69,907	RDR	NO ET	30,039	-	0.0%
115	313303	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ADUCCION EN LA CALLE MIRAMAR ASENTAMIENTO HUMANO DIGNIDAD NACIONAL DEL DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA	82,157	RDR	NO ET	109,450	-	0.0%
116	320339	MEJORAMIENTO DEL INTERCEPTOR DEL SECTOR DRENAJE DE LA AV. CIRCUNVALACION SUR DEL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE- LIMA	36,197	RDR	NO ET	14,654	-	0.0%
117	6867	"RENOVACIÓN DE 2808 MEDIDORES" PROGRAMA DE MEDIDA DE RÁPIDO IMPACTO (PMRI – MEDIDA 01) SAN VICENTE, IMPERIAL Y MALA PROVINCIA DE CAÑETE – DEPARTAMENTO DE LIMA	2,485,219	DT	NO ET	669,587	-	0.0%
118	6867	MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EMAPA CAÑETE S.A.	1,321,354	DT	NO ET	765,052	-	0.0%
119	6867	MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EMAPA CAÑETE S.A.	647,248	DT	NO ET	544,065	-	0.0%
120	6867	MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO EMAPA CAÑETE S.A.	2,337,824	DT	NO ET	709,503	-	0.0%
121	324081	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CALLE BOLIVAR DEL C.P CERRO AZUL, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA	30,489	RDR	NO ET	21,897	-	0.0%
122	NO APLICA	AMPLIACION DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL LOS JARDINES DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA	33,621	RDR	NO ET	7,479	-	0.0%
123	328444	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR PUENTE TABLA DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA	80,425	RDR	NO ET	32	-	0.0%
124	311218	INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA HABILITACION URBANA LAS FRESAS DE TERCER MUNDO DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA	397,288	RDR	NO ET	14,123	-	0.0%
125	2290817	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA VIVIENDA SANTA BARBARA, DISTRITO DE SAN LUIS - CAÑETE - LIMA	104,876	RDR	NO ET	102,826	-	0.0%
126	INGEN.	AMPLIACION DE A RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS ROSALES MARGARITAS Y JR. LOS PINOS AA.HH. PUENTE TABLA	17,932	RDR	NO ET	17,932	-	0.0%
127	INGEN.	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION OPERATIVA DEL PRESEDIMENTADOR -P-ALM	69,239	RDR	NO ET	69,239	-	0.0%
128	2450653	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) OPTIMIZACION CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN TERRENO DEL POZO N° 3 - SAN VICENTE, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	43,114	RDR	NO ET	43,114	-	0.0%
129	2450535	CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) OPTIMIZACION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE UN RESERVORIO APOYADO V250 M3 PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE FLORES, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	608,951	RDR	ET	548,475	-	0.0%
130	2203888	SUPERVISION DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. DON OSCAR, DISTRITO DE SAN LUIS - CAÑETE - LIMA	INGEN.	DT	NO ET	56,216	-	0.0%
131	2450478	RENOVACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) REHABILITACION IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL RESERVORIO APOYADO V750 M3 EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	338,387	RDR	ET	282,371	-	0.0%
132	2450544	RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) REHABILITACION REHABILITACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA LINEA DE IMPULSION DE 4 DE F" F" Y DE PVC EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE FLORES, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA, PMO AÑO 2.	402,857	RDR	ET	2,147	-	0.0%
133	2501579	ADQUISICION DE PTAP; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AMAUTA EN LA LOCALIDAD TUNEL GRANDE, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA"	INGEN.	DT	NO ET	34,375	-	0.0%

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
134	2501564	ADQUISICION DE PTAP; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	INGEN.	DT	NO ET	41,410	-	0.0%
135	INGEN.	MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LINEA ALCANTARILLADO EN ANTIGUA PANAMERICANA SUR - SECTOR VIALES - DISTRITO SAN VICENTE	26,503	RDR	NO ET	26,503	-	0.0%
136	2511763	RENOVACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) REHABILITACION Y RENOVACION DE LA RED DEL INTERCEPTOR DE LA PROLONGACION SANTAROSALIA DESDE AV. CIRCUNVALACION NORTE HASTA OVALO GRAU EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CAÑETE, DIST. SAN VICENTE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	452,372	RDR	ET	348,097	-	0.0%
137	2448061	RENOVACION DE LA LINEA DE IMPULSION DE LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE LA HUACA MALA, EPS EMAPA CAÑETE S.A.F-11-GO	742,032	DT	NO ET	397,141	-	0.0%
138	2244668	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.A.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS Y C.P. CASA BLANCA, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA	231,437	DT	NO ET	43,987	-	0.0%
139	INGEN.	INGEN.	INGEN.	RDR	NO ET	142,317	-	0.0%
140	NO APLICA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN URB. SINICATO DE CHOFERES MZ H - SAN VICENTE	INGEN.	RDR	NO ET	22,132	-	0.0%
141	INGEN.	INGEN.	INGEN.	RDR	NO ET	1,611	-	0.0%
142	2186824	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C. P. CARMEN ALTO, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA	INGEN.	DT	NO ET	294,302	-	0.0%
143	0	CONVENIO N°1158 FENOMENO DEL NIÑO AGUA POTABLE	79,590	RDR	NO ET	79,590	-	0.0%
144	0	CONVENIO N°1158 FENOMENO DEL NIÑO ALCANTARILLADO	71,235	RDR	NO ET	71,235	-	0.0%
145	2425413	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN 10KV, SUMINISTRO N°1093551, D.M. 65.00 KW, POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROPIEDAD DE EMAPA CAÑETE GALERIA FILTRANTE DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CIU N°2615888	423,599	RDR	NO ET	448,600	-	0.0%
146	2555117	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE UTILIZACION EN 22.9KV (OPERACION INICIAL 10KV) QUE ATIENDE AL SUMINISTRO N°1093718, POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO M.D. 32 KW POZO DE AGUA DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CIU N°2615840	127,400	RDR	NO ET	184,276	-	0.0%
147	2615900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL (LA) DE LA LINEA DE MEDIA TENSION Y AMPLIACION DE CARGA MEDIANTE UN SISTEMA DE UTILIZACION M.D. = 78.46 KW, SUMINISTRO N°4019969, POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUILMANA POZO DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA CIU N°2615900	236,476	RDR	NO ET	186,971	-	0.0%
148	2430011	ADQUISICION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.REHABILITACION OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO EN LA PTAP N°02 ALMINARES-IMPERIAL CAÑETE EN LA EPS EMAPA CAÑETE S.A EN LA LOCALIDAD IMPERIAL, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	INGEN.	DT	NO ET	330,377	-	0.0%
149	2562504	REMEDIACION DE PTAP; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO EN LA PTAP ANTIGUA ALMINARES - IMPERIAL - CAÑETE EN LA EPS EMAPA CAÑETE S.A DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	INGEN.	DT	NO ET	266,745	-	0.0%
150	2447996	ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA, ACOPLER DE TUBOS DE PLASTICO PVC, TAPA DE TUBO DE PLASTICO PVC Y ELEMENTO DE CONCRETO PREFABRICADO; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) OPTIMIZACION AMPLIACION DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES EN EL AMBITO DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A. EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	INGEN.	DT	NO ET	1,612,954	-	0.0%
151	2616490	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL (LA) ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROGENOS (GENERADOR DE 200KW), DISTRITOS DE QUILMANA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N°2616490	458,000	RDR	ET	403,390	-	0.0%
152	2616502	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL (LA) ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROGENOS, DISTRITOS DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N°2616502	420,000	RDR	ET	373,729	-	0.0%
153	2138958	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN EL A.H. CERRO CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL - CAÑETE - LIMA CON CUI N°2138958	229,960	DT	NO ET	255,511	-	0.0%
154	2692744	MEJORAMIENTO POZO SAN VICENTE	-	0	NO ET	-	-	0.0%
155	2711464	MEJORAMIENTO RESERVOIRIO SAN VICENTE	-	0	NO ET	-	-	0.0%
156	2704195	MEJORAMIENTO SIST EXIST AP ASIA	-	0	NO ET	-	-	0.0%
157	2692746	MEJORAMIENTO POZO CAPILLA ASIA	-	0	NO ET	-	-	0.0%
158	2628263	REHABILITACION RED AP CERCADO LUNAHUANÁ	-	0	NO ET	-	-	0.0%
159	2628263	MEJORAMIENTO POZO MALA	-	0	NO ET	-	-	0.0%
160	2692747	MEJORAMIENTO POZO1 QUILMANÁ	-	0	NO ET	-	-	0.0%

EMSAPUNO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2283110	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE LAS CIUDADES DE PUNO Y DESAGUADERO	12,981,744	DT	NO ET	7,836,393	2,033,279	25.9%
2	2279323	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION ROSARIO COÑIRI DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO 2/	4,950,146	DT	NO ET	52,138	52,137	100.0%
3	2660599	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y SISTEMA SCADA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	2,959,237	RDR	ET	2,507,986	1,278,321	51.0%

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
4	-	AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PUNO	-	RDR	ET	74,914	65,001	86.8%
5	-	ADQUISICIÓN DE NUEVOS MEDIDORES PARA LA CIUDAD DE PUNO (VEGETATIVO)	-	RDR	ET	103,658	88,615	85.5%
6	0	RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA EN LA CIUDAD DE PUNO	-	RDR	ET	765,000	714,915	93.5%
7	0	RENOVACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PUNO	-	RDR	ET	66,753	36,076	54.0%
8	-	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DE LA CIUDAD DE PUNO	-	RDR	ET	124,325	90,346	72.7%
9	0	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO TÉCNICO DE LA CIUDAD DE PUNO	-	RDR	ET	10,200	10,200	100.0%
10	-	IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE OPERACIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO *EMSA PUNO S.A. DE LA CIUDAD DE PUNO	-	RDR	ET	310,000	68,950	22.2%
11	-	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE PUNO EPS EMSA PUNO S.A.-PROVINCIA PUNO DEPARTAMENTO PUNO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
12	0	RENOVACIÓN DE MOTOCICLETAS (GERENCIA COMERCIAL)- EMSA PUNO S.A.	-	RDR	ET	46,518	36,203	77.8%
13	0	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO- EMSA PUNO S.A.	-	RDR	ET	101,695	-	0.0%
14	0	FORTALECIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EMSA PUNO S.A	-	RDR	ET	15,507	15,424	99.5%
15	0	MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN EN RED DE EMSA PUNO S.A.	-	RDR	ET	84,722	63,341	74.8%
16	-	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EMSA PUNO S.A.	-	RDR	ET	253,326	94,685	37.4%
17	-	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE EMSA PUNO S.A. SEDE DESAGUADERO	-	RDR	ET	7,000	5,754	82.2%
18	-	CONTROL DE PÉRDIDAS Y FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUNO	-	RDR	ET	107,268	63,586	59.3%
19	0	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO EMSA PUNO S.A., DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO	-	RDR	ET	269,242	-	0.0%
20	-	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO EMSA PUNO S.A., DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO	-	RDR	ET	593,220	-	0.0%
21	-	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EMSA PUNO S.A. EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	-	RDR	ET	75,594	-	0.0%
22	-	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES PARA LA CIUDAD DE PUNO	-	RDR	ET	89,366	59,901	67.0%
23	-	ADQUISICIÓN DE NUEVOS MEDIDORES PARA LA CIUDAD DE DESAGUADERO (VEGETATIVO)	-	RDR	ET	37,141	11,508	31.0%
24	-	ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES (1 MOTOCARGA + 1 MOTOCICLETA LINEAL) PARA LA CIUDAD DE DESAGUADERO	-	RDR	ET	14,052	16,560	117.8%
25	-	PUESTA EN OPERATIVIDAD DE LOS COMPONENTES DE CABECERA DE AGUA POTABLE ANTE EMERGENCIA POR PRESENCIA DE ARSÉNICO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, REGIÓN PUNO. 1/	-	RDR	ET	16,126	-	0.0%
26	-	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO 2025 4/	-	RDR	NO ET	84,975	72,917	85.8%
27	-	PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO PARA ELABORACIÓN DEL PAS	-	RDR	ET	11,820	11,820	100.0%
28	-	PERSONAL APOYO (ASISTENTE) PARA ELABORACIÓN DEL PAS	-	RDR	ET	7,200	7,800	108.3%
29	-	MATERIALES PARA ELABORACIÓN DEL PAS	-	RDR	ET	913	674	73.8%
30	-	MONITOREO DE LOS PARÁMETROS (12 MUESTRAS) - PUNO Y DESAGUADERO*	-	RDR	ET	93,051	14,674	15.8%
31	-	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PAS	-	RDR	ET	60,000	-	0.0%
32	-	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO EN EL RESERVOIRIO TOTORANI (INSUMOS Y SISTEMA DE DOSIFICACIÓN), DE ACUERDO CON EL CONTENIDO MICROBIOLÓGICO	-	RDR	ET	44,637	16,017	35.9%
33	-	REFORZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE TALUD DEL RESERVOIRIO R - 01 (MURO DE PROTECCIÓN) 3/	-	RDR	ET	163,376	128,949	78.9%
34	-	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	-	RDR	ET	72,000	4,000	5.6%
35	-	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA	-	RDR	ET	138,132	-	0.0%
36	-	FONDO DE CONTINGENCIA	-	RDR	ET	81,229	18,878	23.2%
37	0	IMPLEMENTACIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN E INFILTRACIÓN EN CUENCA TOTORANI.	-	RDR	ET	80,000	77,695	97.1%
38	-	FORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS PARA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL	-	RDR	ET	50,000	49,910	99.8%
39	-	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EPS EMSA PUNO S.A. Y DE LOS CONTRIBUYENTES	-	RDR	ET	17,525	16,517	94.2%
40	-	SISTEMA DE MONITOREO HIDROLÓGICO (LÍNEA DE BASE)	-	RDR	ET	20,451	20,535	100.4%

EPSSMU

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	SIN CODIGO SNIP	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE CLORACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.	67,485	RDR	ET	-	13,759	0.0%
2	SIN CODIGO SNIP	RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EPS EPSSMU S.A.	367,359	RDR	ET	-	8,000	0.0%
3	SIN CODIGO SNIP	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CASETA DE VÁLVULAS DE LOS RESERVOIRIOS N° 01, 02, 03 Y 04 E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES.	42,968	RDR	ET	-	14,648	0.0%
4	SIN CODIGO SNIP	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DATA LOGGER PARA MCROMEDIDOR DE CAUDAL DE INGRESO PARA LOS RESERVOIRIOS (01, 02, 03, 04 Y 05).	69,000	RDR	ET	-	42,639	0.0%
5	SIN CODIGO SNIP	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDIDOR DE CAUDAL PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ANTIGUA Y NUEVA EPS EPSSMU S.A.	78,300	RDR	ET	-	63,188	0.0%
6	SIN CODIGO SNIP	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LA PREVENCIÓN DE HURTOS EN LOS MEDIDORES.	75,700	RDR	ET	-	53,860	0.0%
7	SIN CODIGO SNIP	DISMINUCIÓN DE LAS CONEXIONES INACTIVAS Y USO CLANDESTINO DE LOS SERVICIOS.	26,000	RDR	ET	-	-	0.0%

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
8	SIN CODIGO SNIP	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE.	47,092	RDR	ET	-	-	0.0%
9	SIN CODIGO SNIP	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE PARA ALTOS CONSUMIDORES EN LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE.	16,770	RDR	ET	-	16,770	0.0%
10	Ficha	PROGRAMA DE COBRANZA MOROSA Y CORTE EFECTIVO.	43,000	RDR	ET	-	34,928	0.0%
11	Ficha	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE.	177,525	RDR	ET	-	171,165	0.0%
12	Ficha	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 32 DATALOGGERS.	227,740	RDR	ET	-	-	0.0%
13	Ficha	INSTALACIÓN Y MANEJO DEL VIVERO FORESTAL/AGROFORESTAL EN LA CUENCA DE APORTE GONCHA.	11,590	RDR	ET	-	1,650	0.0%
14	Ficha	REFORESTACIÓN CON UN SISTEMA SILVOPASTORIL EN LA CUENCA DE GONCHA.	-	RDR	ET	-	-	0.0%
15	Ficha	REFORESTACIÓN CON UN SISTEMA DE LINDEROS EN LA CUENCA GONCHA.	-	RDR	ET	-	-	0.0%
16	Ficha	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SEH DE LAS CUENCAS DE GONCHA Y TOMOCHO.	4,000	RDR	ET	-	4,000	0.0%
17	Ficha	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN EN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA GONCHA, ADQUISICIÓN DE 2 PLUVIÓMETROS, 2 SENSORES, 2 MULTIPARÁMETROS E INSTALACIÓN DE VERTEDEROS.	30,000	RDR	ET	-	-	0.0%
18	Ficha	PERSONAL MERESE, LOGÍSTICA Y OTROS GASTOS.	26,400	RDR	ET	-	16,059	0.0%
19	Ficha	ESTABILIZACIÓN DEL SUELO Y PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE VIENE DE LA CAPTACIÓN GONCHA.	-	RDR	ET	-	-	0.0%
20	Ficha	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA GONCHA, DONDE SE UBICA LA CAPTACIÓN GONCHA.	8,750	RDR	ET	-	8,749	0.0%
21	Ficha	ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y TRATAMIENTO DE LADERA EROSIONADA EN LA CAPTACIÓN CANGREJAL.	-	RDR	ET	-	-	0.0%
22	Ficha	MODIFICACIÓN DEL TRAZO, DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN CANGREJAL A ZONAS DE BAJO RIESGO (INCLUYE PASOS AÉREOS).	20,000	RDR	ET	-	1,200	0.0%
23	Ficha	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RESPALDO PARA CORTES DE SERVICIO (ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y ADQUIRIR MATERIALES PARA ATENCIÓN A EMERGENCIAS).	6,000	RDR	ET	-	4,450	0.0%
24	0	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VALVULA DEL RESERVOIRIO N° 02	1,200	RDR	NO ET	-	1,200	0.0%
25	Ficha	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LA FICHA.	585	RDR	NO ET	-	585	0.0%
26	Ficha	SERVICIO DE QUIEBRE Y CASTIGO DE DEUDA INCOBRABLE PARA SINCERAR LAS CUENTAS COMERCIALES INQUEBRABLES	5,000	RDR	NO ET	-	5,000	0.0%
27	Ficha	SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE 220 MEDIDORES DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS - SUPERVISION	47,096	RDR	NO ET	-	46,565	0.0%
28	Ficha	REPARACION Y PINTADO DE CAMION CISTERNA	32,000	RDR	NO ET	-	31,000	0.0%
29	0	ADQUISICION DE 40 MTRS DE MANGUERA PVC DE SUCCION DE 3" CORRUGADO NARANJA PARA MOTOBOMBA	2,400	RDR	NO ET	-	2,400	0.0%
30	Ficha	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTION Y MONITOREO DE DATALOGGERS.	87,000	RDR	NO ET	-	21,631	0.0%
31	0	REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA PTAP	6,051	RDR	NO ET	-	6,051	0.0%
32	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE CLORACION	4,602	RDR	NO ET	-	4,602	0.0%
33	0	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE SAN LUIS ALTO QUEBRADA RIEGUILLO	5,500	RDR	NO ET	-	5,500	0.0%

AGUAS TUMBES

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1.	2648842	ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN LA PTAP EL MILAGR, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	511,802	RDR	NO ET	129,046	117,064	90.7%

EMAPA PASCO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	-	INSTALACIÓN DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS EN LA LOCALIDAD DE PASCO PARA LA EPS EMAPA PASCO S.A. INSTALACIÓN DE 06 GRIFO CONTRA INCENDIO	20,024	RDR	ET	-	20,000	0.0%
2	-	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL RESERVOIRIO HUANCAPUCRO DE LA EPS EMAPA PASCO S.A. - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL IOARR OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL RESERVOIRIO HUANCAPUCRO DE EMAPA PASCO S.A.	20,520	RDR	ET	-	-	0.0%
3	-	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL RESERVOIRIO RECTANGULAR DE LA EPS EMAPA PASCO S.A. - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL IOARR OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL RESERVOIRIO RECTANGULAR DE EMAPA PASCO S.A.	20,521	RDR	ET	-	-	0.0%
4	-	RENOVACION DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL SECTOR SAN JUAN DEL DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	41,781	RDR	ET	-	-	0.0%
5	-	SERVICIO DE INSTALACION (ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL VOLUMEN DE AGUA Y PRESION EN LOS RESERVOIRIOS DE LA LOCALIDAD DE PASCO DE EMAPA PASCO S.A.	14,963	RDR	ET	-	-	0.0%
6	-	SERVICIO DE INSTALACION DE 02 CAUDALIMETROS ELECTROMAGNETICOS Y DATA LOGGER DE 02 CANALES PARA LOS RESERVOIRIOS DE LA LOCALIDAD DE VICCO DE LA EPS EMAPA PASCO S.A.	41,769	RDR	ET	-	-	0.0%

EMAPA PISCO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
------	----------	----------	-------	--------	---------------------------------	-----	-----	---

1	2471997	RECUPERACION DE LOS POZOS TUBULARES N° 01 Y N° 04, DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	1,417,908	RDR	NO ET	206,161	147,523	71.6%
2	2471997	RECUPERACION DE LOS POZOS TUBULARES N° 01 Y N° 04, DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	689,064	RDR	ET	689,064	651,136	94.5%
3	2471997	RECUPERACION DE LOS POZOS TUBULARES N° 01 Y N° 04, DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	78,650	RDR	ET	78,650	24,924	31.7%
4	2659102	EJECUCIÓN - ADQUISICION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN, PRESIÓN Y CONTINUIDAD EN PISCO, TUPAC AMARU Y SAN ANDRES	305,321	RDR	ET	305,321	258,555	84.7%
5	2659102	SUPERVISIÓN - ADQUISICION DE SISTEMA DE ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN, PRESIÓN Y CONTINUIDAD EN PISCO, TUPAC AMARU Y SAN ANDRES	18,271	RDR	ET	18,271	16,949	92.8%
6	2602610	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA.	39,450	RDR	NO ET	3,417	3,367	98.5%
7	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE PISCO	315,901	RDR	ET	315,901	95,475	30.2%
8	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE PISCO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
9	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE PISCO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
10	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE PISCO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
11	-	INSTALACION DE MEDIDORES EN CONEXIONES VEGETATIVAS EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE PISCO DE LA EPS EMAPISCO S.A.	87,254	RDR	ET	87,254	5,159	5.9%
12	-	RENOVACION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE PISCO	478,324	RDR	ET	478,324	156,515	32.7%
13	-	RENOVACION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE PISCO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
14	-	RENOVACION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE PISCO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
15	-	RENOVACION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE PISCO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
16	-	REPOSICION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	75,059	RDR	ET	75,059	26,124	34.8%
17	-	REPOSICION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	-	RDR	ET	-	-	0.0%
18	-	REPOSICION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	-	RDR	ET	-	-	0.0%
19	-	REPOSICION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	-	RDR	ET	-	-	0.0%
20	-	INSTALACION DE MEDIDORES EN CONEXIONES VEGETATIVAS EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DE LA EPS EMAPISCO S.A	20,684	RDR	ET	20,684	1,001	4.8%
21	-	INSTALACION DE MEDIDORES EN CONEXIONES VEGETATIVAS EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU INCA DE LA EPS EMAPISCO S.A	2,746	RDR	ET	2,746	2,464	89.7%
22	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	143,443	RDR	ET	143,443	42,075	29.3%
23	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	-	RDR	ET	-	-	0.0%
24	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	-	RDR	ET	-	-	0.0%
25	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	-	RDR	ET	-	-	0.0%
26	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU INCA	89,200	RDR	ET	89,200	26,430	29.6%
27	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU INCA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
28	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU INCA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
29	-	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AP EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU INCA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
30	-	REPOSICION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU INCA	42,404	RDR	ET	42,404	14,835	35.0%
31	-	REPOSICION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU INCA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
32	-	REPOSICION DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU INCA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
33	-	DISMINUCIÓN DE USUARIOS MOROSOS E INACTIVOS DE LA EPS EMAPISCO S.A	186,484	RDR	ET	186,484	129,836	69.6%

SEDACAJ

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2030722	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ	6,434,976	DT	NO ET	7,016,990	3,378,559	48.1%
2	2534143	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL (LA) EPS. SEDACAJ S.A. SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	3,457,731	RDR	ET	765,233	765,233	100.0%
3	2534225	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL (LA) EPS. SEDACAJ S.A. 2022-2024	3,099,631	RDR	ET	3,121,738	3,085,569	98.8%
4	2622751	ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL Y MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA EN LA EPS. SEDACAJ S.A. SEDE CONTUMAZA FICHA - 32	-	RDR	ET	9,677	9,677	100.0%
5	2565250	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DESARENADOR DE LA EPS. SEDACAJ S.A. DESDE EL RIO PORCON HASTA LA PTAR EL MILAGRO	2,131,912	RDR	ET	1,806,705	238,352	13.2%
6	2636497	CONSTRUCCION RESERVOIRIO DE LA EPS. SEDACAJ S.A.	2,869,664	RDR	ET	3,438,158	286,965	8.3%
7	2615309	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO EN EL (LA) EPS. SEDACAJ S.A. EN CAJAMARCA	2,670,986	RDR	ET	2,724,736	2,423,392	88.9%

TACNA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2370545	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE INGENIERIA DE LA EPS TACNA S.A. DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	-	RDR	ET	12,000	-	0.0%
2	2370545	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE INGENIERIA DE LA EPS TACNA S.A. DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15,286	RDR	ET	15,000	-	0.0%
3	2625550	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) CATASTRO COMERCIAL GEOREFENCIADO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	2,296,835	RDR	ET	2,250,965	1,376,796	61.2%
4	2625550	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) CATASTRO COMERCIAL GEOREFENCIADO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	114,842	RDR	ET	112,548	101,059	89.8%
5	2473288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	13,930,824	RDR	ET	2,218,893	1,411,533	63.6%
6	2473288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	587,906	RDR	ET	104,440	97,808	93.6%
7	2473288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EL DISTRITO DE LOCUMBA-PROVINCIA JORGE BASADRE Y EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	-	RDR	ET	39,702	17,797	44.8%
8	2336712	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	5,000	RDR	ET	5,000	5,000	100.0%
9	2336712	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - TACNA - TACNA	1,812,696	RDR	ET	2,051	1,738	84.7%
10	2370397	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GUIDO BACIGALUPO COSTA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	25,000	RDR	ET	5,000	5,000	100.0%
11	2370397	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GUIDO BACIGALUPO COSTA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	1,568,350	RDR	ET	1,606,556	1,179,241	73.4%
12	2370397	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GUIDO BACIGALUPO COSTA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	1,712,658	RDR	ET	1,841,547	1,511,699	82.1%
13	2370397	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GUIDO BACIGALUPO COSTA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	137,876	RDR	ET	137,875	130,072	94.3%
14	2370397	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GUIDO BACIGALUPO COSTA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	20,313	RDR	ET	20,313	-	0.0%
15	2410984	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA	1,232,548	RDR	ET	2,000	313	15.6%
16	2410984	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA	1,698,134	RDR	ET	41,762	26,391	63.2%
17	2410984	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA	82,944	RDR	ET	15,658	14,007	89.5%
18	2410984	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA	-	RDR	ET	14,079	-	0.0%
19	2252053	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA- REGION DE TACNA."	754,885	RDR	ET	13,419	13,344	99.4%
20	2252053	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA- REGION DE TACNA."	1,281,411	RDR	ET	-	-	0.0%
21	2252053	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA- REGION DE TACNA."	122,178	RDR	ET	14,663	14,546	99.2%
22	2252053	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA- REGION DE TACNA."	13,779	RDR	ET	13,779	-	0.0%
23	2506438	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	655,366	RDR	ET	6,092	5,158	84.7%
24	2506438	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	702,486	RDR	ET	11,108	10,809	97.3%
25	2506438	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN RAMON CASTILLA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	61,103	RDR	ET	6,110	5,910	96.7%
26	2611555	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. PAGO OLANIQUE Y URB. LEVANO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	20,649	RDR	ET	2,930	754	25.7%
27	2611555	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. PAGO OLANIQUE Y URB. LEVANO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	17,208	RDR	ET	17,207	14,576	84.7%
28	2612324	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LOS ANGELES Y LA URBANIZACION CAPANIQUE DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	395,271	RDR	ET	353,295	282,476	80.0%
29	2612324	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LOS ANGELES Y LA	593,055	RDR	ET	559,198	454,528	81.3%

		URBANIZACIÓN CAPANIQUE DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.						
30	2612324	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LOS ANGELES Y LA URBANIZACIÓN CAPANIQUE DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.	72,420	RDR	ET	43,672	41,668	95.4%
31	2612324	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LOS ANGELES Y LA URBANIZACIÓN CAPANIQUE DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.	25,560	RDR	ET	12,833	-	0.0%
32	2672577	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ASOC. VIV. VILLA EL SOL, ASOC. VIV. TARAPACA, ASOC. VIV LOS OLIVOS, URB. STA TERESITA Y J.V. JESUS MARIA DEL DISTRITO DE TACNA, POVINIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.	25,000	RDR	ET	25,000	21,186	84.7%
33	2672577	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ASOC. VIV. VILLA EL SOL, ASOC. VIV. TARAPACA, ASOC. VIV LOS OLIVOS, URB. STA TERESITA Y J.V. JESUS MARIA DEL DISTRITO DE TACNA, POVINIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.	1,559,564	RDR	ET	410,132	78,821	19.2%
34	2672577	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ASOC. VIV. VILLA EL SOL, ASOC. VIV. TARAPACA, ASOC. VIV LOS OLIVOS, URB. STA TERESITA Y J.V. JESUS MARIA DEL DISTRITO DE TACNA, POVINIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.	1,426,434	RDR	ET	350,308	27,665	7.9%
35	2672577	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ASOC. VIV. VILLA EL SOL, ASOC. VIV. TARAPACA, ASOC. VIV LOS OLIVOS, URB. STA TERESITA Y J.V. JESUS MARIA DEL DISTRITO DE TACNA, POVINIA TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.	121,034	RDR	ET	34,560	-	0.0%
36	2568627	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. GRAU TRAMO CALLE CHICLAYO - RESERVOIRIO R-5, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	427,578	DT	NO ET	452,440	-	0.0%
37	2568627	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. GRAU TRAMO CALLE CHICLAYO - RESERVOIRIO R-5, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	22,906	DT	NO ET	24,240	-	0.0%
38	2504260	RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR- AV. GRAU TRAMO PASAJE LIBERTAD-OVALO CALLAO DEL DISTRITO DE TACNA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA.	542,764	DT	NO ET	584,269	515,107	88.2%
39	2504260	RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR- AV. GRAU TRAMO PASAJE LIBERTAD-OVALO CALLAO DEL DISTRITO DE TACNA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA.	-	RDR	NO ET	186,902	130,273	69.7%
40	2504260	RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR- AV. GRAU TRAMO PASAJE LIBERTAD-OVALO CALLAO DEL DISTRITO DE TACNA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA.	36,334	DT	NO ET	38,560	37,368	96.9%
41	2504260	RECUPERACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR- AV. GRAU TRAMO PASAJE LIBERTAD-OVALO CALLAO DEL DISTRITO DE TACNA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA.	-	RDR	NO ET	17,266	14,852	86.0%
42	2633628	ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; CONSTRUCCION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	46,339	RDR	ET	40,700	20,695	50.8%
43	2633628	ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; CONSTRUCCION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	4,633,936	RDR	ET	327,790	143,132	43.7%
44	2633628	ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; CONSTRUCCION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES; EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	171,456	RDR	ET	19,293	-	0.0%
45	3-MIO	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES	70,000	RDR	ET	35,950	35,950	100.0%
46	4-MIO	ADQUISICION DE LOGGERS Y CONTROLADORES	81,633	RDR	ET	81,633	81,633	100.0%
47	6-MIO	RENOVACION DE 03 MAQUINARIAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS TACNA	303,946	RDR	ET	287,826	282,119	98.0%
48	7-MIO	RENOVACION DE 07 CAMIONETAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA EPS TACNA	237,289	RDR	ET	237,289	-	0.0%
49	9-MIO	RENOVACION DE EQUIPOS Y GENERADORES ELECTRICOS EN LA EPS TACNA	35,594	RDR	ET	35,594	35,593	100.0%
50	10-MIO	REPOTENCIACION, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE BANCO DE MEDIDORES PARA LA EPS TACNA	130,000	RDR	ET	130,000	-	0.0%
51	11-MIO	ADQUISICIÓN DE 20 CLORADORES PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE CLORACIÓN EN LA EPS TACNA	137,506	RDR	ET	137,506	122,797	89.3%
52	14-MIO	ADQUISICIÓN DE 04 DOSIFICADORES TIPO BOMBA PULSO PARA LIQUIDOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	15,250	RDR	ET	15,250	14,500	95.1%
53	15-MIO	ADQUISICIÓN DE 01 BOMBA CENTRIFUGA Y 01 MOTOBOMBA DE LIQUIDOS ACIDOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	45,750	RDR	ET	45,750	34,720	75.9%
54	20-MIO	ADQUISICIÓN DE 10 EQUIPOS ELECTRODOS DE EQUIPOS LABORATORIO DE CAMPO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	3,628	RDR	ET	3,628	3,627	100.0%
55	22-MIO	ADQUISICION DE 05 VALVULAS MARIPOSA CAMBIO EN RESERVORIOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	70,150	RDR	ET	70,150	36,059	51.4%
56	23-MIO	ADQUISICION DE 01 EQUIPO ABLANDADOR DE AGUA LABORATORIO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	22,875	RDR	ET	22,875	-	0.0%
57	24-MIO	ADQUISICION DE 01 EQUIPOS ANALIZADOR PORTATIL DE DBO, DQO, SST, COT, NO3, DET PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	19,520	RDR	ET	67,292	-	0.0%
58	25-MIO	ADQUISICION DE 01 EQUIPO DE CAMPO PARA MEDICION DE CLOROFILA Y FICOCIANINA PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS EN LA EPS TACNA	76,250	RDR	ET	95,000	-	0.0%
59	33-MIO	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y FLOTA VEHICULAR PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS TACNA	1,555,000	RDR	ET	1,555,000	-	0.0%
60	34-MIO	ADQUISICION DE EQUIPOS ALTERNOS Y DE RESERVA DE LOS POZOS Y ESTACIONES DE BOMBEO	165,000	RDR	ET	165,000	73,500	44.5%
61	GRD-2	ADQUISICION DE 03 BOMBAS DE SOLIDOS DE 4" PARA LA ATENCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS LOCALIDADES DE TACNA, PACHIA Y LOCUMBA	114,842	RDR	ET	40,000	9,280	23.2%
62	GRD-3	RENOVACION DE 15 RESERVORIOS PORTATILES PARA LA ATENCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE IMPLIQUEN DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LAS LOCALIDADES DE TACNA, PACHIA Y LOCUMBA	13,930,824	RDR	ET	60,000	36,230	60.4%
63	GRD-4	ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE AGUA TURBIA DE 10HP PARA LA CAPTACION DEL RIO CAPLINA HACIA PLANTA PACHIA POR EMERGENCIA	587,906	RDR	ET	52,642	33,729	64.1%
64	GRD-5	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO ESPECIAL PARA ATENCION INMEDIATA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS DE TODO TIPO	1,812,696	RDR	ET	135,113	-	0.0%
65	MRSE-3	LIMPIEZA DE CANALES DE ACCESO A BOFEDALES EN ANCOMARCA Y ALTO PERÚ	61,000	RDR	ET	61,000	72,373	118.6%

66	MRSE-5	RECUPERACION DE BOFEDALES EN PAUCARANI Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN LA CUENCA UCHUSUMA (PAUCARANI, TALABAYA Y ALTO PERÚ)	64,000	RDR	ET	64,000	72,373	113.1%
67	MRSE-8	SENSIBILIZACION A CONTRIBUYENTES Y ACTORES INVOLUCRADOS EN LOS MRSE PARA PROMOVER LOS ACUERDOS ENTRE CONTRIBUYENTE Y RETRIBUYENTE	6,000	RDR	ET	6,000	7,203	120.1%
68	MRSE-9	ESTABLECIMIENTO DE UN AREA Y/O RESPONSABLE PARA LOS MERSE EN LA EPS	56,100	RDR	ET	56,100	44,500	79.3%
69	MRSE11	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (JASS) EN CAPLINA	5,250	RDR	ET	5,250	6,000	114.3%
70	MRSE12	DISEÑO E IMPLEMETACION DE SISTEMA DE MONITOREO HIDROLOGICO	37,500	RDR	ET	37,500	18,000	48.0%

EMAPAVIGSA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2464133	MEJORAMIENTO DE LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO DE NASCA, DISTRITO DE NASCA, ICA	1,770,696.06	DT	NO ET	308,879	273,407	88.5%
2	12244	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PREPARACION E IMPLEMENTACION DEL PMRI II DE LA EPS EMAPAVIGS S.A.	4,420,486	DT	NO ET	4,794,924	-	0.0%
3	311160	INSTALACION DE POZO TUBULAR, RESERVOIRIO DE CABECERA Y LINEAS DE IMPULSION Y CONDUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS AA.HH. DE NUEVA VILLA - MARIA REICHE, VIRGEN DE CHAPI Y 28 DE JULIO - DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - ICA	1,061,011	DT	NO ET	185,779	-	0.0%
4	2633685	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA GALERIA FILTRANTE Y LINEA DE CONDUCCION EN EL SECTOR SANTA CATALINA HASTA EL SECTOR DE BISAMBRA, DISTRITO DE NASCA DE LA PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO ICA	466,102	RDR	ET	433,681	-	0.0%
5	2542835	CONSULTOR PARA LA CONSULTORIA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE - INVERSION SEGÚN LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO "PERFORACION DE UN POZO PARA LA CIUDAD DE NASCA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA"	1,478,960	RDR	ET	1,478,960	24,788	1.7%
6	2701934	MEJORAMIENTO DE LOS RESERVOIRIOS BISAMBRA R-450, VISTA ALEGRE R-280 Y PAREDONES R-1000	149,401	RDR	ET	149,401	5,400	3.6%
7	2697715	CRENOVACION DE LINEAS DE CONDUCCION E INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE AIRE PROVENIENTES DE LA GALERIA FILTRANTE EL TRIGAL Y LA CAMARA DE PASO PAJONAL	123,169	RDR	ET	123,169	35,418	28.8%

SEDACHIMBOTE

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	235685	INST. MICROMED-CHIM. NCHIM-II ETP. PMO	1,499,106	RDR	NO ET	1,499,106	-	0.0%
2	2515387	CREACION DEL POZO TUBULAR N° 23 EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,691,711	RDR	ET	1,691,711	279,962	16.5%
3	2554857	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAMPO ELECTROM	298,950	RDR	NO ET	298,950	-	0.0%
4	2515383	CRACION DEL POZO TUBULAR N 18A, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA Y DEPATAMENTO DE ANCASH	1,308,462	DT	ET	1,308,462	-	0.0%
5	2512514	RENOV. CÁMA VÁLVULAS TUB. ADUC.60	150,112	RDR	ET	150,112	-	0.0%
6	0	CONST. PISO P/ALMACEN EN LOCAL PTAR	9,373	RDR	NO ET	-	-9,373	0.0%
7	2183070	INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE, CASMA Y HUARMY DE LA EPS SEDACHIMBOTE SA- ANCASH - IV ETAPA	1,800,958	RDR	ET	1,800,958	-	0.0%
8	2543683	AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PROLONGACION AV. PACIFICO MZ. "C" Y "D" DEL A.H. LOS CEDROS, EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH	85,700	RDR	ET	85,700	-	0.0%
9	2599561	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) INSTALACION DE CLORADORES DE INYECCIÓN AL VACÍO DE 50LB PARA LOS POZOS 5, 11, 15, 20 Y 21 DE EPS SEDACHIMBOTE S.A., DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	21,100	RDR	ET	21,100	-	0.0%
10	2599587	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) INSTALACION DE CLORADORES DE INYECCIÓN AL VACÍO DE 50LB PARA LOS POZOS 3, 5, 6 Y 7 DE EPS SEDACHIMBOTE S.A., DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	10,550	RDR	ET	10,550	-	0.0%
11	2512386	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA; EN EL(LA) Y COLUMNA DE BOMBA DEL POZO TUBULAR N°5 DE SEDACHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	114,407	RDR	ET	114,407	-	0.0%
12	2598682	ADQ. MEDIDOR SURTIDOR POZO 3	26,600	RDR	ET	26,600	-	0.0%
13	2567989	ADQ. BOMBA DE AGUA POZO TUBULAR N° 13	165,254	RDR	ET	165,254	-	0.0%
14	2598587	ADQUISICIÓN DE VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH.	849,936	RDR	ET	849,936	-	0.0%
15	2599585	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES PARA LA INSTALACION EN LA LOCALIDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.	198,104	RDR	ET	198,104	-	0.0%
16	2598498	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) PARA LA INSTALACION EN LA LOCALIDAD DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	3,328,712	RDR	ET	3,328,712	-	0.0%
17	2515380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DEL POZO TUBULAR N° 4, AL RESERVOIRIO R-IV, EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA Y DEPATAMENTO DE ANCASH	5,702,779	RDR	ET	5,916,633	150,098	2.5%
18	2515380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DEL POZO TUBULAR N° 4, AL RESERVOIRIO R-IV, EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA Y DEPATAMENTO DE ANCASH	6,506,891	RDR	ET	6,506,891	657,993	10.1%
19	2598698	*ADQUISICION DEL EQUIPO HIDRAULICO EN LOS MICROSECTORES 10.2A, 10.2C, 10.2D, 10.2E, 6.5 Y 6.2, CON LA INSTALACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION, CONTROL Y OPERACIONALES EN EL DISTRITO DE NVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DPTO ANCASH	357,311	RDR	ET	357,311	1,512,180	-423.2%

20	2599582	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES PARA LA INSTALACION EN LA LOCALIDAD DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH - I ETAPA	107,627	RDR	ET	107,627	-	0.0%
21	0	SERVICIO DE INSTALACION DE MEDIDORES POR REPOSICION, RENOVACION Y AMPLIACION DEL PARQUE DE MEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE CASMA Y HUARMEY.	572,034	DT	ET	572,034	-	0.0%
22	2598626	RENOV. LINEA IMPULSION EN EL POZO N° 21, CON LA INTERCONEXION HACIA LA TUBERIA DEL RESERVOIRIO III-C CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	72,500	RDR	ET	72,500	-72,500	-100.0%
23	2512523	REPARACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL EN LA RED PRIMARIA DE ALIMENTACION ELECTRICIA EN MEDIA TENSION DESDE EL POZO N° 15 AL POZO N° 22, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH.	1,097,204	RDR	ET	1,097,204	-	0.0%
24	2598608	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO; EN EL (LA) LOS POZOS TUBULARES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	105,076	RDR	ET	105,076	-105,076	-100.0%
25	2554857	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO; EN EL (LA) LOS POZOS TUBULARES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	293,211	RDR	ET	293,211	-	0.0%
26	2599570	ADQUISICION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN EL (LA) UTILIZACION EN 10 KV PARA POZO SUBTERRANEO N°3 DEL AA.HH. VICTOR RAUL, DE LA CALLE 07 Y CALLE SAN RAFAEL - DISTRITO DE CASMA - CASMA - ANCASH	446,709	RDR	ET	446,709	26,009	5.8%
27	2599576	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION: EN EL (LA) SERVICIO DE CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO Y CATASTRO TECNICO EN LA LOCALIDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	687,373	RDR	ET	687,373	111,000	16.1%
28	2599650	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION: EN EL (LA) SERVICIO DE CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO Y CATASTRO TECNICO EN LA LOCALIDAD DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	680	RDR	ET	680	142,682	20996.3%
29	2599568	ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL(LA) MEDICIÓN DE PRESIÓN Y CAUDAL EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	1,902,090	RDR	ET	1,902,090	1,869,072	98.3%
30	2598498	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) PARA LA INSTALACION EN LA LOCALIDAD DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTOM ANCASH. II ETAPA.	3,578,718	RDR	ET	3,578,718	2,473,234	69.1%
31	2599585	ADQ DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) PARA LA INSTALACION EN LA LOCALIDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA	16,136	RDR	ET	163,136	163,136	100.0%
32	2599582	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) PARA LA INSTALACION EN LA LOCALIDAD DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH- II ETAPA	116,525	RDR	ET	116,525	114,337	98.1%
33	267740	CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL EN EL LA EN EL RESERVOIRIO II - A DE EPS SEDACHIMBOTE S.A., DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	168,837	RDR	ET	168,837	34,576	20.5%
34	2647650	RENOVACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO, EN EL (LA) EN REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOYTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	520,793	RDR	ET	520,793	520,793	100.0%
35	2647791	RENOVACION DE RED DISTRIBUCION, EN EL (LA) CLAUSURA DE REDES ANTIGUAS DE ASBESTO CEMENTO EN EL SECTOR N° 1 PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	1,087,991	RDR	ET	1,087,991	922,667	84.8%
36	2647640	RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL (LA) DEL POZO N° 20 Y POZO N° 21 EN EL RESERVOIRIO III DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH.	149,304	RDR	ET	149,304	151,935	101.8%
37	2648019	ADQUISICION DE EQUIPO HIDRAULICO; EN EL (LA) SECTORIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	522,881	RDR	ET	522,881	302,800	57.9%
38	0	ADQ. EQUIPO AUTOMATIZACIÓN-CASMA	341,921	RDR	ET	341,921	341,921	100.0%

SEDA AYACUCHO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2391207	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO (I ETAPA)	4,147,441	DT	ET	2,012,232	-	0.0%
2	2523981	RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	828,849	RDR	ET	54,468	-	0.0%
3	2529163	RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUZCO, AV. ARENALES Y JR. UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	1,161,549	RDR	ET	909,233	13,213	1.5%
4	2538138	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SEDA AYACUCHO AV. RAMON CASTILLA DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	136,687	RDR	ET	12,735	-	0.0%
5	2415276	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SEDA-AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO (IV ETAPA)	250,501	RDR	ET	237,260	91,700	38.6%
6	2557044	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) REPOSICION DE ELECTROBOMBAS DE LA ESTACION DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	375,240	RDR	ET	335,000	-	0.0%
7	2542007	RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION PRESIDENTADOR EN LA LOCALIDAD HUANCAYOCC, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	1,450,001	RDR	ET	750,364	-	0.0%
8	2549795	RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MATARA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	371,252	RDR	ET	229,383	-	0.0%
9	2545938	RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDA AYACUCHO (TRAMO AV. LOS INCAS A AV. RAMON CASTILLA) AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	605,075	RDR	ET	537,461	-	0.0%
10	2547433	RENOVACION DE TUBERIA; EN EL(LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JIRON HUANCASOLAR Y PASAJES N° 1 Y N° 2 DEL CALLE NAZARENO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	161,647	RDR	ET	144,665	-	0.0%
11	2561261	RENOVACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION RESERVOIRIO QUICAPATA A RESERVOIRIO LIBERTADORES II DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	158,232	RDR	ET	137,913	-	0.0%

12	2561284	RENOVACION DE VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUICAPATA DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	223,328	RDR	ET	189,261	-	0.0%
13	2561842	ADQUISICION DE VEHICULO, MINICARGADOR Y CAMIONETA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	3,105,690	RDR	ET	2,631,942	2,907,000	110.5%
14	2561998	RENOVACION DE PASE AEREO; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION RESERVIORIO QUICAPATA A LIBERTADORES I, LINEA DE IMPULSION RESEVORIO RIO SECO Y EMISOR TOTORAS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	73,633	RDR	ET	62,576	-	0.0%
15	2562180	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTORAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EMBALSES QUICAPATA DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	1,279,659	RDR	ET	266,952	6,533	2.4%
16	2562216	RENOVACION DE SISTEMA DE DESCARGA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DESARENADOR CAMPANAYOCC DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	240,790	RDR	ET	212,481	-	0.0%
17	2563285	CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	279,182	RDR	ET	240,470	2,200	0.9%
18	2563861	CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	218,638	RDR	ET	186,686	-	0.0%
19	--	INCREMENTO DE MEDIDORES HUAMANGA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
20	--	ACTIVIDAD	40,000	RDR	ET	43,814	-	0.0%
21	--	ACTIVIDAD	138,669	RDR	ET	220,265	-	0.0%
22	--	ACTIVIDAD	169,492	RDR	ET	169,492	-	0.0%
23	--	ACTIVIDAD	234,290	RDR	ET	111,409	-	0.0%
24	--	ACTIVIDAD	-	RDR	ET	-	-	0.0%
25	--	ACTIVIDAD	-	RDR	ET	-	-	0.0%
26	--	ACTIVIDAD	55,084	RDR	ET	33,807	-	0.0%
27	--	ACTIVIDAD	32,204	RDR	ET	9,323	-	0.0%
28	--	ACTIVIDAD	188,025	RDR	ET	185,075	30,916	16.7%
29	--	ACTIVIDAD	235,874	RDR	ET	234,374	100,600	42.9%
30	0	ACTIVIDAD	136,879	RDR	ET	136,879	-	0.0%
31	0	ACTIVIDAD	68,761	RDR	ET	68,761	-	0.0%
32	0	ACTIVIDAD	127,926	RDR	ET	127,926	99,617	77.9%
33	--	ACTIVIDAD	23,000	RDR	ET	271,365	83,654	30.8%
34	0	ACTIVIDAD	888,401	RDR	ET	888,401	635,155	71.5%
35	0	ACTIVIDAD	293,731	RDR	ET	293,731	345,331	117.6%
36	0	ACTIVIDAD	112,460	RDR	ET	112,460	54,530	48.5%
37	--	ACTIVIDAD	154,848	RDR	ET	187,915	-	0.0%
38	--	ACTIVIDAD	-	RDR	ET	-	-	0.0%
39	--	ACTIVIDAD	-	RDR	ET	-	-	0.0%
40	--	ACTIVIDAD	-	RDR	ET	-	-	0.0%
41	--	ACTIVIDAD	-	RDR	ET	-	-	0.0%
42	--	ACTIVIDAD	-	RDR	ET	-	-	0.0%
43	2643393	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUACHO (2024) DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DPTO. DE AYACUCHO CUI N° 2643393	-	RDR	ET	-	1,386,957	0.0%
44	2645844	"ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SEDA AYACUCHO (AÑO 2024), DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTEMENTO AYACUCHO"	-	RDR	ET	-	174,367	0.0%
45	0	ACTIVIDAD	-	RDR	ET	-	154,739	0.0%
46	0	ACTIVIDAD	-	RDR	ET	-	72,879	0.0%
47	0	ACTIVIDAD	-	RDR	ET	-	6,000	0.0%
48	2300996	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO (SUPERVISIÓN)	1,394,087	DT	ET	231,970	-	0.0%
49	2301970	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED DE AGUA Y DESAGUE EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DE LA QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO ENTRE EL PUENTE APURIMAC Y EL JR. LOS ROSALES 1+410M, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO (SUPERVISIÓN)	423,098	DT	ET	55,063	-	0.0%
50	2055858	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	69,195,760	DT	ET	692,932	-	0.0%

EMAPA SAN MARTIN

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2513030	CUI 2513030 ADQ.DE MEDIDOR DE CTE.DE AGUA EN SIST.DE PRODUCC.DE A.P. DE LA OFIC.ZONAL SAPOSOA	885,701	RDR	ET	885,701	-	0.0%
2	2483010	CUI 2483010 MEJ. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 13 AA.VV. DEL DIST. DE LA BDA. DE SHILCAYO	2,642,535	DT	NO ET	2,642,535	992,350	37.6%
3	2560606	CUI 2560606 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO-TARAPOTO	2,722,625	RDR	NO ET	2,634,590	- 2,162,813	-82.1%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES N°8

4	2597068	CUI 2597068 REPARACION DE LINEA DE ADUCCION EN SISTEMA DE DISTRIB. DE A.P. DEL RESERVOIRIO R1-ZONAL SAPOSOA	1,426,403	RDR	ET	1,231,649	-86,282	-7.0%
5	2598304	CUI 2598304 REPARACION DE INFRAEST. DE ALMACENAMIENTO EN RESERVOIRIO DE 250M3 PORTATIL-PICOTA	284,954	DT	NO ET	284,955	-211,383	-74.2%
6	60078	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA – PUCACACA – CHINCHA ALTA – SHIMBILLO NVO. CODO PICOTA – SANTA ROSILLO – SAN ANTONIO – NUEVA UNIÓN – WINGE – CASPISAPA PTO. RICO Y SAN HILARIÓN, PROVINCIA DE PICOTA SAN MARTÍN".	1,930,532	DT	NO ET	156,687	-	0.0%
7	348158	INST. DE REDES DE ALCANT. SANITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN, SAN JOSE DE SISA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
8	2497930	REMODELACION DE PTAP: EN EL(LA) FUENTE AHUASHIYACU DE LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTÍN S.A DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	1,921,398	RDR	ET	2,534,433	240,398	9.5%
9	2497916	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTIN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	707,483	DT	ET	-	-712,441	0.0%
10	349219	MEJ. DE LOS SERVICIOS DE A.P. Y ALCANT. JR. MARTINEZ DE COMPAGNIA C-07 AL 15 TARAPOTO	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
11	2432785	CUI 2432785 REPARAC. DE FLOCULAD. Y DECANT. DE LA PTA. DE AP DE LA FUENTE AHUASHIYACU	-	RDR	NO ET	-	0	0.0%
12	372924	MEJ. DEL SIST. DE AGUA POT. E INST. DEL SIST. ALC. SANIT. EN EL CASERIO TANGARA, PROV. DE EL DORADO - SAN MARTIN	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
13	2031691	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE LAMAS	1,420,722	DT	NO ET	35,085,352	879,488	2.5%
14	2322829	MEJ. DE LAS REDES Y CONEX. DOMIC. DE A.P. Y ALC. DE LOS JRS. LOS ANDES C.01 A C.09 MALECON CUMBAZA MANCO CAPAC C.01 A C.06 Y OCSAR R. BENAVIDES C.01 A C.05 MORALES	270,286	DT	NO ET	354,375	152,675	43.1%
15	2349174	MEJ.Y AMPL.DEL SERV. DE A.P. Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE SAN JOSE DE SISA	152,012	DT	NO ET	199,305	83,956	42.1%
16	2324763	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE A.P. Y DE ALC.SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y HOYADA	750,000	DT	NO ET	704,232	124,000	17.6%
17	2047402	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE – SAN MARTIN"	5,771,187	DT	NO ET	4,028,494	-	0.0%
18	2469970	BIEN: "ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: EN LA UNIDAD OPERATIVA DE SAN JOSÉ DE SISA DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"	2,029,666	DT	NO ET	355,021	-1,864,624	-525.2%
19	2618375	REUBICACION DEL SIST. DE ABASTECIMIENTO DE A.P. Y RED DE ALCANT. EN AEROPUERTO CADETE FAP GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES	4,049,148	DT	NO ET	4,049,148	-	0.0%
20	2654006	ADQ. DE EQUIPO DE CONT. Y AUTOMAT. REP. DE RESERVOIRIO EN EL (LA) EN EL RESERVORIO EXISTENTES DE EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO	4,087,845	DT	ET	-	283,349	0.0%
21	2654045	ADQ. DE MICRO MEDIDORES, RENOVACIÓN DE CONEX. DOMIC. DE A.P. EN EMAPA SAN MARTÍN S.A. DISTRITO DE TARAPOTO	823,854	DT	ET	-	192,460	0.0%
22	2597065	REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL LAMAS	2,700,000	RDR	ET	-	537,700	0.0%
23	2673285	MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJ. Y AMPL.DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL JR. AMERICA C-1 A C-3 PJE. SAN MATEO PJE 2 DE JULIO PJE 16 DE AGO. PJE. ALELUYA TARAPOTO	1,444,321	DT	ET	-	68,300	0.0%

EMAPAT

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2673994	CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EN EL JR SANTOS KAWAY KOMORY, JR. AUCAYACU, JR. ANTONIO IKEDA YOSHIKAWA, PSJE AKIHITO Y AV. LOS HEROES DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	509,891	RDR	NO ET	509,891	354,548	69.5%
2	2673976	CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) EN LA AVE. LEON VELARDE, ENTRE JR. JAVIER HERAUD HASTA JR. ATAHUALPA EN EL CENTRO POBLADO TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	202,232	RDR	ET	202,232	237,246	117.3%
3	2637042	RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EN EL JR. ICA DESDE LA AV ERNESTO RIVERO HASTA JR 28 DE JULIO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO. DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	476,476	RDR	ET	153,346	72,588	47.3%
4	2472850	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) PTAP BILLINGHURTS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	2,965,092	DT	NO ET	2,534,430	1,343,765	53.0%
5	2472850	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) PTAP BILLINGHURTS Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	-	RDR	NO ET	97,952	-	0.0%
6	2521616	CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) PTAP LA PASTORA EN LA LOCALIDAD LA PASTORA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	1,292,231	RDR	NO ET	23,295	18,600	79.8%
7	2533820	CONSTRUCCION DE TALUD; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) CAPTACION LA PASTORA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	2,982,404	RDR	ET	2,818,191	113,685	4.0%
8	2599150	CONSTRUCCION DE SENDERO, CENTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y OFICINA ADMINISTRATIVA; REFORESTACION DE AREA ECOLOGICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BOSQUE LOCAL SEÑOR DE LA CUMBRE BOSQUE LOCAL SR DE LA CUMBRE DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	925,385	RDR	NO ET	112,500	103,000	91.6%

SEMAPACH

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	S/C/S	PROGRAMA MEDIDAS RAPIDO IMPACTO II	-	DT	NO ET	10,948,431	7,420,376	67.8%
2	S/C/S	ADQUISICION DE VÁLVULAS PURGADORAS DE SEDIMENTOS (BARRO O LODO); EN EL(LA) RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL DISTRITO DE GROCIO PRADO, DISTRITO DE PUEBLO NUEV	-	RDR	NO ET	7,081	3,455	48.8%
3	S/C/S	RENOVACIÓN DE DESAGÜE EN EL(LA) PJE. LAS BEGONIAS, PJE. RIVAS Y AA.HH. SANTA ROSA DE LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD CHINCHA ALTA, DISTRITO DE CHIN	-	RDR	NO ET	46,139	39,101	84.7%
4	2553715	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON SECTORIZACION EN EL DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA.	-	RDR	NO ET	8,188,330	4,050,362	49.5%
5	2623192	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR CON EQUIPAMIENTO DISTRITO DE ALTO LARAN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA	-	DT	NO ET	3,264,359	2,327,340	71.3%

6	2573283	CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PROLONGACION DEL PASAJE SANTA ROSA, BARRIO PROGRESO DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVIN	-	RDR	ET	15,380	12,597	81.9%
7	2662842	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CISTERNA DE BOMBEO DEL POZO N° 12 (SURTIDOR) DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA C	-	RDR	ET	99,612	147,548	148.1%
8	2633898	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS SEMAPACH S.A. INCLUIDA LA INSTALACION EN EL SECTOR COMERCIAL 01 DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA	-	RDR	NO ET	226,743	150,036	66.2%
9	2633899	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS SEMAPACH S.A. INCLUIDA LA INSTALACION EN EL SECTOR COMERCIAL 01 DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA CHINC	-	RDR	NO ET	93,453	74,615	79.8%
10	2634579	ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION HIDROLOGICA; EN EL(LA) EPS SEMAPACH S.A. (EQUIPO DATALOGGER) INCLUIDA LA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE CAJA PARA EL	-	RDR	NO ET	1,135,086	928,622	81.8%
11	2634911	CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) SUB SISTEMA DE CHINCHA BAJA INCLUIDO VÁLVULAS DE AIRE Y PURGA PARA EL AÑO 1 DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PR	-	RDR	NO ET	84,625	71,716	84.7%
12	2634959	ADQUISICION DE GRIFO CONTRA INCENDIO; CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) SUB SISTEMA DE CHINCHA ALTA INCLUIDO LA INSTALACION DE VÁLVULAS DE	-	RDR	NO ET	405,714	315,245	77.7%
13	2635328	RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS SEMAPACH S.A. INCLUIDA LA INSTALACION PARA EL AÑO 1 DEL ESTUDIO TARIFARIO GESTION COMERCIAL DISTRITO DE PU	-	RDR	NO ET	1,037,364	881,224	84.9%
14	2634618	ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION HIDROLOGICA; EN EL(LA) EPS SEMAPACH S.A. (EQUIPO DATALOGGER) INCLUIDA LA INSTALACION Y CONSTRUCCION	-	RDR	NO ET	191,487	22,844	11.9%
15	2634928	CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) SUB SISTEMA DE CHINCHA BAJA INCLUIDO VÁLVULAS DE AIRE Y PURGA PARA EL AÑO 2 DISTRITO DE TAMBO DE MORA, P	-	RDR	ET	237,443	9,929	4.2%
16	2662351	RENOVACION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) DISTRITO DE CHINCHA ALTA, SUNAMPE, GROCIO PRADO, CHINCHA BAJA, TAMBO DE MORA, ALTO LARAN DISTRITO DE PUEBLO N	-	RDR	ET	1,015,570	771,839	76.0%
17	2701884	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) RESERVORIO R-3 (SURTIDOR DE AGUA POTABLE) DISTRITO DE PUEBLO NU	-	RDR	ET	217,625	87,151	40.0%
18	2701893	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) UBICACION DE LOS RESERVORIOS R-1 Y R-2 (SURTIDOR DE AGUA POTABL	-	RDR	NO ET	287,642	59,029	20.5%
19	0		-	RDR	NO ET	-	600	0.0%
20	2662525	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AÑO 2 DEL ESTUDIO TARIFARIO (REPOSICIÓN) GESTIÓN COMERCIAL INCLUIDA LA INSTALACION DISTRITO DE PUEBLO NUEVO,	-	RDR	ET	1,708,569	1,834,270	107.4%
21	2680465	CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; ADQUISICION DE GRIFO CONTRA INCENDIO; EN EL(LA) SUB SISTEMA DE CHINCHA ALTA INCLUIDO LA INSTALACION DE VÁLVULAS DE	-	RDR	NO ET	413,794	385,955	93.3%
22	2599102	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) EPS SEMAPACH S.A. PARA MEJORAR LA GESTION COMERCIAL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO Y DISTRITO DE	-	RDR	NO ET	53,912	45,509	84.4%

SELVA CENTRAL

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	0	CALLE LAS CUCARDAS - VILLA RICA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
2	0	CAPTACIONES DE AGUA-CHACAHUASAY Y QUISPE	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
3	0	CALLE BOETTGER OXAPAMPA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
4	0	REHABILIT.LINEA COND.QUEBRADA ULLARIQUI	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
5	0	REHABIL.CAPTACION Y L.C.OYON-V.R.	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
6	0	CONST.CANAL COND.A/SERV.P.Y MED.AMB.AA.H	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
7	0	MEJORAMIENTO LINEA COND.CRP-13,14-LA MER	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
8	0	CON.RED.COLEC.Y ABAST.A/P Y CON.DOM.-PKI	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
9	0	SISTEMA AGUA POT.SEC.FLAVIO N,INM,MILG.-	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
10	129801	MEJORAMIENTO DEL FLOCULADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VILLA RICA	12,164	RDR	NO ET	-	-	0.0%
11	182040	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS DECANTADORES, FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA MERCED - CHANCHAMAYO	145,490	RDR	NO ET	-	-	0.0%
12	32790	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOMBEO VILLA LUZ SATIPO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
13	213372	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SANGANI - PICHANAQUI PROGRESIVA 6-300 - CHANCHAMAYO - JUNIN	25,499	RDR	NO ET	-	-	0.0%
14	251323	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE AMBIENTES DEL BANCO DE MEDIDORES - ALMACEN DE LA PLANTA DE BOMBEO LA MERCED - CHANCHAMAYO	98,276	RDR	NO ET	-	-	0.0%
15	312044	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA AA. VV. VIRGEN DEL CARMEN, AA.VV.. JOSE ABELARDO QUINONEZ DISTRITO DE SAN RAMON - CHANCHAMAYO - JUNIN	142,439	RDR	NO ET	-	-	0.0%
16	323387	MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y CRP EN EL SECTOR JUAN VELASCO ALVARADO PICHANAQUI - CHANCHAMAJO - JUNIN	33,880	RDR	NO ET	-	-	0.0%
17	365666	CREACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION ÑAPANGO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN	975,629	RDR	NO ET	-	-	0.0%
18	2524850	CREACION DEL SISTEMA DE UTILIZACION SED 15KVA SISTEMA MONOFASICO 13.2 KV - PLANTA DE TRATAMIENTO EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL - FUNDO VICTORIA, DISTRITO DE CHANCHAMAYO , PROVINCIA CHANCHAMAYO , DEPARTAMENTO JUNIN	91,658	RDR	NO ET	-	-	0.0%
19	0	MEJ.LINEA ADUCCION CAPELO ALTO - L.M	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
20	2598282	REMEDIACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS SELVA CENTRAL S.A. DISTRITO DE SAN RAMON, PICHANAQUI Y EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	781,994	RDR	ET	-	-	0.0%
21	2600665	REMEDIACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS SELVA CENTRAL S.A. DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	299,773	RDR	ET	-	-435	0.0%
22	2600782	REMEDIACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS SELVA CENTRAL S.A. DISTRITO DE VILLA RICA Y EL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	258,964	RDR	ET	-	-	0.0%
23	2598282	REMEDIACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS SELVA CENTRAL S.A. DISTRITO DE SAN RAMON, PICHANAQUI Y EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	484,616	RDR	ET	-	-	0.0%
24	0	ADQUISICION EQ.DE CONTROL Y AUTOMATIZACION	-	RDR	NO ET	-	122,000	0.0%
25	2606932	ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION EN LA EPS SELVA CENTRAL S.A. DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN	40,771	RDR	ET	-	-	0.0%
26	2648229	REMEDIACION DE MICROMEDIDORES EN EL EPS SELVA CENTRAL S.A. DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN	151,250	RDR	ET	-	52,499	0.0%
27	2654221	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA EPS SELVA CENTRAL S.A. INCLUYE SU INSTALACION EN LOS DISTRITOS DE OXAPAMPA Y EL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO PASCO	320,512	RDR	ET	-	-	0.0%

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
28	2640700	REMEDIACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS SELVA CENTRAL S.A. EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO, PICHANAQUI Y EL DISTRITO DE SAN RAMON PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	803,885	DT	ET	-	399,930	0.0%
29	0	ADQ.MICROMEDIDORES PMO 2025- SATIPO	-	DT	NO ET	-	4,500	0.0%
30	0	ADQ.MICROMEDIDORES PMO 2025-OXA-VR	-	DT	NO ET	-	6,200	0.0%
31	0	ADQ.MICROMEDIDORES PMO 2025-CHYO.	-	DT	NO ET	-	8,500	0.0%
32	6735	INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS SELVA CENTRAL SA , LOTE 1: INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN USUARIOS ASIGNADOS - LA MERCED - SATIPO Y PICHANAQUI, LOTE 2 : REEMPLAZO DE MICROMEDIDORES - PICHANAQUI, LOTE 3: INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN CONEXIONES NUEVAS - PICHANAQUI, DEL PROGRAMA DE MEDIADAS DE RAPIDO IMPACTO	595,927	DT	NO ET	-	-	0.0%
33	6735	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LA MERCED - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN.	299,103	DT	NO ET	-	-	0.0%
34	6735	AMPLIACION DE REDES EN LA LOCALIDAD DE SANGANI PICHANAQUI	909,752	DT	NO ET	-	-	0.0%
35	6735	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION CRP13 CRP 14 LA MERCED	245,135	DT	NO ET	-	-	0.0%
36	2426824	F-GO-01 OPERACIONAL: RENOVACION Y REUBICACION DE LAS LINEAS DE ADUCCION DEL RESERVORIO R1 AL RESERVORIO R2 DE LA LOCALIDAD DE LA MERCED CHANCHAMAYO. S/. 655,689.91	655,690	DT	NO ET	-	-	0.0%
37	2427608	F-GO-02 OPERACIONAL: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A TRAVES DE LA SECTORIZACION EN EL CERCADO, PAMPA DEL CARMEN Y SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE LA MERCED CHANCHAMAYO. S/. 251,275.70	251,276	DT	NO ET	-	38,318	0.0%
38	2426840	F-GO-03 OPERACIONAL: RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PICHANAQUI S/. 1,064,515.60	1,064,516	DT	NO ET	-	158,255	0.0%
39	2426846	F-GO-04-OPERACIONAL: REUBICACION DEL EMISOR DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED CHANCHAMAYO, S/. 155,014.37	155,014	RDR	NO ET	-	23,044	0.0%
40	2427072	F-GO-05-OPERACIONAL: REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES : ORQUIDEAS , CASABONA DISTRITO DE SAN RAMON. S/. 212,546.66	212,547	RDR	NO ET	-	31,597	0.0%
41	2427592	F-GC-01 COMERCIAL : OPTIMIZACION DE LA GESTION COMERCIAL DE LA EPS SELVA CENTRAL S.A., MEDIANTE LA AMPLIACION DE 1809 MEDIDORES A USUARIOS ASIGNADOS, REPOSICION DE 1605 MEDIDORES POR ANTIGÜEDAD E INSTALACION DE 17 MACROMEDIDORES EN LAS LOCALIDADES DE LA MERCED, SAN RAMON, PICHANAQUI, OXAPAMPA, VILLA RICA, SATIPO. S/. 1,903,311.59	1,903,312	RDR	NO ET	-	206,420	0.0%
42	0	F-GC-02 COMERCIAL : REPOSICION DEL BANCO DE MEDIDORES DE LA EPS SELVA CENTRAL S.A. S/. 205,519.15	205,519	RDR	NO ET	-	28,589	0.0%
43	0	OBRAS REDES DESAGUE-AV.S.RAMON/JU N S.AT	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
44	0	REDES DE DESAGUE SAN VALENTIN-S.R.	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
45	0	REHABILITACION Y AMPLIACION EMISORES-LM	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
46	0	AMPL.REDES DE ALCANT.AA.HH.LIMA LIMON-L	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
47	0	AMPLIACION ALC.SR. DE MURUHUAY-LA MERCED	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
48	0	RED DESAGUE CENTRO COMERCIAL SARITA COLO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
49	0	REDES COLECTORAS Y CONEX.DOMICIL.ALC.PTO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
50	0	AMPLIC.RED DESAGUE BARRIO PROGRESO-SATIP	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
51	0	AMPL.ALCANT.AV.MICAELA B.C1 Y 2-S	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
52	0	CONST.CANAL EVAC.A/PLUVIAL PJE.SAN ANTON	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
53	0	AMPL.RED ALCANT.PJE.LAS TORONJAS-L.MERCE	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
54	0	AMPL.EMISOR FINAL SECTOR SAN CARLOS-L.ME	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
55	0	AMPL.RED SIST.ALCAN. SECTOR RIO TORO-L.M	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
56	167534	AMPLIACION Y EMPALME DEL EMISOR FINAL DE PAMPA DEL CARMEN A LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR MURUGUAY - LA MERCED - CHANCHAMAYO	30,539	RDR	NO ET	-	-	0.0%
57	172956	SISTEMA DE DESAGUE DEL ANEXO CHALHUAPUQUIO - SAN - CHANCHAMAYO	225,924	DT	NO ET	-	-	0.0%
58	237286	REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROLOG. ANDRES A. CACERES Y JR. HUMBOLT LOS ANGELES - PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	19,213	RDR	NO ET	-	-	0.0%
59	185713	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LOS DECANADORES, FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SATIPO - SATIPO	142,138	RDR	NO ET	-	-	0.0%
60	372194	AMPLIACION DEL EMISOR EN LA RED DE ALCANTARILLADO PARA SU VERTIMIENTO FINAL EN EL SECTOR DE SOTARARI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN	306,642	RDR	NO ET	-	-	0.0%
61	3101	SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	851,898	RDR	NO ET	-	-	0.0%
62	0	PLANTA TRATAM.AGUAS RESIDUALES PTO.PICHA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
63	0	REDES AGUA POTABLE Y ALC.SARITA COLONIA-	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
64	0	AMPL.RED AGUA Y ALC.AV.ANTONIO R.C-8,9,1	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
65	0	REHAB.RED A/POT.Y ALC.JR.S.MARTIN C6 Y 7	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
66	134717	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR NUEVA VISTA - SAN RAMON - CHANCHAMAYO	370,195	RDR	NO ET	-	-	0.0%
67	156073	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AV. SAN MARTIN, JR GUSTAVSON, JR. MULLEMBRUK Y JR. SIMON BOLIVAR - OXAPAMPA - PASCO	211,671	RDR	NO ET	-	-	0.0%
68	164114	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES ORQUIDEAS, CLAVELES, TULIPANES, JAZMINES, CROSANDRAS Y MARGARITAS - MERCED - CHANCHAMAYO	150,847	RDR	NO ET	-	-	0.0%
69	0	AMPL.Y MEJ.REDES A/P Y ALC.URB.S.JOSE-PK	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
70	240904	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE LAS CHAVELITAS RIO TORO LA MERCED - CHANCHAMAYO	50,899	RDR	NO ET	-	-	0.0%
71	222715	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR ARIAS DAVILA SAN RAMON - CHANCHAMAYO	222,202	RDR	NO ET	-	-	0.0%
72	307683	INSTALACION DE SEDIMENTADOR DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA RICA	39,455	RDR	NO ET	-	-	0.0%

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
73	304111	AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO CASUALIDAD DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	145,746	RDR	NO ET	-	-	0.0%
74	0	RENOV.LINEA COND.CAPTA.KIMIRIKI- PKI	-	RDR	NO ET	-	38,984	0.0%
75	0	RENOV. SIST. PRETRAT. CERCO PERIM. - V.R.	-	RDR	NO ET	-	36,400	0.0%
76	2612861	ADQUISICION DE MOTOR PRINCIPAL EN EL EPS SELVA CENTRAL DE LA PLANTA DE BOMBEO LA MERCED, DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	369,524	RDR	ET	-	110,331	0.0%
77	0	OTROS ACTIVOS EN CURSO AP-SUPERVISION	66,525	RDR	NO ET	-	-	0.0%
78	49905	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ	489,153	DT	NO ET	-	-	0.0%
79	3093	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON	1,023,923	DT	NO ET	-	-	0.0%
80	2225284	PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN JACINTO DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN "	100,726	DT	NO ET	-	-	0.0%

MOYOBAMBA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	S/N	CONSTRUC. DESARENADOR Y OBRAS PROTECCION	77,517	RDR	NO ET	77,517	-	0.0%
2	S/N	MEJOR.Y AMPLIACION RED 28 DE JULIO CDRA.	16,111	RDR	NO ET	-	-	0.0%
3	S/N	MEJORAM. RED AGUA JR. PEDRO TEJADA C.1 A	4,600	RDR	NO ET	-	-	0.0%
4	S/N	AMPLIAC.RED AGUA VIVIENDA PAZ Y ESPERANZA	3,418	RDR	NO ET	-	-	0.0%
5	S/N	MEJORAM RED AGUA ASO. LOS GIRASOLES MOYO	3,859	RDR	NO ET	-	-	0.0%
6	2133260	CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA DE LA QUEBRADA DE CHUYAYACU SECTOR JUNINGUILLO	127,291	RDR	NO ET	-	-	0.0%
7	113504	MEJORAMIENTO , CONSERVACION Y RECUPERACION DE LAS NACIENTES Y FAJAS MARGINALES DE LAS QUEBRADAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, FUENTES DE AGUA DESTINADAS A LA PROVISION CONTINUA DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MAR	591,195	RDR	NO ET	-	-	0.0%
8	S/N	OBRA REPARACION LINEA ADUCCION Y DESVIO	25,523	RDR	NO ET	-	-	0.0%
9	182771	CAPTACION POR BOMBEO EN LA QUEBRADA RUMIYACU	17,297	RDR	NO ET	-	-	0.0%
10	193282	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE FONAVI II MOYOBAMBA-SAN MARTIN	71,793	RDR	NO ET	-	-	0.0%
11	S/N	MEJOR.Y EQU.INST.DETECC.DE PERDIDAS Y CO	1,815	RDR	NO ET	-	-	0.0%
12	208448	AMPLIACION DE LA RED MATRIZ DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION LOS MANGOS - SECTOR UNION UNIVERSITARIA MOYOBAMBA - SAN MARTIN	2,162	RDR	NO ET	-	-	0.0%
13	213914	INSTALACION DE VALVULA DE REGULACION Y MACROMEDIDOR EN EL CRUCE DE LA CALLE 20 DE ABRIL Y FRANJA MARGINAL MOYOBAMBA - SAN MARTIN	19,739	RDR	NO ET	-	-	0.0%
14	210931	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION PRO - VIVIENDA 5 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	205,334	RDR	NO ET	-	-	0.0%
15	205941	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION SAN FRANCISCO - BARRIO DE LLUYLLUCUCHA MOYOBAMBA - SAN MARTIN	277	RDR	NO ET	-	-	0.0%
16	251551	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALMENDRA MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	13,130	RDR	NO ET	-	-	0.0%
17	251345	MEJORAMIENTO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOYOBAMBA - SAN MARTIN	29,992	RDR	NO ET	-	-	0.0%
18	222147	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION FERNANDO BELAUDE TERRY Y PROLONGACION SECTOR HUASTILLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	21,468	RDR	NO ET	-	-	0.0%
19	252044	AMPLIACION DE LA RED MATRIZ DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION PUNTA HALCON MOYOBAMBA - SAN MARTIN	9,022	RDR	NO ET	-	-	0.0%
20	264876	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PLAYA DEL RIO MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	31,029	RDR	NO ET	-	-	0.0%
21	264065	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS JARDINES, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	46,844	RDR	NO ET	-	-	0.0%
22	285131	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CAPTACION ALMENDRA DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	22,836	RDR	NO ET	-	-	0.0%
23	291489	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MATEO EPS - MOYOBAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	141,533	RDR	NO ET	-	-	0.0%
24	S/N	MEJOR.VIAS INT.PLANTA DE TRATAMIENTO AGU	57,437	RDR	NO ET	-	-	0.0%
25	6725	MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO - EPS MOYOBAMBA	1,356,559	DT	NO ET	-	-	0.0%
26	S/N	SECTORIZACION PRIMERA ETAPA	33,020	RDR	NO ET	-	-	0.0%
27	308657	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ALMENDRA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	13,405	RDR	NO ET	-	-	0.0%
28	311182	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION QUE ABASTECE A LOS AA.HH. LAS PALMERAS Y PUNTA HALCON DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	4,465	RDR	NO ET	-	-	0.0%
29	316903	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES MISHQUIYACU Y CHUYAYACU PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA	7,833	RDR	NO ET	-	-	0.0%
30	380379	AMPLIACION DEL CATASTRO TECNICO Y COMERCIAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA EPS-MOYOBAMBA.PROV. MOYOBAMBA - DPTO SAN MARTIN	79,073	RDR	NO ET	-	-	0.0%
31	2496722	REMEDIACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA URBANIZACION VISTA ALEGRE EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	2,450,247	DT	ET	-	-	0.0%
32	2555988	CONSTRUCCION DE POZO: EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	276,391	RDR	ET	-	-	0.0%
33	2526696	ADQUISICION DE TUBERIA; EN EL(LA) JR 20 DE ABRIL CUADRA 7, 8 Y 9 Y JR JUNIN CUADRA 7 Y 8 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	226,653	RDR	ET	-	-	0.0%
34	2421412	REMEDIACION DE TUBERIA DE PLÁSTICO HDPE; ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL, MACROMEDIDORES Y VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN; EN EL(LA) EPS	149,380	RDR	NO ET	-	49,280	0.0%

		MOYOBAMBA SRL CON LA SECTORIZACION EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN						
35	2666962	RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, LOS SECTORES TUMBA, ALGARROBOS Y VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	264,000	RDR	NO ET	-	-	0.0%
36	S/N	ALCANT. AA.HH. TUPAC AMARU 2004	15,574	RDR	NO ET	-	-	0.0%
37	S/N	AMPLIACION REDES DESAGUE 2004	31,123	RDR	NO ET	-	-	0.0%
38	S/N	AMPLIAC.SISTEMA SANITARIO AA.HH. TUPAC A	26,680	RDR	NO ET	-	-	0.0%
39	S/N	AMPLIAC.RED DESAGUE JR. LAS GUINDAS	3,865	RDR	NO ET	-	-	0.0%
40	S/N	RED DESAGUE JR. PUCALPA 2009	6,899	RDR	NO ET	-	-	0.0%
41	S/N	RED DESAGUE SECTOR BOSQUE PUNTA DOÑE	2,200	RDR	NO ET	-	-	0.0%
42	S/N	OBRA AMP.RED DESAG.MARGARITAS Y PAUCARE	7,188	RDR	NO ET	-	-	0.0%
43	S/N	RED CONDOMINIAL DESAG.CALLE TUPAC AMARU	3,097	RDR	NO ET	-	-	0.0%
44	S/N	AMP.RED MATRIZ DESAGUE ORQ.CLAVES 2010	15,259	RDR	NO ET	-	-	0.0%
45	S/N	MEJOR. RED DESAGUE JR. ANDALUCIA C-1	14,440	RDR	NO ET	-	-	0.0%
46	S/N	REHABILITACION DESAGUE SECTOR JUAN ANTON	13,405	RDR	NO ET	-	-	0.0%
47	218675	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PUERTO DE TAHUISHCO, MOYOBAMBA - SAN MARTIN	24,448	RDR	NO ET	-	-	0.0%
48	226228	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CHAURAYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	62,963	RDR	NO ET	-	-	0.0%
49	254194	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UN POZO PERCOLADOR EN EL SECTOR LAS FLORES-DOÑE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	16,366	RDR	NO ET	-	-	0.0%
50	S/N	MEJOR.SIST.ALCANT.SECTOR MIRAFLORES	9,810	RDR	NO ET	-	-	0.0%
51	273629	REHABILITACION Y ADECUACION DE LOS TANQUES SEPTICOS Y POZOS DE PERCOLACION DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	79,253	RDR	NO ET	-	-	0.0%
52	S/N	MEJOR.Y AMPLIA. DE ALCANT.-RES 072- 2014	11,010	RDR	NO ET	-	-	0.0%
53	325246	REHABILITACION Y ADECUACION DE LOS TANQUES SEPTICOS Y POZOS DE PERCOLACION DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	30,483	RDR	NO ET	-	-	0.0%
54	112136	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	748,466	RDR	NO ET	-	-	0.0%
55	2573427	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) BARRANCO TUMINO - EPS MOYOBAMBA S.A DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	-	RDR	NO ET	265,469	131,679	49.6%
56	2670905	RENOVACION DE TUBERIA BUZON Y CONEXION ALCANTARILLADO PROLONGACION MOQUEGUA	1,254,234	RDR	NO ET	-	-	0.0%
57	S/N	AMBIENTACION SALA DE REUNION 2004	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
58	S/N	MEJORAMIENTO MODULO I G.OPERACIONES	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
59	S/N	PROGRAMA A TRABAJAR URBANO -MOYOBAMBA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
60	S/N	PROYECTO AGUA Y DESAGUE 20 ABRIL 2007	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
61	S/N	MEJORAMIENTO A Y D ANDALUCIA 2010	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
62	S/N	MEJORAM. RED AGUA Y DES. PUNO-20 DE AB-S	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
63	S/N	MEJORAMIENTO A Y D ANDALUCIA 2010 (2)	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
64	204692	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ATENCION AL CLIENTE DE LA EPS MOYOBAMBA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
65	S/N	REHABILITACION Y PARCHADO DE CALLES	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
66	S/N	TECHO METALICO PARA ESTACIONAMIENTO DE MA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
67	2627971	REMODELACION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL(LA) PTAP SAN MATEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MATEO, EN EL CENTRO POBLADO MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	242,991	RDR	NO ET	71,469	-	0.0%

HUANCAMELICA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2424235	MMTO CORECT SIST CAPTA PTAP ICHU	171,905	RDR	NO ET	-	6,250	0.0%
2	2424242	RENOV.9 CAMARAS PURGA CONDUCT.ICHU MILLPO	148,305	RDR	NO ET	-	-	0.0%
3	2424296	MJMTO SECTORIZ SIST DISTRIB AGUA POTABLE	449,644	RDR	NO ET	-	-	0.0%
4	S/C/S	ADQ SERVIDORES.E INSTAL.EN LOCAL C. PLAN	119,368	RDR	NO ET	-	-	0.0%
5	2424283	ADQ. DE 2560 MICROMEDIDORES PARA AMPLIAC	516,381	RDR	NO ET	-	-	0.0%
6	S/C/S	ADQ. EQ. CONTROL DE CALIDAD FISICO QUIMI	430,903	RDR	NO ET	-	-	0.0%
7	S/C/S	ADQ.INST BCO DE PRUEBAS DE MEDIDORES	195,156	RDR	NO ET	-	-	0.0%
8	S/C/S	ADQ. DE 02 EQUIPOS INYECTORES DE CLORO A	181,214	RDR	NO ET	-	-	0.0%
9	S/C/S	REP Y MJRAMTO SIST.DOSIF DE ISUM QUIM PT	672,409	RDR	NO ET	-	-	0.0%
10	S/C/S	RENOV. 03 VALVULAS TIPO MARIPOSA DN PTAP	95,852	RDR	NO ET	-	-	0.0%
11	2492521	CONST.SERV.HIGIENICOS PTAP MILLPO	53,514	RDR	NO ET	-	-	0.0%
12	2468805	REHABIL.RED AP JR.MANCO C Y AV.ANDRES A.	120,170	RDR	ET	-	-	0.0%
13	2497283	AMPL. MJMTO AP Y ALC UBANZ.STA ANITA S4	81,555	RDR	ET	-	-	0.0%
14	2543398	RENOV AREA ADM ATENC CLIENTE GER. COMERC	90,813	RDR	ET	-	-	0.0%

15	2553959	CONST.SIST.ABAST AP Y ALC MALEC.STA ROSA	50,281	RDR	ET	-	-	0.0%
16	2299020	AMPL.MJR SERV AP ALC SEC SR MILAG NIÑO L	1,345,813	RDR	NO ET	-	9,450	0.0%
17	2565461	CONST.SIT AB AP RED ALC JR 5 ESTRELLAS Q	393,892	RDR	ET	-	-	0.0%
18	2664155	CONST. RED DIST Y RED ALC JR MERCURIO PS	198,498	RDR	ET	-	165,888	0.0%
19	2687900	CONST.RED ALCANT.AV.ALFONSO UGARTE GARBA	134,402	DT	ET	-	-	0.0%

MOQUEGUA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2564982	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION: EN EL(LA) C.P. SAN FRANCISCO DE LA CALLE 1ERO DE MAYO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	156,824	RDR	NO ET	-	-	0.0%
2	2556603	REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE REJA MECANIZADA Y COMPACTADOR LAVADOR DE SOLIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR HOMO EN LA LOCALIDAD HOMO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	966,853	RDR	NO ET	-	-	0.0%
3	2573033	ADQUISICION DE MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN Y YUNGUYO INCLUYE SU INSTALACION; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA Y C.P. CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	804,527	RDR	ET	5,508	4,661	84.6%
4	2553231	ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	649,718	RDR	ET	-	-	0.0%
5	2553231	ADQUISICION DE SISTEMA SCADA; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	649,718	DT	ET	-	-	0.0%
6	2551433	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AMBITO DE LA EPS MOQUEGUA S.A. INCLUYE SU INSTALACION. EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL JARDINES DE VILLA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	353,165	DT	ET	-	-	0.0%
7	2562576	CONSTRUCCION DE PASE AEREO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1,145,989	DT	NO ET	-	-	0.0%
8	2592685	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE METALES; RENOVACION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN, MEDIANTE LA INSTALACION DE SENSORES DE PH Y TURBIDEZ, INSTALACION DE ANALIZADOR DE HIERRO, MANGANESO, ALUMINIO Y ARSENICO EN LINEA; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1,554,884	DT	ET	1,124,468	549,800	48.9%
9	2592685	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE METALES; RENOVACION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN, MEDIANTE LA INSTALACION DE SENSORES DE PH Y TURBIDEZ, INSTALACION DE ANALIZADOR DE HIERRO, MANGANESO, ALUMINIO Y ARSENICO EN LINEA; EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1,554,884	RDR	ET	-	-	0.0%
10	2593716	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	925,921	DT	ET	222,778	3,000	1.3%
11	2593716	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	925,921	RDR	ET	-	-	0.0%
12	2571005	REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MONORRELLENOS SANITARIOS EN LA PTAR OMO PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DE CÁMARA DE REJAS Y DESARENADORES DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	712,446	DT	ET	184,172	145,474	79.0%
13	2571005	REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) AMBITO EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MONORRELLENOS SANITARIOS EN LA PTAR OMO PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DE CÁMARA DE REJAS Y DESARENADORES DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	712,446	RDR	ET	116,104	96,023	82.7%
14	2604877	RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) CIUDAD DE MOQUEGUA CON LA INSTALACION DE 11537 MEDIDORES EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1,895,998	RDR	ET	-	-	0.0%
15	2604877	RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) CIUDAD DE MOQUEGUA CON LA INSTALACION DE 11537 MEDIDORES EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1,895,998	RDR	ET	1,545,044	1,386,516	89.7%
16	2628334	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES PARA VESTIDORES, CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1,173,550	RDR	ET	636,279	-	0.0%
17	2644568	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EPS MOQUEGUA C.P. CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1,084,523	RDR	NO ET	488,302	-	0.0%
18	2641855	RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACION; EN EL(LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	487,414	RDR	NO ET	287,038	-	0.0%
19	2338414	MEJ.AMPLIAC.AGUA POTABLE Y SIST. DISPOSICION EXCRETAS JJ.VV. STA ROSA, OMO Y RINCONADA	27,272,396	0	NO ET	-	-	0.0%
20	2680373	RENOVACION DE EQUIPO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION; EN EL(LA) CAMARAS DE SECTORIZACION MEDIANTE LA INSTALACION DE TARJETAS EN ELECTROVALVULAS EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	164,099	RDR	ET	139,066	-	0.0%
21	2681450	ADQUISICION DE COMPUERTA; EN EL(LA) EN EL PUNTO DE CAPTACION DE LA PTAP YUNGUYO INCLUYE INSTALACION DE REJILLA DE INGRESO, EN EL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	29,155	RDR	ET	24,708	21,967	88.9%
22	2677544	ADQUISICION DE CAMIONETA, VEHICULO Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	499,350	RDR	ET	419,004	47,829	11.4%
23	2644489	REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) EPS MOQUEGUA S.A., MEDIANTE LA REPARACION DE RESERVORIOS Y CASETA DE VALVULAS EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO Y DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	13,019	RDR	ET	13,019	13,000	99.9%
24	2708591	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEN CHEN, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL,	18,953	RDR	ET	18,953	-	0.0%

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
		DOSIFICACION, REGULACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA						
25	2693136	REMEDIACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AREA DE VMA) PLANTA DE TRATAMIENTO EPS MOQUEGUA S.A. CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	21,058	RDR	ET	21,058	-	0.0%
26	2692209	CONSTRUCCION DE DESARENADOR; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OMO DE LA EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	31,274	RDR	ET	31,274	-	0.0%
27	2691459	REPARACION DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) LAGUNAS TERCIARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OMO DE LA EPS MOQUEGUA DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	27,112	RDR	NO ET	27,112	-	0.0%

EMAPA HUARAL

	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2466043	ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE AIRE DE LA EPS EMAPA HUARAL S.A., DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA	941,584	DT	NO ET	44,280	-	0.0%
2	2532269	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) DEL SECTOR 1 DE EMAPA HUARAL S.A. DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	538,618	RDR	NO ET	32,484	-	0.0%
3	2607699	REMEDIACION DE PTAP; EN EL(LA) EPS EMAPA HUARAL S.A. AV. HUANDO SIN NUMERO DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	789,897	DT	NO ET	79,944	-	0.0%
4	2628024	MEJORMTO.SECTORIZ AREAS OPERT.CRITICAS (SECT.N°01Y04) EHSA	1,469,658	RDR	NO ET	1,434,870	455,288	31.7%
5	2607699	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL DE EMAPA HUARAL S.A. DISTRITO DE HUARAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	584,179	RDR	NO ET	376,671	163,608	43.4%
6	0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR AMPLIACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ÁMBITO DE EMAPA HUARAL S.A	115,000	RDR	ET	115,000	52,377	45.5%
7	0	CONSTRUCCIÓN DE REDES Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) SECTORES OPERATIVOS 1 Y 4 DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA	704,000	RDR	ET	704,000	-	0.0%
8	0	ACTUALIZACION DEL CATRASTO COMERCIAL DE USUARIOS Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO DE LA EPS EMAPA HUARAL S.A.	850,000	RDR	ET	711,729	610,949	85.8%
9	0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA USUARIOS PROMEDIO POR VIDA UTIL EN EL ÁMBITO EMAPA HUARAL S.A.	3,595,360	RDR	ET	2,100,000	1,885,568	89.8%
10	0	REDUCCIÓN DE CONEXIONES INACTIVAS EN EL ÁMBITO DE LA EPS EMAPA HUARAL S.A.	43,200	RDR	ET	43,200	32,559	75.4%
11	0	RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUARAL	60,000	RDR	ET	60,000	23,364	38.9%
12	0	PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS EN LA LOCALIDAD DE HUARAL	40,000	RDR	ET	40,000	32,043	80.1%
13	0	PROGRAMA DE CONTROL DE PRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUARAL	11,293	RDR	ET	11,293	13,098	116.0%
14	0	ELABORACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE INGENIERÍA PARA LA GESTIÓN OPERACIONAL-ESTIMACIÓN DE COSTOS, ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVERSIÓN Y CATASTRO	8,800	RDR	ET	8,800	15,903	180.7%
15	0	ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES EPS EMAPA HUARAL S.A.	30,000	RDR	ET	30,000	25,573	85.2%
16	0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LAS REDES DE AGUA EN LAS TRONCALES (LÍNEAS DE ADUCCIÓN) DE LOS DIFERENTES SECTORES EN LA LOCALIDAD DE HUARAL	132,000	RDR	ET	132,000	-	0.0%

AGUAS DE LIMA NORTE

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	-	RDR	NO ET	98,421	102,020	103.7%
2	2553442	CREACION DE RESERVORIO ELEVADO DE 1000 M3 DE AGUA POTABLE EN EL POZO 4 DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2,758,398	RDR	ET	2,012,528	2,011,882	100.0%
3	2638727	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) PASAJE LINO DEL CENTRO POBLADO DE MAZO DEL DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	30,434	RDR	NO ET	17,023	17,023	100.0%
4	2568999	CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PASAJE GERTRUDIS DISTRITO DE HUALMAY, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	39,331	RDR	NO ET	37,330	36,534	97.9%
5	2632339	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PASAJE S/N COLINDANTE A LA CALLE ROSA MERINO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	40,842	RDR	NO ET	41,661	41,661	100.0%
6	2674641	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CALLE CONSTITUCIÓN Y LEONCIO PRADO CDRA. 03 Y 04 DEL DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	380,981	RDR	ET	153,540	153,540	100.0%
7	2674548	AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOS DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE UNION Y CALLE CEMENTERIO DEL DISTRITO DE VEGUETA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA.	123,256	RDR	ET	51,024	48,913	95.9%
8	2597528	CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CUADRA 3 DE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	151,920	RDR	ET	153,856	149,180	97.0%
9	2674645	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLE MANUEL MEDINA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	127,584	RDR	ET	124,747	104,461	83.7%
10	2686109	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. LA PAZ CUADRA 06 Y 07 DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	201,567	RDR	ET	153,700	126,892	82.6%
11	2466416	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA PROLONG. SANTA ROSA Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE HUALMAY . PROV. HUAURA DPTO LIMA	630,863	RDR	ET	384,949	444,776	115.5%

SEDAPAL

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2403089	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA	879,472,715	RDR	ET	406,416	25,454,342	6263.1%
2	2481681	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-079, CD-088, CD-098 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO - DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.	3,402,249	RDR	ET	-	-	0.0%
3	-----	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO PARA LIMA SUR - NUEVA PTAR SUR -DISTRITO DE PACHACAMAC Y LURIN	206,000	RDR	NO ET	-	-	0.0%
4	2453404	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO; EN EL(LA) SECTOR HIDRÁULICO B, DISTRITO LURIN, DISTRITO PACHACAMAC Y DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,263,418	0	ET	195,416	-	0.0%
5	2403505	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	86,167,825	RDR	ET	687,269	-	0.0%
6	2481445	RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO: EN EL (LA) COLECTOR LOS CHANCAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,192,173	RDR	ET	493,916	-	0.0%
7	2532390	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION; EN EL(LA) PTAR PROVISUR PARA EL SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE RIEGO EN LOS DISTRITOS DE SAN BARTOLO, PUNTA NEGRA, PUNTA HERMOSA Y DISTRITO DE SANTA MARIA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	18,500	RDR	ET	-	-	0.0%
8	2481688	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-043 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	130,816	RDR	ET	-	-	0.0%
9	2627863	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR EL CORREGIDOR DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15,355,728	RDR	ET	135,290	-	0.0%
10	-----	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA	164,800	RDR	NO ET	-	-	0.0%
11	2262477	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	69,244,564	RDR	ET	-	145,609	0.0%
12	2403501	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	73,842,257	RDR	ET	10,277,927	8,624,404	83.9%
13	2481690	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-040, CD-042 CD-044, CD-053, CD-058, CD-067, CD-083, CD-089 DE LA ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN EL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,203,281	RDR	ET	-	-	0.0%
14	2302784	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA- DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	1,508,154,867	RDR	ET	475,762	-	0.0%
15	2286612	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 348, 349 Y 351 - COLLIQUE - EN LOS DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	156,172,836	RDR	ET	38,464,386	33,825,547	87.9%
16	2412962	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219, 366, 367, 389, 390, 391, 392 Y 393 - PIEDRAS GORDAS, EN LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y ANCON DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	65,393,744	RDR	ET	-	-	0.0%
17	2395022	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS EN EL ÁREA DE DRENAJE DE LOS COLECTORES COMAS Y CHILLON, DISTRITOS: CARABAYLLO, COMAS, LOS OLIVOS, SAN MARTIN DE PORRES E INDEPENDENCIA , 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	369,063,477	RDR	ET	453,348	658,711	145.3%
18	2305264	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA-DISTRITO CIENEGUILLA	69,627,710	RDR	ET	6,682,855	9,810,377	146.8%
19	2503197	RENOVACION DE LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) TRAMO COMPRENDIDO DE LA CÁMARA DE REBOMBEO CR-306 AL RESERVOIRIO R-11C DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,750,063	RDR	ET	-	-	0.0%
20	2436433	RENOVACIÓN DE PANTALLAS; EN EL (LA) CAUCE DEL RIO RIMAC EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	45,748,118	0	ET	911,597	-	0.0%
21	2403496	CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA FUTURA PTAR TABOADA - DISTRITO CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	850,095	RDR	ET	68,422	-	0.0%
22	2546943	CONSTRUCCION DE LOSA; EN EL(LA) RESERVOIRIO R-01 Y R-02 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION PARQUE INTERNACIONAL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	6,086,713	RDR	NO ET	-	-	0.0%
23	2280509	CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS PUENTE PIEDRA PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	56,112,037	RDR	ET	-	-	0.0%
24	2304658	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS	27,794,415	RDR	ET	-	672,334	0.0%
25	2539040	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA DE LA PTAP LA ATARJEA - NUEVO ESTANQUE REGULADOR N°3 DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	194,857,546	RDR	ET	-	-	0.0%
26	2330631	CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	26,707,336	RDR	ET	61,755	168,200	272.4%
27	2511309	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	18,866,100	RDR	ET	-	-	0.0%
28	2395607	CONSTRUCCIÓN DE CERCO; EN EL(LA) RESERVOIRIOS EXISTENTES DE LA ZONA NORTE, DISTRITOS DE CARABAYLLO, LOS OLIVOS, INDEPENDENCIA, VENTANILLA Y DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,019,322	RDR	ET	-	-	0.0%

29	2523082	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVIORIOS R-165, R-612 Y CISTERNA CR-23 EN LA JURISDICCION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	622,750	RDR	ET	-	-	0.0%
30	2538703	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO COMPRENDIDO DEL BZ-345122 AL BZ-282502 DEL COLECTOR LOS MIRTO PARODI EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO Y DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	379,545	RDR	ET	248,112	-	0.0%
31	161622	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DE LOS ESQUEMAS CAJAMARQUILLA, NIEVERÍA Y CERRO CAMOTE, SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUARACHIRI Y DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2,279,661	RDR	NO ET	455,932	-	0.0%
32	2403498	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - 5TO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	175,523,957	RDR	NO ET	21,643,794	31,081,586	143.6%
33	2305241	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 - NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR	1,369,898,119	RDR	NO ET	165,358,947	230,016,648	139.1%
34	129413	REHABILITACIÓN DE 04 POZOS DE REEMPLAZO: P-134, P-426, P-490 Y P-649 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA,	6,146,696	RDR	NO ET	-	-	0.0%
35	2413138	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	80,000	RDR	ET	-	-	0.0%
36	2413676	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY - 2DA ETAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	9,587,926	RDR	ET	224,185	-	0.0%
37	2546939	CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) REEMPLAZO DE LOS POZOS EXISTENTES P-379 Y P-478 - DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,922,772	RDR	NO ET	-	-	0.0%
38	2508745	RENOVACION DE POZO; EN EL(LA) POZO EXISTENTE P-429 - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,422,583	RDR	ET	-	-	0.0%
39	2481687	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-045 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	929,999	RDR	ET	-	-	0.0%
40	2503196	CONSTRUCCIÓN DE CASETA; EN EL(LA) POZO 669 PARA EL ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,554,940	RDR	ET	-	-	0.0%
41	2508915	MEJORAMIENTO DE RESERVIORIOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	14,877,404	RDR	ET	-	-	0.0%
42	2171381	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	51,202,517	RDR	ET	-	-	0.0%
43	2361410	RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFIANZAMIENTO MARCAPOMACOCCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASHA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNÍN	13,973,011	RDR	ET	297,861	-	0.0%
44	2481686	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-068 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	2,785,302	RDR	ET	-	-	0.0%
45	2031100	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCON	50,150,758	RDR	ET	14,135,535	10,917,799	77.2%
46	2410512	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 34 - CERCADO DE LIMA - DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	424,101	RDR	ET	-	-	0.0%
47	2481683	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL (LA) CD-059 DEL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO - DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	3,003,001	RDR	ET	-	-	0.0%
48	2481682	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL (LA) CD-062 Y CD-108 EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,795,800	RDR	ET	-	-	0.0%
49	2481680	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL (LA) CD-082 DEL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,226,364	RDR	ET	-	-	0.0%
50	2481679	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-05, CD-028, CD-029 Y CD-030 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR - DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4,736,083	RDR	ET	-	-	0.0%
51	2329963	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	1,001,722	RDR	ET	-	-	0.0%
52	2483459	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-202, CD-204, CD-205, CD-212 Y CD-213 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	7,961,973	RDR	ET	86,386	-	0.0%
53	2479252	RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) TERRENO DE LOS RESERVIORIOS DENOMINADOS LA MENACHO EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA,	2,340,971	RDR	ET	130,274	-	0.0%
54	2305620	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309 - DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2,528,475	RDR	ET	247,291	-	0.0%
55	2403502	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ÁLAMOS DE MONTEERRICO, SECTORES 296 Y 297 - SANTIAGO DE SURCO	13,460,596	RDR	NO ET	367,082	203,314	55.4%
56	2300153	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	8,688,259	RDR	ET	10,000	-	0.0%
57	2309364	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS - DISTRITO DE LA MOLINA	19,930,293	RDR	ET	-	-	0.0%
58	2403503	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESQUEMA JOSÉ GÁLVEZ SECTOR 315 Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO EN LOS DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y LURIN DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	6,275,661	RDR	ET	59,202	-	0.0%

59	2168015	AMPLIACION DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 98 EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2,071,850	RDR	ET	-	-	0.0%
60	307127	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL INTERCEPTOR NORTE, COSTANERO, LA MARINA, ARGENTINA Y MORALES DUÁREZ, EN LOS DISTRITOS DEL AGUSTINO, CERCADO DE LIMA, BREÑA, CARMEN DE LA LEGUA, MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO, LINCE, JESÚS MARÍA, PUEBLO LIBRE, SAN MIGUEL, MAGDALENA DEL MAR, SANTA ANITA Y EL CALLAO, EN LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO	8,474,145	RDR	NO ET	2,516,949	838,983	33.3%
61	2031099	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO – SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	2,104,386	RDR	ET	450,000	-	0.0%
62	2603156	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SECTORES 39, 50, 54, 55, 56, 57 Y 58 Y ZONAS ALEDAÑAS DE LOS DISTRITOS DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO DEL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	2,092,277	RDR	ET	-	-	0.0%
63	2511305	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	80,000	RDR	ET	-	-	0.0%
64	2603159	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SECTORES 38, 49, 51, 52, 53 DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS, EN LOS DISTRITOS DE SURQUILLO Y DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	407,266,738	RDR	ET	-	-	0.0%
65	2395956	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	4,503,108	RDR	ET	420,900	846,772	201.2%
66	2361231	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA, ZONAS ALEDAÑAS DEL - DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	4,856,205	RDR	ET	391,872	1,025,783	261.8%
67	2395967	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	61,983,981	RDR	ET	-	-	0.0%
68	2601614	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 – DISTRITO DE SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	461,495,210	RDR	ET	-	-	0.0%
69	2395987	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 298 Y 299 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	374,960,846	RDR	ET	-	-	0.0%
70	171619	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CARAPONGO DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,515,749	RDR	NO ET	542,372	-	0.0%
71	171622	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PTAR SAN ANTONIO DE CARAPONGO DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA	8,000	RDR	NO ET	-	-	0.0%
72	2413014	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y 416 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	10,235,978	RDR	ET	-	-	0.0%
73	2390678	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	6,572,945	RDR	ET	279,742	-	0.0%
74	101467	RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LAS REDES DE AGUA POTABLE SECTORES 7 Y 9 DISTRITO LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	82,400	RDR	NO ET	-	-	0.0%
75	2396084	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	222,703,341	RDR	ET	-	-	0.0%
76	2395479	RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCKEY DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	14,293,451	RDR	ET	-	22,515	0.0%
77	2466932	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN PARA LA LÍNEA MATRIZ ATARJEJA SUR EN LOS DISTRITOS DE EL AGUSTINO Y SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	132,948,290	RDR	ET	-	-	0.0%
78	2310898	REHABILITACIÓN , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. CERRO SAN COSME Y A.H. SAN COSME - AMPLIACIÓN (SECTORES 1 Y 2) - DISTRITO: LA VICTORIA	9,478,651	RDR	ET	-	147,703	0.0%
79	2522916	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.A.H.H. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,262,934	RDR	NO ET	-	-	0.0%
80	2544118	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING Y URB. PRIMAVERA DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	9,161,572	RDR	ET	-	-	0.0%
81	2454511	RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SECTOR 8 DE SEDAPAL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	12,862,005	RDR	ET	-	-	0.0%
82	2404452	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	97,139,394	RDR	ET	-	-	0.0%
83	2168014	AMPLIACION DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MOLINA, Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE	26,756,255	RDR	ET	-	331,329	0.0%
84	2403508	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA	53,089,328	RDR	ET	17,729,983	310,326	1.8%
85	2466927	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE LOS SECTORES ABASTECIDOS POR LOS RESERVORIOS DE GRAN CAPACIDAD LA MENACHO Y VICENTELO EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	462,354,827	RDR	ET	1,337,885	1,743,017	130.3%
86	2389329	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA; DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	119,862,077	RDR	ET	-	-	0.0%
87	2433216	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) URB. ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	125,457,809	RDR	ET	-	6,558	0.0%
88	2322476	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	3,893,967	RDR	ET	368,506	368,506	100.0%

89	2305226	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES-SARGENTO LORES-DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO	48,649,827	RDR	ET	-	-	0.0%
90	2280305	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANTADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N°1 Y N°2, LA ATARJEIA - DISTRITO DEL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	66,152,858	RDR	ET	2,740,316	43,664	1.6%
91	2389565	CREACION DE LA ESTACIÓN DE ALERTA DEL RÍO RIMAC, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,759,633	RDR	ET	-	94,890	0.0%
92	2571696	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEDE - ATARJEIA - EL AGUSTINO	8,310,518	RDR	ET	-	-	0.0%
93	2450398	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) RESERVORIOS Y ESTACIONES DE BOMBEO DE LA ZONA CENTRO DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	941,319	RDR	ET	-	-	0.0%
94	2661752	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS ÁREAS DE DRENAJE DE LOS COLECTORES VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, VILLA EL SALVADOR Y SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LOS DISTRITOS DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, VILLA EL SALVADOR Y DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1,103,321,483	RDR	ET	111,229	111,229	100.0%
95	2423757	RENOVACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) EMISOR VENEZIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	37,494,024	RDR	ET	751,404	-	0.0%
96	2413023	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL COLECTOR N° 6 EN LOS DISTRITOS DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO; DISTRITO DEL RIMAC Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	611,881,520	RDR	ET	382,762	-	0.0%
97	2396742	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SEDAPAL - COLECTORES DE ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	44,073,712	RDR	ET	-	-	0.0%
98	2414007	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA ETAPA Y 5TA ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	900,084	RDR	ET	-	-	0.0%
99	2429851	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) REBOSE DE LA CÁMARA DE REDUCTORA DE PRESIÓN CRP-1 DEL RAMAL NORTE, DESDE LA SALIDA DEL TÚNEL 2 AL RÍO CHILLÓN DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	9,150,881	RDR	ET	-	-	0.0%
100	2456924	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS HABILITACIONES URBANAS: URB. TÚPAC AMARU, URB. LIMATAMBO NORTE EL TREBOL, LA MARINERA, SAN LUIS 1RA Y 2DA ETAPA, URB. JAVIER PRADO 3RA, 4TA Y 5TA ETAPA, URB. LA VIÑA, URB. VILLA JARDÍN 1RA Y 2DA ETAPA, URB CAHUACHE DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,433,238	RDR	ET	163,947	-	0.0%
101	2323912	CREACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SEDAPAL , LA ATARJEIA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	1,134,541	RDR	ET	321,174	321,175	100.0%
102	2409966	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	249,082,813	RDR	ET	16,320,700	411,679	2.5%
103	2322477	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H. DEL CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2 - DISTRITO EL AGUSTINO	78,388,105	RDR	ET	-	367,818	0.0%
104	2310884	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ DN 1200 MM Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN EL CRUCE DEL RÍO RIMAC - DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	26,349,809	RDR	ET	-	-	0.0%
105	2545617	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) URBANIZACIÓN SALAMANCA EN LA LOCALIDAD VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO	10,467,767	RDR	NO ET	-	-	0.0%
106	2282811	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	18,458,471	RDR	ET	-	-	0.0%
107	2502869	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) CONJUNTO HABITACIONAL PALOMINO DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13,998,930	RDR	ET	510,294	-	0.0%
108	2577501	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-65 DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	6,947,796	RDR	NO ET	1,204,894	180,091	14.9%
109	2576452	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) PTAR VENTANILLA PARA LA ADECUADA DISPOSICION FINAL DE SUS EFLUENTES - DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	24,777,665	RDR	NO ET	14,244,737	1,324,205	9.3%
110	-----	CREACION DE LA PLANTA DESALINIZADORA DE LIMA NORTE	633,635,000	RDR	NO ET	-	-	0.0%
111	-----	CREACION DE LA PLANTA DESALINOZADORA DE LIMA SUR	829,636,676	RDR	NO ET	-	-	0.0%
112	2309659	ETAPA 2 PTAR VENTANILLA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
113	2673428	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO Y DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1,940,301,308	RDR	ET	1,813,559	229,576	12.7%
114	2494306	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO DEL COLECTOR CIRCUNVALACIÓN DESDE LA AV. SANTIAGO DE SURCO CON AV. LOS PRÓCERES DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO HASTA LA AV. SANTA ROSA CON AV. SANTA TERESA, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	559,941,898	RDR	ET	15,450,494	-	0.0%
115	2663089	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL EBAR CÁMARA ÚNICA - COLECTOR CENTENARIO CALLAO DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	186,881,478	RDR	ET	354,000	-	0.0%
116	323812	RENOVACIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO EN LA LÍNEA DE DESCARGA DE LA PTAR SAN BARTOLO, DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	68,542,154	RDR	NO ET	2,939,106	-	0.0%
117	2312209	MEJORAMIENTO SISTEMA PTAR SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO - MESIAS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	329,853,952	RDR	ET	804,871	-	0.0%
118	2395059	CREACION DE LA REPRESA JACAYBAMBA - DISTRITO DE HUAROS - PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA	505,893,659	RDR	ET	222,490	-	0.0%
119	2361412	CREACIÓN DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARJEIA EL AGUSTINO - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	411,781,444	RDR	ET	875,344	-	0.0%

120	2603269	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TUNEL GRATON EN LA CUENCA DEL RIO RIMAC EN LOS DISTRITOS DE SAN MATEO Y HUAROCHIRI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	228,857,005	RDR	ET	5,056,813	6,696,161	132.4%
121	2544899	CREACION DEL NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	243,496,344	RDR	ET	628,879	-	0.0%
122	141900	CREACION DEL TUNEL TRASANDINO LA VIUDA LA PROVINCIA DE CANTA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	336,728,034	RDR	ET	12,000	-	0.0%
123	2413129	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN FUENTE POR GALERIAS FILTRANTES VALLE RIO CHILLON DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	2,230,270	RDR	ET	860,459	-	0.0%
124	2413128	CREACION DE CAPTACIÓN POR GALERIAS FILTRANTES DE LA FUENTE DE AGUA DEL RIO RIMAC EN LOS DISTRITOS DE CHACLACAYO Y LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,781,745	RDR	ET	-	68,839	0.0%
125	2611775	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN FUENTE DE AGUA POR EXTRACCION Y RECARGA ARTIFICIAL , INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIO RIMAC, DISTRITOS DE LURIGANCHO, CHACLACAYO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	449,772,029	RDR	ET	451,447	-	0.0%
126	2662711	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN FUENTE DE AGUA POR GALERIAS FILTRANTES , EN EL VALLE DEL RIO LURIN DISTRITOS DE LURIN, CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	2,632,165	RDR	ET	625,668	-	0.0%
127	2390946	LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	214,308,816	RDR	ET	-	-	0.0%
128	2563006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	351,749,061	RDR	NO ET	10,000	-	0.0%
129	2412780	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBITO DEL ÁREA DE DRENAJE DEL COLECTOR SURCO DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA; DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,742,835,806	RDR	ET	617,380	-	0.0%
130	2389353	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N°1 EN LA ATARJEA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	124,116,086	RDR	ET	-	-	0.0%
131	-----	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
132	2423031	OBRA Y PUESTA EN MARCHA PTAR LA ATARJEA - ESQUEMA CAJAMARQUILLA NIEVERIA Y CERRO CAMOTE FINANCIAMIENTO KWF	749,676,261	RDR / Endeudamiento	ET	234,451,314	42,225,897	18.0%
133	2443481	PLANTA DE HUACHIPA	855,144,749	0	ET	1,701,305	17,134,541	1007.1%
134	2603279	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO LIMA NORTE III	13,977,695	RDR	ET	6,289,703	4,193,136	66.7%
135	2522021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN JUAN - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	736,349,014	RDR	NO ET	807,526	-	0.0%
136	2423031	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS- PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE	73,701,961	RDR	ET	-	-	0.0%
137	2403513	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	35,942,357	RDR	ET	-	-	0.0%
138	239046	LOTE 2- REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE B-1.B-2.B-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE II)	169,653,616	RDR	NO ET	-	973,901	0.0%
139	-----	PAQUETE 2 - AGUA POTABLE (LIMA NORTE I) COMPONENTE 1	6,199,579	RDR	NO ET	-	-	0.0%
140	2395417	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) URBANIZACIÓN COLONIAL, URBANIZACIÓN PARQUE INTERNACIONAL DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	8,926,684	RDR	ET	1,585,598	-	0.0%
141	2395636	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) URBANIZACIÓN EL ÁGUILA, URBANIZACIÓN JARDINES VIRÚ Y URBANIZACIÓN PROCIÓN DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	7,737,290	RDR	ET	1,183,535	-	0.0%
142	2395593	RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) URBANIZACIÓN LA FLORIDA DEL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,730,515	RDR	ET	-	187,196	0.0%
143	2467421	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE LA SUBCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	2,299,426	RDR	ET	-	-	0.0%
144	2561837	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA POLACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE SURCO Y ANEXO DE AYAS DEL DISTRITO DE SURCO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	160,491	RDR	ET	-	-	0.0%
145	2540673	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACION HÍDRICA EN LA MICROCUENCA HUAYCA COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN ANTONIO Y SAN JOSE DE PARAC - DISTRITO DE SAN MATEO - PROVINCIA HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,599,174	RDR	ET	152,633	154,867	101.5%
146	2559578	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA YAMECOTO, COMUNIDADES CAMPESINAS SANTIAGO DE HUAROS Y SAN PEDRO DE HUACOS - DISTRITO DE HUAROS - PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA	133,225	RDR	ET	-	-	0.0%
147	2563146	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA TOLDO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	102,173	RDR	ET	-	-	0.0%
148	2506446	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA INTERCUENCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,527,334	RDR	ET	-	-	0.0%
149	2628816	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN MICROCUENCA ESPERANZA DISTRITO DE SAN BARTOLOME DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	222,987	RDR	ET	-	-	0.0%
150	0	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA LAGUNA MARCACOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI	203,269	RDR	ET	-	-	0.0%
151	2628814	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN MICROCUENCA YANTAC DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	239,742	RDR	ET	-	-	0.0%
152	0	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CURIHUAY Y MARCAPATA, DISTRITO MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN	193,991	RDR	ET	-	-	0.0%

153	0	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN SANGRAR, DISTRITO MARCAPOMACCOCHA, PROVINCIA YAULI, DEP JUNIN	210,000	RDR	ET	-	-	0.0%
154	0	RECUPERACIÓN DE LOS DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CANCHAHUARA, DISTRITO DE LANGA Y CUENCA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	382,120	RDR	ET	-	-	0.0%
155	0	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE BOFEDALES Y HUMEDALES ALTO ANDINOS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MARCA IV DEL SEDAPAL, DISTRITO DE DE HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO; DISTRITO DE SANTA BÁRBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	285,649	RDR	ET	-	-	0.0%
156	0	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA PANCHÁ - COLLATA, DISTRITO MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	150,000	RDR	ET	-	-	0.0%
157	-----	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA CHAMACHA, DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA, PROVINCIA	360,504	RDR	ET	-	-	0.0%
158	0	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA MICROCUENCA HUANCAMACHAY, COMUNIDAD CAMPESINA DE CARHUACAYÁN, DISTRITO DE SANTA BÁRBARA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN	340,573	RDR	NO ET	48,093	48,093	100.0%
159	-----	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN MICROCUENCA CHILCACOCHA DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	302,736	RDR	ET	-	-	0.0%
160	2524799	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA QUIPACANCHA, COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE LARAOS - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,348,946	RDR	ET	-	-	0.0%
161	2512708	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA MICROCUENCA PUCULLO, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN ANTONIO EN LOS DISTRITOS DE SAN MATEO Y CHICLA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	1,263,345	RDR	ET	-	-	0.0%
162	2520031	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DE POCROCOCCHA, COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE LARAOS EN EL DISTRITO DE LARAOS - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,597,077	RDR	ET	-	-	0.0%
163	2523500	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MICROCUENCA DE HUITAMA, COMUNIDAD CAMPESINA SAN PEDRO DE CASTA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA - PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	2,071,600	RDR	ET	-	2,362	0.0%
164	2467419	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTACIÓN DE LA LAGUNA DE LLAMACOCCHA PARA AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN EL CANAL DE MAPANO, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	2,228,654	RDR	ET	-	-	0.0%
165	2467414	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BOFEDALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA CURICOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA	2,199,067	RDR	ET	-	-	0.0%
166	2481601	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA UCANAN, MOQUEGUA Y QUIRUANA, DISTRITO DEL RÍO HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	8,774,013	RDR	ET	-	-	0.0%
167	2516962	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA AYCAGRANGA Y LA INTERCUENCA CASHAPATA, LOCALIDADES DE SAN JUAN DE YURACMAYO Y SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,361,582	RDR	ET	151,273	-	0.0%
168	2508134	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA ARARAC, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,242,734	RDR	ET	-	6,650	0.0%
169	0	RECUPERACIÓN DE LOS SERV ECOSIS HÍDRICOS DE LOS BOSQUES DE JAPANI Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, DISTRI DE CARAMPOMA, PROV DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	202,070	RDR	ET	-	-	0.0%
170	0	RECUPERACIÓN DE LOS SERV ECOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN ZONA DE CHAUCA, DISTRITO DE CALLAHUANCA, PROV DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA	190,000	RDR	ET	-	-	0.0%
171	-----	REHABILITACIÓN DE REDES GSN	136,437,282	RDR	NO ET	7,550,000	21,637,192	286.6%
172	-----	REHABILITACIÓN DE REDES GSC	243,004,205	RDR	NO ET	8,976,815	23,184,520	258.3%
173	-----	REHABILITACIÓN DE REDES GSS	206,184,361	RDR	NO ET	7,193,811	26,478,524	368.1%
174	-----	RPI - CONCESIONES - HUASCACOCCHA	361,528,267	RDR	NO ET	47,398,754	47,384,172	100.0%
175	0	RPI - CONCESIONES - TABOADA	1,956,201,264	RDR	NO ET	115,607,632	115,607,632	100.0%
176	0	RPI - CONCESIONES - PTAR LA CHIRA	552,775,409	RDR	NO ET	32,543,532	32,543,532	100.0%
177	0	RPI - CONCESIONES - PROVISUR	764,043,018	RDR	NO ET	46,848,292	46,848,292	100.0%
178	0	RPI - CONCESIONES - CHILLÓN	200,593,368	RDR	NO ET	33,432,228	33,432,228	100.0%
179	2283443	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	3,897,660	RDR	NO ET	-	5,451	0.0%
180	2400301	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 136 Y 137 - DISTRITO LURIGANCHO	4,812,802	RDR	NO ET	-	1,055,779	0.0%
181	2458123	REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE LIMATAMBO EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8,753,472	RDR	ET	-	94,796	0.0%
182	-----	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL - CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL (CDT - SEDAPAL) - DISTRITO DEL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	38,846,822	RDR	NO ET	-	1,082	0.0%
183	-----	CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	123,078,554	RDR	NO ET	-	196,741	0.0%
184	2386711	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA, UNIFICADA Y ERMITAÑO - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	3,805,695	RDR	NO ET	-	48,672	0.0%
185	2361356	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) COP PLANTA LA ATARJEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	18,207,968	RDR	NO ET	-	8,592	0.0%
186	2031100	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN Y ANEXOS	83,718,460	RDR	NO ET	14,135,535	15,923,007	112.6%

187	----	CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE LIMA Y EL CALLAO	860,985,432	RDR	NO ET	-	403,524	0.0%
188	-----	CAMBIO DE COLECTOR-URB. BENJAMÍN DOIG LOSSIO - LA PERLA	8,774,062	RDR	NO ET	-	169,682	0.0%
189	2031100	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR ELESURPU DISTRITO DE RÍMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	13,380,345	RDR	NO ET	-	67,564	0.0%
190	-----	ADQUISICIÓN PREDIOS	245,744,928	RDR	NO ET	-	167,548	0.0%
191	0	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	514,289,381	RDR	NO ET	25,000,000	13,847,963	55.4%
192	0	NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	45,986,586	RDR	NO ET	6,837,020	-	0.0%
193	-----	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1+1 E INTEGRACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL BACKBONE PRINCIPAL DE SEDAPAL	524,860	RDR	NO ET	-	-	0.0%
194	-----	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	15,315,687	RDR	ET	918,941	-	0.0%
195	2628874	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN FUENTE DE AGUA POR LA EXTRACCION Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIO LURIN DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	69,341,927	RDR	ET	892,417	-	0.0%
196	2656351	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO CHILLÓN DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	449,633,228	RDR	ET	1,598,559	88	0.0%

EPS ILO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2648905	MEJ Y AMPLIAC ALC EN COLECTOR PRIMARIO A	41,200	RDR	NO ET	3,814	-	0.0%
2	2575853	RENOVACION MICROMEDIDORES 3200 CONEX RP	872,890	RDR	NO ET	593,267	239,345	40.3%
3	2565120	CREAC. SERV. AP Y ALC AMPL PROMUVI XII	-	RDR	NO ET	42,953	21,087	49.1%
4	2526147	RENV. RED DIST Y ALC VILLA PORTEÑO	-	RDR	NO ET	32,672	8,321	25.5%
5	2252177	REHAB REDES AGUA ALC CIRCUN CUAJ	6,937,584	DT	NO ET	1,675,243	7,858	0.5%
6	2526138	CONSTRUCC. CERCO PERIMETRICO RESERV R -5	459,894	RDR	NO ET	-	-	0.0%
7	0	ADQUISICION DE EQUIPOS , ACTIVOS COMPLEM	-	RDR	NO ET	14,000	7,267	51.9%
8	2001621	ESTUDIO DE PRE INVERSION	188,207	RDR	NO ET	312,625	77,028	24.6%
9	2493079	REMODELACION RED DISTRIB AGUA GESTION PE	206,689	RDR	NO ET	-	-	0.0%
10	2487430	ET-03-GO REMODELC RED DISTRIBUCION	3,131,917	RDR	ET	2,419,503	-	0.0%
11	2499095	OPTIMIZACION DEL SIST DE MED AGUA RP	309,750	RDR	ET	254,937	2,000	0.8%
12	2526153	REMODEL BCO MEDIDORES APRP	641,639	RDR	ET	581,813	4,661	0.8%
13	2634345	REMOD. CAMARAS DE VALVULAS CALIENTA NEGR	455,262	RDR	ET	-	387,194	0.0%
14	2662798	REM CAMARA DE VALVULAS LIN CONDU ITE PA	816,871	RDR	ET	-	405,249	0.0%
15	2702090	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) EPS ILO S.A. PARA 7,048 CONEXIONES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1,390,668	RDR	NO ET	-	10,529	0.0%
16	2487499	F-01-GO RENOVACION LINEA ZED ILO	377,996	DT	NO ET	-	-	0.0%
17	2487430	REMODELACION RED DIST AGUA POTAB	349,389	DT	NO ET	1,544,911	16,000	1.0%
18	2648905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN COLECTOR PRIMARIO EN LA AV. DE INGRESO A CIUDAD DE ILO , DESDE LA DESCARGA DE LA URB. MAGISTERIO DE LA PAMPA INALAMBRICA HASTA EL BY PASS ALTO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA	734,885	RDR	ET	-	750,295	0.0%
19	2514306	RENOVAC 1920 MEDIDORES RP	80,000	RDR	ET	333,932	4,500	1.3%
20	2445303	REPOSIC MICROMED TRANSF F-11	576,009	DT	NO ET	-	-	0.0%
21	2565120	CREACION SERV AP Y ALC AMPL PROMUVI XII	8,305,153	DT	NO ET	4,940,051	1,435,518	29.1%
22	2189368	REHAB Y MEJ DE REDES AP Y ALC CONEX DOMI	3,539,242	DT	NO ET	366,948	-	0.0%
23	2526147	RENV. RED DIST. Y ALC VILLA PORTEÑO	1,634,696	DT	NO ET	1,362,673	5,408	0.4%
24	2514378	REMOD INF CATASTRO TECNICO CRP	1,288,595	RDR	ET	1,000,722	7,000	0.7%
25	2514102	RENOV SIST INFOR CATASTRO COMERC CRP	17,660	RDR	NO ET	69,429	-	0.0%
26	2525256	CONSTRUCCION ALMACEN EN LA PTAP N° 2 DE	93,081	RDR	NO ET	93,424	-	0.0%
27	2314553	MEJ AGUA Y ALCANT 7 DE MAYO	15,000	RDR	NO ET	15,000	-	0.0%
28	2276837	INSTAL REDES AGUA POTABLE PROMUVI I	12,138	RDR	NO ET	39,044	-	0.0%
29	2325237	SERVIC. BASICOS AGUA ALCANT PROMU XI	-	RDR	NO ET	2,089	-	0.0%
30	0	MEJ SERV, AP Y ALC LUIS VARGARCEL ENACE	-	RDR	NO ET	-	40,060	0.0%
31	2276837	COM TRANSF AP Y ALC PRO I ALG CONV 31-20	57,150	DT	NO ET	348,426	-	0.0%
32	2325237	CREAC SERV AP ALC PROMUVI XI MVCS	-	DT	NO ET	210,601	-	0.0%
33	2326388	MEJ RED AGUA ALC INTEGR LAT GARD SIGXXI	654,394	DT	NO ET	-	-	0.0%
34	2436439	SS AGUA ALCANT PROMUVI XII	2,221,251	DT	NO ET	-	-	0.0%
35	2314553	MEJOR.SERV.AGUA POT. ALCANTAR. ASOC 7 MA	1,757,304	DT	NO ET	1,230,230	-	0.0%

36	2526147	RENV. DE RED DIST. Y RED ALC. ASOC VILLA	1,634,696	DT	NO ET	-	-	0.0%
37	2589176	REPAR LINEA CONDOC SECTOR ALTO ILO CHALA	-	DT	NO ET	-	2,074,845	0.0%

SEDALIB

Nro	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	-	RDR	ET	6,316,256	-	0.0%
2	2001621- 2288049	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LIBERACIÓN SOCIAL , DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	34,916	34,915	100.0%
3	2001621- 2515946	MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. MARÍA EGUREN TRAMO ENTRE LA AV. CÉSAR VALLEJO URB. PALERMO Y CARRETERA VÍA DE EVITAMIENTO EN LA URB. COVICONT - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	34,916	34,915	100.0%
4	2001621	ESTUDIO HIDROQUÍMICO E ISOTOPOS DEL ACUIFERO MOCHE	-	RDR	ET	28,913	28,912	100.0%
5	2001621- 2405337	MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA MICAELA BASTIDAS TRAMO ENTRE CALLE MANCO INCA Y MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD	-	RDR	ET	34,780	34,780	100.0%
6	2001621- 2509231	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. VISTA BELLA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	13,876	13,875	100.0%
7	2001621	ESTUDIOS E IMPLEMENTACION DE LOS PERIMETROS DE PROTECCION DE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA ACUIFERO MOCHE	-	RDR	ET	494	493	99.8%
8	2001621	ESTUDIO PARA LA CONSERVACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS ACUIFEROS MOCHE	-	RDR	ET	52,543	52,543	100.0%
9	2001621	ESTUDIO PARA LA CONSERVACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS ACUIFEROS JEQUETEPEQUE	-	RDR	ET	61,000	61,000	100.0%
10	2001621	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR CRUCE DEL GALLO - DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	11,016	11,016	100.0%
11	2001621	ESTUDIO PARA LA CONSERVACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS ACUIFEROS CHICAMA	-	RDR	ET	406,751	406,750	100.0%
12	2001621	ESTUDIOS E IMPLEMENTACION DE LOS PERIMETROS DE PROTECCION DE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA ACUIFERO CHICAMA	-	RDR	ET	8,123	8,123	100.0%
13	2001621	ESTUDIOS E IMPLEMENTACION DE LOS PERIMETROS DE PROTECCION DE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA ACUIFERO JEQUETEPEQUE	-	RDR	ET	88,007	88,007	100.0%
14	2001621	ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS ACUIFEROS MOCHE, CHICAMA Y JEQUETEPEQUE	-	RDR	ET	40,787	40,786	100.0%
15	2001621	ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS ACUIFEROS MOCHE, CHICAMA Y JEQUETEPEQUE	-	RDR	ET	17,477	17,477	100.0%
16	2001621	ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS ACUIFEROS MOCHE, CHICAMA Y JEQUETEPEQUE	-	RDR	ET	3,492	3,492	100.0%
17	2001621	MODELAMIENTO NUMERICO DE LOS ACUIFEROS MOCHE	-	RDR	ET	39,500	39,500	100.0%
18	2001621- 2686453	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE PACAMASYO URB. ARANJUEZ DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	30,700	30,700	100.0%
19	2001621- 2647357	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO CÍVICO DE TRUJILLO - DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	589,735	589,735	100.0%
20	2001621- 2505166	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL EMISOR NICOLAS DE PIEROLA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	13,964	13,963	100.0%
21	2001621- 2659696	CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A PARA LA DIVISIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y CUENCAS HIDROGRAFICAS- DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	ET	7,866	7,865	100.0%
22	2001621- 2324961	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO, LINEAS DE ADUCCIÓN PARA MOCHE Y SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	57,306	57,305	100.0%
23	2001621- 2667337	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO - PARA LA AV. SANTA CUADRAS 15,16,17,18,19,20,21 - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	13,980	13,980	100.0%
24	2001621- 2686860	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO - EN LA CALLE COSTA RICA SECTOR SANTA VERONICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	27,119	27,119	100.0%
25	2001621	MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACIONES SANTO DOMINGUITO Y EL BOSQUE - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	ET	60,600	60,600	100.0%
26	2001621	AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL CONTROL DE CALIDAD E IMPLMETACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN AUTOMÁTICA - SEDALIB S.A.	-	RDR	ET	33,080	33,080	100.0%
27	2115955	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	3,221,815	3,221,814	100.0%
28	2649473	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS CALLES SOCRATES, PJE ENGELS, PJE KANT, PSJE VOLTAIRE, PSJE PLATON Y AV. BLAS PASCAL DE LA URB. LA NORIA - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	592,174	592,174	100.0%
29	2659433	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA URB. SAN ELOY - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	1,381,988	1,381,985	100.0%
30	2667555	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE SAN AGUSTIN URB. CENTRO CIVICO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	5,625	5,625	100.0%

Nro	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
31	2659696	CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A PARA LA DIVISION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y CUENCAS HIDROGRAFICAS- DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	ET	163,578	163,577	100.0%
32	2547382	RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.-PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACIÓN AV. CESAR VALLEJO-TRAMO AV. FEDERICO VILLARREAL Y CANAL MOCHICA- DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	42,499	42,498	100.0%
33	2503804	AMPLIACION DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	174,144	174,142	100.0%
34	2497051	RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A.- SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA CALLE MICAELA BASTIDAS CDRAS. 21.22 Y 23, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	1,044	1,044	100.0%
35	2659111	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO - EN LA CALLE CARLOS BACA FLOR CDRAS.2,3,4,5 -URB SANTO DOMINGUITO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	1,285,597	1,202,697	93.6%
36	2659028	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO - DE LA CALLE JOSÉ BEJAR CUADRA 4, 5, 6, 7 - DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	1,452,288	1,452,288	100.0%
37	2574528	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS; EN EL(LA) EPS SEDALIB S.A- PARA LA MEJORA DEL SISTEMA HIDRÁULICO, MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE LA PTAR COVICORTI, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	109,830	109,831	100.0%
38	2513555	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA QUINTA SANTA CRUZ, URB. CHICAGO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	630,484	630,483	100.0%
39	2693489	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. ESPAÑA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	2,094,951	2,094,949	100.0%
40	2574429	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) PARQUE DE MEDIDORES DE LA EPS SEDALIB S.A Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE MICROMEDICION- PROVINCIAS DE TRUJILLO, ASCOPE, CHEPEN Y EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	5,195,357	5,195,357	100.0%
41	2324961	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANTARO CUADRAS 5 Y 6, TRAMO ENTRE AVENIDAS SALVADOR LARA Y MIRAFLORES DE LA URB. EL MOLINO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	17,125	17,125	100.0%
42	2329112	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVES DE BATERIA DE POZOS EN LOS DISTRITOS LA ESPERANZA FLORENCIA DE MORA Y EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	2,148,810	-	0.0%
43	2546443	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR CRUCE DEL GALLO - DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	5,909,175	-	0.0%
44	2331655	INSTALACIÓN INTERCEPTOR PUMACAHUA -EL PORVENIR-TRUJILLO	-	RDR	ET	4,886,129	-	0.0%
45	2342206	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL C.P.M EL MILAGRO- DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	200,100	-	0.0%
46	2405337	MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA MICAELA BASTIDAS TRAMO ENTRE CALLE MANCO INCA Y MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD	-	RDR	ET	396,674	-	0.0%
47	2691946	REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLES JOSE CRESPO, MATEO REMIGIO, HERMANOS ANGULO, MANO INCA, PORTUGAL, JR ANGELES, ABANCAY, CAPIRONA, SANTA CLARA, SAN JOSE, DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	5,317,321	5,317,319	100.0%
48	2505166	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL EMISOR NICOLAS DE PIEROLA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	30,189	-	0.0%
49	2340579	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR VA VILLA EL SOL Y EL SECTOR VB VILLA SAN JOSE-CENTRO POBLADO EL MILAGRO-DISTRITO DE HUANCHACO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	-	RDR	NO ET	9,100	9,100	100.0%
50	2376381	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION ARANJUEZ- DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	12,100	12,100	100.0%
51	2475709	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL - DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	NO ET	21,705	21,704	100.0%
52	2550734	ADQUISICION DE EQUIPO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO, CENTRO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL(LA) EPS SEDALIB SA- EQUIP. Y HERRAM.PARA SIST.DE CONTROL DE TRAB.DE CAMPO,MONITOREO,GESTION,COMPUTO Y OFICINA.PARA BRINDAR EL SERV.DE MONITOREO Y GEST. DE USO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN ACUIFEROS DE LAS PROVINCIAS DE ASCOPE,CHEPEN Y TRUJILLO METROPOLITANO- DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	-	RDR	ET	16,526	16,526	100.0%
53	2514443	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN EL RECREO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	-	RDR	ET	6,433,198	37,644	0.6%

EPSEL

Nro	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
-----	----------	----------	-------	--------	---------------------------	-----	-----	---

1	2065339	MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO-LAMBAYEQUE	17,626	RDR	NO ET	-	-	0.0%
2	2535401	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DESDE LA CALLE PABLO OLAVIDE HASTA LA AV. CHINCHAYSUYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	2,223,852	DT	NO ET	-	-	0.0%
3	2535401	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DESDE LA CALLE PABLO OLAVIDE HASTA LA AV. CHINCHAYSUYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
4	2531904	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	10,254,008	RDR	NO ET	-	-	0.0%
5	2531904	RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	RDR	NO ET	6,639,017	2,493,231	37.6%
6	2409970	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) ENTIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. VILLA HERMOSA, JAVIER CASTRO, MILAGRO DE DIOS Y LA EXPLANADA DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	5,414,991	DT	NO ET	-	-	0.0%
7	2409970	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) ENTIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. VILLA HERMOSA, JAVIER CASTRO, MILAGRO DE DIOS Y LA EXPLANADA DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
8	2106779	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMÁN, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA UNIÓN, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO	64,335,639	DT	NO ET	-	-	0.0%
9	2106779	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMÁN, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA UNIÓN, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO	2,529	RDR	NO ET	-	-	0.0%
10	2518752	REPARACION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) RESERVOIRIO SUR EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,279,277	RDR	NO ET	-	-	0.0%
11	2239715	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LOS PUEBLOS JOVENES SR DE LA MISERICORDIA, AMPLIACION SANTA LUCIA, EL NAZARENO Y NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE JLO, PROVINCIA DE CHICLAYO	3,573,989	RDR	NO ET	-	-	0.0%
12	2502698	EJECUCION DE LA OBRA REOVACION IOARR RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EPSL S.A. CALLE LA VICTORIA CUAFDRA 4, LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2502698	25,711	RDR	NO ET	-	-	0.0%
13	2502698	EJECUCION DE LA OBRA REOVACION IOARR RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EPSL S.A. CALLE LA VICTORIA CUAFDRA 4, LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2502698	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
14	2525825	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. JOSE QUIÑONES CUADRA 4,5,6,7 Y 8 Y AV ORIENTE	2,574,989	DT	NO ET	391,800	332,033	84.7%
15	2252017	EJECUCIÓN DE LA OBRA -CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.J SANTA ELENA DISTRITO DE CHICLAYO-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2252017	2,963,891	DT	NO ET	2,137,970	1,551,314	72.6%
16	2621140	SUPERVISION - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, EN EPSL SA BORO II, DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	7,486,768	RDR	NO ET	132,819	128,489	96.7%
17	2594941	REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPSL S.A. DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,884,815	DT	NO ET	1,884,815	978,649	51.9%
18	2594941	REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPSL S.A. DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	1,175,007	RDR	NO ET	-	-	0.0%
19	2592152	EJECUCION DE LA IOAR DE EMERGENCIA "REPARACIÓN DE RED ALCANTARILLADO, LA LOCALIDAD E CHICLAYO, JOSE LEONARDO ORTIZ Y LA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2592152	44,931,184	DT	NO ET	44,931,184	12,368,823	27.5%
20	2674984	IOARR DE EMERGENCIA "REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL EMISOR NORTE CENTRO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2674984	3,396,821	DT	NO ET	3,396,821	2,462,039	72.5%

SEDAPAR

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2301830	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA - SEDAPAR S.A.	50,015,071	RDR	ET	1,981,622	392,194	19.8%
2	2301830	REPOSICIÓN DE MACROMEDIDORES PARA EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS	50,015,071	RDR	ET	200,000	-	0.0%
3	2688889	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CURVA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	61,950	RDR	ET	6,357	-	0.0%
4	2687167	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE COTAHUASI, SEGUNDA FASE DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA	70,277	RDR	ET	7,376	-	0.0%
5	2688891	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ARENAL, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	78,407	RDR	ET	8,370	-	0.0%
6	2689006	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE YAUCA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	83,364	RDR	ET	8,977	-	0.0%
7	2687416	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUQUIBAMBA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA	101,606	RDR	ET	11,209	4,800	42.8%
8	2688996	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CHALA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	174,556	RDR	ET	20,138	-	0.0%

9	2673076	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE LA JOYA, SEGUNDA FASE DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	124,210	RDR	ET	13,976	10,381	74.3%
10	2689003	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE ATICO, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	209,271	RDR	ET	24,385	-	0.0%
11	2687331	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIVAY, SEGUNDA FASE DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	142,649	RDR	ET	16,232	11,820	72.8%
12	2688856	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJIA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	177,348	RDR	ET	20,478	6,424	31.4%
13	2688995	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CARAVELI, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	162,676	RDR	ET	18,683	-	0.0%
14	2687418	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE MATARANI, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	169,388	RDR	ET	19,508	5,500	28.2%
15	2687182	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE APLAO, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	247,936	RDR	ET	29,119	17,797	61.1%
16	2688886	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE COCACHACRA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	251,902	RDR	ET	29,601	-	0.0%
17	2688892	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNTA DE BOMBON, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	253,290	RDR	ET	29,771	8,778	29.5%
18	2689014	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CAMANA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,377,962	RDR	ET	167,417	22,500	13.4%
19	2687433	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE MOLLENDI, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE MOLLENDI, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,190,559	RDR	ET	144,464	7,898	5.5%
20	2687445	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEDREGAL, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	842,776	RDR	ET	101,906	26,060	25.6%
21	2555627	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA MICROMEDICION DE AREQUIPA METROPOLITANA, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	38,641,129	RDR	ET	3,785,455	2,631,823	69.5%
22	2627864	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA URB. LARA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	11,816,733	RDR	ET	465,000	-	0.0%
23	2553125	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACION; EN EL(LA) SEDE CENTRAL SEDAPAR S.A EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	11,670,192	RDR	ET	7,057	7,056	100.0%
24	2563723	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - RESERVOIRIO N-8 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CERCO PERIMETRICO DISTRITO DE CHIGUATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4,148,004	RDR	ET	1,000,000	30,331	3.0%
25	2561956	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COCACHACRA (R-01), DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2,611,936	RDR	ET	1,500,000	66,120	4.4%
26	2628520	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COOPERATIVA VIVIENDA CRISTO REY DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	5,454,334	RDR	ET	500,000	-	0.0%
27	2598969	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO AV. SALAVERRY A EMPALME COLECTOR AV.VENEZUELA (COLECTOR MANZANITOS) EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,524,501	RDR	ET	467,670	-	0.0%
28	2539888	AMPLIACION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PARALELOS A LA RIBERA DEL RIO CHILI - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5,988,180	RDR	ET	100,000	-	0.0%
29	2375720	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE CHARACATO, SABANDIA Y SOCABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	24,633,262	RDR	ET	827,485	94,359	11.4%
30	2513069	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO ARRAYANES EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA Y SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4,859,356	RDR	ET	620,943	36,785	5.9%
31	2587617	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE RESERVOIRIO R-1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6,089,657	RDR	ET	260,000	-	0.0%
32	2598484	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN RESERVOIRIO R11 DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	14,155,899	RDR	ET	567,457	-	0.0%
33	2130621	CONSTRUCCION DEL EMISOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DENOMINADO COMO NORTE DE AREQUIPA METROPOLITANA	73,229,612	RDR	NO ET	900,000	477,858	53.1%
34	2375877	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE MEJIA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD MEJIA, DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	166,097	RDR	ET	75,370	-	0.0%
35	2375777	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHUQUIBAMBA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA	153,321	RDR	ET	87,951	-	0.0%
36	2376040	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CARAVELI, EN LA LOCALIDAD CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	157,402	RDR	ET	145,150	-	0.0%
37	2565763	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) BOCATOMA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,147,713	RDR	ET	15,133	-	0.0%
38	2563520	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA URB. SANTA RITA DE CASIA Y CALLE CAPITAN NOVOA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	3,946,501	RDR	ET	1,500,000	-	0.0%
39	2559683	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) CDRA. 1 Y 2 DE CALLE CARLOS LLOSA, CDRA. 5 DE CALLE RIVERO, CDRA. 3 DE CALLE FILTRO DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	378,200	RDR	ET	500,000	13,898	2.8%

40	2593364	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION JUVENTUD FERROVIARIA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	3,801,868	RDR	ET	500,000	-	0.0%
41	2588721	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) URBANIZACION LAS PALMERAS DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2,427,099	RDR	ET	500,000	-	0.0%
42	2565642	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO DE BZC4 EXISTENTE(G.R.A.)- EMPALME A BUZON BH-01 (COLECTOR HUARANGUILLO), DISTRITO DE SACHACA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	3,353,022	RDR	ET	2,041,955	-	0.0%
43	2574099	RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) TRAMO DESDE LA CALLE PUCALLPA HASTA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2,619,972	RDR	ET	2,275,101	1,909,890	83.9%
44	2549661	CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) MZ F DE LA URB BUENA VISTA AV ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	512,579	RDR	ET	404,630	376,681	93.1%
45	2552493	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SERVICIO AGUA POTABLE AV INDEPENDENCIA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2,472,766	RDR	ET	500,000	-	0.0%
46	2557870	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO URB. LEON XIII , MZ "L" Y "M", DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	340,257	RDR	ET	79,307	55,097	69.5%
47	2557484	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CASETA Y CASETA; EN EL(LA) POZO SAN ANDRÉS II Y CRUZ BEJARANO DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	611,646	RDR	ET	100,000	-	0.0%
48	2547515	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVOIRIO R-2 SECTOR SANTA LUZMILA DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	426,122	RDR	ET	20,000	15,529	77.6%
49	2375807	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE MATARANI DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD ISLAY (MATARANI), DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	405,464	RDR	ET	128,504	-	0.0%
50	2375914	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE YAUCA, EN LA LOCALIDAD YAUCA, DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	199,793	RDR	ET	72,448	854	1.2%
51	2375902	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PUNTA DE BOMBON, EN LA LOCALIDAD PUNTA DE BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	464,154	RDR	ET	111,640	-	0.0%
52	2375792	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE MOLLEND DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD MOLLEND, DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	447,087	RDR	ET	118,842	-	0.0%
53	2375883	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CURVA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD LA CURVA, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	236,171	RDR	ET	70,917	-	0.0%
54	2375886	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE EL ARENAL DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	239,115	RDR	ET	125,976	-	0.0%
55	2375896	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE COCACHACRA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD COCACHACRA, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	537,398	RDR	ET	124,340	285	0.2%
56	2375769	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE COTAHUASI DE SEDAPAR S.A. EN LA LOCALIDAD COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA	218,157	RDR	ET	84,186	2,015	2.4%
57	2375743	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHIVAY DE SEDAPAR S.A. , EN LA LOCALIDAD CHIVAY, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	468,582	RDR	ET	95,739	-	0.0%
58	2375918	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE APLAO DE SEDAPAR S.A. , EN LA LOCALIDAD APLAO, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	325,251	RDR	ET	109,945	-	0.0%
59	2375909	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE ATICO DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	517,821	RDR	ET	162,098	-	0.0%
60	2375725	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHALA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	429,069	RDR	ET	82,878	-	0.0%
61	2375738	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA JOYA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD LA JOYA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	314,172	RDR	ET	79,429	-	0.0%
62	2375755	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE EL PEDREGAL DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,016,793	RDR	ET	113,984	-	0.0%
63	2078454	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA	80,218,798	RDR	ET	220,425	220,334	100.0%
64	2479971	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE SOCABAYA, SABANDIA Y CHARACATO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	145,882,693	RDR	ET	14,771,587	15,500,365	104.9%
65	2311022	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIMAVERA Y AVENIDA CARACAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	649,832	RDR	ET	500,000	-	0.0%
66	2380291	CREACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES EN LA AV. LOS INCAS - TRAMO NORTE – AREQUIPA	1,777,107	RDR	ET	500,000	1,907	0.4%
67	2553336	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL(LA) RESERVOIRIO R-2 C.P. SAN ISIDRO DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	711,533	RDR	ET	20,000	-	0.0%
68	2378764	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE DE AREQUIPA METROPOLITANA, PROVINCIA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,452,081	RDR	ET	500,000	436	0.1%

69	2455634	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES (EN LA ZONA AV. VENEZUELA, AV. LA MARINA Y AV. ALFONSO UGARTE) DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE AREQUIPA METROPOLITANA EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA, JACOBO HUNTER Y SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	47,195,895	RDR	ET	428,323	-	0.0%
70	2466109	CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) RESERVOIRIO N-26 DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	3,058,557	RDR	ET	1,153,700	-	0.0%
71	2545911	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL(LA) RESERVOIRIO R-1 DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,529,437	RDR	ET	60,000	-	0.0%
72	2461180	RECUPERACION AGUA POTABLE RESERVOIRIO R-10 MARIANO MELGAR DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6,229,665	RDR	ET	1,500,000	24,347	1.6%
73	2545959	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA; EN EL(LA) RESERVOIRIO R-1 DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	779,453	RDR	ET	50,000	-	0.0%
74	2545876	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO AV. LA MARINA NORTE-PUENTE GRAU (COLECTOR INDEPENDENCIA) EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2,342,132	RDR	ET	450,000	-	0.0%
75	2375905	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CAMANA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CAMANA, DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	773,389	RDR	ET	88,926	-	0.0%
76	2382190	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA	131,373,740	RDR	ET	21,021,677	480,954	2.3%
77	2638310	ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE (MEDIDORES DE PRESION) DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	8,983,170	RDR	ET	136,155	-	0.0%
78	2546041	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVOIRIO N-9 ASENTAMIENTO HUMANO CERRITO VERDE DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	569,766	RDR	ET	100,000	-	0.0%
79	2628999	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS URBANIZACIONES JUAN EL BUENO, FERROVIARIOS Y OBANDO DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	9,436,120	RDR	ET	-	-	0.0%
80	2331087	CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVOIRIO N-31 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA	132,823,709	RDR	ET	45,000	-	0.0%
81	2331093	CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVOIRIO N-39 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA	123,777,158	RDR	ET	45,000	-	0.0%
82	2162203	AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA	19,560,013	RDR	ET	50,000	-	0.0%
83	2622006	CONSTRUCCION DE CÁMARA DE CONTROL; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2,040,540	RDR	ET	150,000	-	0.0%
84	2663012	RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO EL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	5,104,395	RDR	ET	150,000	-	0.0%
85	2459869	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL LA BEDOYA EN LOS DISTRITOS DE CHIGUATA Y PAUCARPATA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	35,215,899	RDR	ET	100,000	34,076	34.1%
86	2378462	CREACIÓN DE LOS CERCOS PERIMÉTRICOS DE LOS RESERVOIRIOS R1, R2, R3 Y OFICINA ADMINISTRATIVA, MEJORAMIENTO DE CASETA Y SISTEMA DE CLORACIÓN EN R2 SEDAPAR, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA	794,892	RDR	ET	4,820	4,810	99.8%
87	2161906	MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA	7,261,377	RDR	NO ET	8,876	8,876	100.0%
88	2089594	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA	401,355,156	RDR	ET	1,222,000	-	0.0%
89	2697364	CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO MIGUEL DE LA CUBA IBARRA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,576,556	RDR	ET	82,543	-	0.0%
90	2460998	RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAMANA DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	12,005,360	RDR	ET	-	-	0.0%
91	2323733	CREACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ZONA SUR, DISTRITO DE MOLLENDI, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA	890,906	RDR	ET	242,000	143,323	59.2%
92	2328027	CREACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ZONA NORTE, DISTRITO Y PROVINCIA CAMANA, REGION AREQUIPA	981,784	RDR	ET	265,116	109,345	41.2%
93	2328311	CREACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ZONA CENTRO, DISTRITO DE MAJES, POVINIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN AREQUIPA	910,575	RDR	ET	246,600	164,014	66.5%
94	2301830	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA - SEDAPAR S.A. - CONTROL OPERACIONAL DE AREQUIPA	50,015,071	RDR	ET	340,250	37,342	11.0%
95	2301830	REPOSICIÓN DE MACROMEDIDORES PARA EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS	50,015,071	RDR	ET	-	-	0.0%
96	2688889	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CURVA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	61,950	RDR	ET	41,766	25,978	62.2%
97	2687167	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE COTAHUASI, SEGUNDA FASE DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA	70,277	RDR	ET	48,461	30,142	62.2%
98	2688891	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ARENAL, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	78,407	RDR	ET	54,998	34,208	62.2%
99	2689006	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE YAUCA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	83,364	RDR	ET	58,983	-	0.0%
100	2687416	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUQUIBAMBA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA	101,606	RDR	ET	73,649	-	0.0%
101	2688996	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CHALA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	174,556	RDR	ET	132,313	-	0.0%

102	2673076	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE LA JOYA, SEGUNDA FASE DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	124,210	RDR	ET	91,822	57,112	62.2%
103	2689003	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE ATICO, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	209,271	RDR	ET	160,210	-	0.0%
104	2687331	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIVAY, SEGUNDA FASE DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	142,649	RDR	ET	106,647	66,333	62.2%
105	2688856	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJIA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	177,348	RDR	ET	134,545	83,685	62.2%
106	2688995	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CARAVELI, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	162,676	RDR	ET	122,748	-	0.0%
107	2687418	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE MATARANI, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	169,388	RDR	ET	128,168	79,719	62.2%
108	2687182	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE APLAO, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	247,936	RDR	ET	191,296	-	0.0%
109	2688886	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE COCACHACRA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	251,902	RDR	ET	194,483	120,966	62.2%
110	2688892	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNTA DE BOMBON, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	253,290	RDR	ET	195,600	121,660	62.2%
111	2689014	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CAMANA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,377,962	RDR	ET	1,099,949	-	0.0%
112	2687433	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE MOLLENDI, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE MOLLENDI, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,190,559	RDR	ET	949,145	590,354	62.2%
113	2687445	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEDREGAL, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	842,776	RDR	ET	669,534	416,441	62.2%
114	2555627	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA MICROMEDICION DE AREQUIPA METROPOLITANA, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	38,641,129	RDR	ET	13,832,510	6,549,686	47.3%
115	2655968	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO MIGUEL DE LA CUBA IBARRA EN EL CENTRO POBLADO AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA. OPTIMIZACIÓN DEL LABORATORIO FÍSICO QUÍMICO DE AGUA POTABLE DEL DPTO. DE CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA	3,262,400	RDR	ET	2,795,142	451,719	16.2%
116	2655968	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO MIGUEL DE LA CUBA IBARRA EN EL CENTRO POBLADO AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA OPTIMIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA FRECUENCIA MÍNIMA DE MUESTREO	3,262,400	RDR	ET	347,259	120,724	34.8%
117	2598969	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO AV. SALAVERRY A EMPALME COLECTOR AV.VENEZUELA (COLECTOR MANZANITOS) EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,524,501	RDR	ET	32,330	-	0.0%
118	2375720	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE CHARACATO, SABANDIA Y SOCABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	24,633,262	RDR	ET	172,515	-	0.0%
119	2162203	AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA	19,560,013	RDR	ET	98,998	-	0.0%
120	2666811	ADQUISICION DE CAMIONETA, CAMION CISTERNA, MOTOCICLETA Y VOLQUETE; EN EL(LA) EPS SEDAPAR SA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,327,321	RDR	ET	1,078,041	-	0.0%
121	2375777	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHUQUIBAMBA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA	153,321	RDR	ET	82,986	-	0.0%
122	2375755	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE EL PEDREGAL DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,016,793	RDR	ET	326,189	-	0.0%
123	2375918	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE APLAO DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD APLAO, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	325,251	RDR	ET	169,404	-	0.0%
124	2375769	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE COTAHUASI DE SEDAPAR S.A. EN LA LOCALIDAD COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA	218,157	RDR	ET	74,998	6,228	8.3%
125	2375807	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE MATARANI DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD ISLAY (MATARANI), DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	405,464	RDR	ET	211,578	-	0.0%
126	2376040	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CARAVELI, EN LA LOCALIDAD CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	157,402	RDR	ET	95,055	-	0.0%
127	2375877	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE MEJIA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD MEJIA, DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	166,097	RDR	ET	145,543	-	0.0%
128	2375743	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHIVAY DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CHIVAY, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	468,582	RDR	ET	196,392	-	0.0%
129	2375902	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PUNTA DE BOMBON, EN LA LOCALIDAD PUNTA DE BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	464,154	RDR	ET	188,634	-	0.0%
130	2375914	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE YAUCA, EN LA LOCALIDAD YAUCA, DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	199,793	RDR	ET	98,796	-	0.0%

131	2375725	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHALA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	429,069	RDR	ET	252,025	-	0.0%
132	2375909	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE ATICO DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	517,821	RDR	ET	414,003	-	0.0%
133	2375896	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE COCACHACRA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD COCACHACRA, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	537,398	RDR	ET	269,868	-	0.0%
134	2375792	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE MOLLENDO DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	447,087	RDR	ET	269,027	-	0.0%
135	2375905	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CAMANA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CAMANA, DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	773,389	RDR	ET	280,212	-	0.0%
136	2375886	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE EL ARENAL DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	239,115	RDR	ET	77,129	-	0.0%
137	2375883	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CURVA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD LA CURVA, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	236,171	RDR	ET	77,129	-	0.0%
138	2375738	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA JOYA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD LA JOYA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	314,172	RDR	ET	118,377	-	0.0%
139	2325707	CREACION DEL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y EFLUENTES INDUSTRIALES EPS SEDAPAR SECTOR CHILPINA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA	3,759,555	RDR	NO ET	100,000	-	0.0%
140	2320717	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS EN LA EPS SEDAPAR, MULTIPROVINCIAL, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA	20,866,626	RDR	ET	444,404	-	0.0%
141	2001621	RENOVACIÓN DEL RESERVORIO R-13	-	RDR	ET	42,800	-	0.0%
142	2001621	RENOVACIÓN DEL RESERVORIO R-12	-	RDR	ET	42,800	-	0.0%
143	2001621	CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACEN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS - PLANOTECA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE AUDITORES EXTERNOS, SALA DE TRABAJOS MÚLTIPLES, PROMOCIÓN Y VENTAS, LACTARIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA EPS SEDAPAR S.A.	-	RDR	ET	50,000	-	0.0%
144	2001621	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEL SISTEMA OPERACIONAL DE LA EPS. SEDAPAR S.A	-	RDR	ET	50,000	-	0.0%
145	2001621	RENOVACIÓN DEL RESERVORIO N-10	-	RDR	ET	42,800	-	0.0%
146	2001621	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ÁTICO, DISTRITO DE ÁTICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA	-	RDR	ET	350,000	210,446	60.1%
147	2001621	RENOVACIÓN DE REDES EN LAS LOCALIDADES DE ZONAL CENTRO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
148	2001621	OBRAS COMPLEMENTARIAS: AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, DEPARTAMENTO AREQUIPA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
149	2001621	REHABILITACIÓN DE GALERÍAS FILTRANTES EN LA LOCALIDAD DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, DEPARTAMENTO AREQUIPA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
150	2001621	REHABILITACIÓN DE LAS PTAR DE LA LOCALIDAD DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, DEPARTAMENTO AREQUIPA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
151	2001621	DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS Y RESIDUOS PARA LAVADO DE FILTROS Y UNIDADES HIDRÁULICAS DE PTAP MEJÍA	-	RDR	ET	42,800	-	0.0%
152	2001621	SECTORIZACIÓN POR CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR	-	RDR	ET	40,000	-	0.0%
153	2001621	CREACIÓN DE CERCO PERIMETRICO R-1, R-2, LAGUNAS OXIDACIÓN MAS POZOS SEPTICOS	-	RDR	ET	40,000	-	0.0%
154	2001621	COLECTOR AVENIDA TRINIDAD MORÁN, AV. JOSE ABELARDO QUIÑONEZ Y VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE	-	RDR	ET	45,000	26,460	58.8%
155	2001621	COLECTOR AV. BOLOGNESI (HOSPITAL POLICIA) - AV. CAYMA (PASAJE. SANTA CRUZ)	-	RDR	ET	45,000	21,600	48.0%
156	2001621	RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.T. YANAHUARA	-	RDR	ET	45,000	-	0.0%
157	2001621	REDES DE ALCANTARILLADO PARTE BAJA DISTRITO DE MIRAFLORES	-	RDR	ET	45,000	-	0.0%
158	2001621	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR RENOVACIÓN DE PTAR EN EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL Y LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	-	RDR	ET	100,000	-	0.0%
159	2001621	RENOVACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE LA URB. ADEPA - JLBYSR	-	RDR	ET	50,000	12,402	24.8%
160	2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	-	RDR	ET	-	-	0.0%
161	2001621	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEPENDIENTES DE LA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
162	2001621	CAMBIO DE TRAZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AV. GOYENECHÉ (CALLE PUNO - MANUEL M. NAJAR)	-	RDR	ET	-	-	0.0%
163	2001621	PROTECCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA GALERÍA FILTRANTE EN EL SECTOR GRANADILLO Y DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ÁTICO	-	RDR	ET	-	-	0.0%

SEDACUSCO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	-	RDR	NO ET	174,903	174,904	100.0%
2	2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	-	RDR	NO ET	81,163	81,162	100.0%
3	2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION MRSE	-	RDR	ET	33,051	-	0.0%

4	2579181	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE PERIODO 2023-2024 DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	-	RDR	ET	737,917	737,917	100.0%
5	2335807	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE SECSENCALLA Y PUCA PUCA, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO	-	RDR	NO ET	2,971,642	2,693,982	90.7%
6	2391875	CREACIÓN DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO-PROVINCIA URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO	-	RDR	ET	6,153,743	5,935,355	96.5%
7	2391875	CREACIÓN DE LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA PIURAY DEL DISTRITO DE CHINCHERO-PROVINCIA URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO	-	DT	NO ET	686,793	580,508	84.5%
8	2448239	MEJORAMIENTO LINEA DE INTERCONEXION SISTEMA VILCANOTA TRAMO PUNTO B, RESERVOIRIO CORIPATA EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO	-	RDR	ET	6,915,345	6,846,476	99.0%
9	2494983	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUEROHUASI DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-PROVINCIA DE URUBAMBA-DEPARTAMENTO DEL CUSCO	-	RDR	NO ET	1,373,381	1,373,379	100.0%
10	2497598	AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO-DEPARTAMENTO DE CUSCO	-	RDR	NO ET	461,265	445,210	96.5%
11	2653459	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE VILCANOTA DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO	-	RDR	NO ET	54,858	-	0.0%
12	2511129	CONTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL (LA) EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PIURAY DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO -RDR	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
13	2516789	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ORGÁNICA EN LA MICROCUENCA DE PIURAY-CORIMARCA EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHINCHERO-PROVINCIA DE URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
14	2235217	MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV. SOL, TULLUMAYO Y AV. EJERCITO	-	DT	NO ET	18,167	18,166	100.0%
15	2544215	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA APV. MOLLEMOLLEYOC DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	-	RDR	NO ET	169,383	168,464	99.5%
16	2544215	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA APV. MOLLEMOLLEYOC DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	-	DT	NO ET	231,439	48,224	20.8%
17	2638014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN MODULOS SANITARIOS DE CENTRO POBLADO SECSENCALLA - QUEROHUASI DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI SDEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.	-	RDR	NO ET	2,192,298	2,192,294	100.0%
18	2584631	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO PERIODO 2023-2024 DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	-	RDR	ET	2,315,589	2,126,835	91.8%
19	2251972	INSTALACIÓN NUEVO RESERVOIRIO PICHU R-4	-	RDR	NO ET	180,353	176,366	97.8%
20	2561983	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESCARGA; EN EL(LA) COLECTORES DE AGUA RESIDUAL CINCO DISTRITOS DE LA, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	-	RDR	ET	1,589,991	1,424,674	89.6%
21	2615629	CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN EL (LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE ICHUCANCHA, DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	-	RDR	NO ET	377,064	376,996	100.0%
22	2509179	CREACION COLECTORES DE AGUA RESIDUAL ZONA PERIFERICA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	-	RDR	NO ET	4,019,115	3,767,337	93.7%
23	2217007	INSTALACIÓN COLECTORES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO HUATANAY, DISTRITO DE SANTIAGO, WANCHAQ, SAN SEBASTIAN, SAN JERÓNIMO	-	RDR	NO ET	54,080	51,477	95.2%
24	2251972	INSTALACIÓN NUEVO RESERVOIRIO PICHU R-4	-	RDR	NO ET	40,237	37,726	93.8%
25	2317970	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONA NOR OCCIDENTAL CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
26	2561982	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA REGULACIÓN HÍDRICA EN LOS SECTORES CHAQOCHA CCOPIPATA EN EL DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO	-	RDR	ET	352,274	352,273	100.0%
27	2592873	RENOVACIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA VILCANOTA - PUENTE ANGOSTURA DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	-	RDR	ET	942,418	822,904	87.3%
28	2602285	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALLE TAMBO DE MONTERO CALLE AMARGURA CALLE CONCEPCIÓN CALLE SIETE BORREGUITOS DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
29	2235217	MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV. SOL, TULLUMAYO Y AV. EJERCITO	-	RDR	NO ET	45,294	-	0.0%
30	2251972	INSTALACIÓN NUEVO RESERVOIRIO PICHU R-4	-	RDR	NO ET	2,130,103	2,117,268	99.4%

GRAU

	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	0	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AMBITO DE EPS GRAU S.A. DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
2	2197342	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 600 MM.TRAMO DESDE LA PTAP EL ARENAL HASTA LA CAMARA DE VALVULAS T-5 DEL EJE PAITA-TALARA DISTRITO Y PROVINCIA DE TALARA,DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
3	0	EDIFICACIONES EN CURSO MEJORAM.LIN.COND.A.P.24 COSTO AP - ADQUIRIDO O CONSTRUIDO CON RECURSOS PROPIOS	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
4	0	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AP DE EL ARENAL A LA ESTACION DE BOMBEO DE PAITAPIURA F.I: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO DE EPS GRAU S.A. DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
5	0	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO DE EPS GRAU S.A. DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
6	0	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SULLANA-SULLANAPIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%

7	0	A INSTALACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL ALTO DESDE LA AV. JOSE DE LAMA HASTA LA TRANSVERSAL SAN HILARION DE LA URB. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SULLANA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
8	0	S MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS EJIDOS DEL NORTE Y LA MARIPOSA DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
9	0	AMPLIACION DE SERV., DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SUCRE CDRA 1 DISTRITO DE SALITRAL PROV. DE SULLANA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
10	0	AMPL., DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOVINO ARAMBULO III ETAPA DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE SULLANA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
11	0	AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO CABO VERDE QUERECOTILLO-SULLANA-PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
12	0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, META: LINEA DE IMPULSION DE POZO N° 3 CHULUCANAS-MORROPON	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
13	0	INSTALACION DE SERV DE AP EN EL AAHH VILLA PERU CANADA-PIURA-PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
14	0	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONAL TALARA DE LA EPS GRAU SA - PIURA - PNSU	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
15	0	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AP EN EL SECTOR SAN PEDRO-PARIÑAS-TALARA-PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
16	0	AMPL. Y MEJOR. DE LA CAMARA LAS DALIAS Y CAMBIO DE TRAZO DE LA LINEA IMPUSION PROGRESIVAS 2 +660 A 2 +980 -PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
17	0	EDIFICACIONES EN CURSO AMP.LIN.SUBT.10KV NVA C.TERM.A PTAPSULL.1ER/2	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
18	0	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -- DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
19	0	EDIFICACIONES EN CURSO CONSTR.CERCO PER.POZO 07A JZ.CHULUCANAS COSTO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
20	0	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CORTIJO - CASTILLA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
21	0	"SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE 10 KV PARA LA CAMARA DE BOMBEO DE LA URB. MIRAFLORES COUNTRY CLUB-CASTILLA"	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
22	0	ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PIP MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO EB-01 Y EB-02 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE TALARA, PARIÑAS	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
23	0	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LANCONES Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PTAP	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
24	0	EDIFICACIONES EN CURSO PERFORACION DE POZO COSSIO DEL POMAR CASTILLA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
25	0	RENOVACIÓN DE AMBIENTE U OFICINAS DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINAS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO, CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EPS GRAU DISTRITO PROVINCIA Y DPTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
26	2557025	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO AL RESERVOIRIO ELEVADO VILLA LOS ANGELES, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	1,239,448	RDR	ET	40,124	40,124	100.0%
27	2037616	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO VILLA BATANES - DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON	-	DT	NO ET	417	-	0.0%
28	2435304	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH NUEVO PARAISO I ETAPA DEL DISTRITO DE COLAN - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
29	0	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AH.CESAR VALLEJO DISTRITO Y PROVINCIA SULLANA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
30	0	EDIFICACIONES EN CURSO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GEST COSTO AP - ADQUIRIDO O CONSTRUIDO CON RECURSOS PROPIOS	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
31	0	ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PTAP DE EL ARENAL PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
32	2514509	RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO N°02 DEL DISTRITO DE MORROPÓN - PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI N° 2514509.	3,384,483	RDR	ET	2,235,405	1,942,580	86.9%
33	0	GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS(INVERSIÓN)-PROYECTO SECO	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
34	0	GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS -PROYECTO SECO	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
35	0	EDIFICACIONES EN CURSO SECO/BIENES COSTO AP - RECIBIDO EN TRANSFERENCIA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
36	2424132	F-09-GOM SECTORIZACIÓN, BALANCE HIDRICO Y REDUCCIÓN DEL ANF DE LOS SECTORES OPERACIONALES IV DE LA LOCALIDAD DE PIURA. EJECUCIÓN DIRECTA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
37	0	F-05-GOM-II FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SULLANA - OTASS	-	DT	NO ET	-	21,665	0.0%
38	-	F-06-GOM ELECTRIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA Y PTAP LANCONES PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS-CONV. 11-2017.ADENDA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
39	0	F-07-GOM- II FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PTAP LAS LOMAS OTASS	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
40	2454420	FT-01-GO ELAB. DE EXP. TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE SECHURA EN ÁMBITO DE EPS GRAU S.A.	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
41	2423719	F-06-GOM MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EL ARENAL	-	DT	NO ET	164,203	164,203	100.0%
42	-	FT-02-GO ADQ. DE EQUIPAMIENTO PARA OPERACIÓN Y MANTEN. DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE SECHURA EN ÁMBITO DE EPS GRAU S.A.	-	DT	NO ET	-	120,000	0.0%
43	2435293	FT-03-GO OPTIM. DEL POZO TUBULAR ALTOS NEGROS SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE CIUDAD SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	DT	NO ET	133,602	-	0.0%
44	2435293	FT-03-GO OPTIM. DEL POZO TUBULAR ALTOS NEGROS SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE CIUDAD SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	5,577	-	0.0%
45	2435237	FT-05-GO OPTIM. DE INFRAESTRUCTURA DEL RESERVOIRIO VICENTE CHUNGA ALDANA V=1000M3 DEL SIST.AGUAPOT. DE CIUDAD SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	DT	NO ET	17,121	-	0.0%
46	2424132	F-09-GOM SECTORIZACIÓN, BALANCE HIDRICO Y REDUCCIÓN DEL ANF DE LOS SECTORES OPERACIONALES IV DE LA LOCALIDAD DE PIURA. EJECUCIÓN DIRECTA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
47	2274607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA-PIURA	-	DT	NO ET	260,516	-	0.0%
48	0	MEJORAMIENTO DE COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN LA AV.CHULUCANAS ENTRE LAS AV.CIRCUNVALACION Y EL TALLAN Y DESDE EL DREN PETROPERU HACIA CAMARA SAN MARTIN-PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
49	0	MEJORAMIENTO SERVICIO ALCANTARILLADO CALLE MATEO PUMACAHUA-AAHH SAN MARTIN-PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
50	0	CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -- DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
51	2105922	LIQUIDACIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, HACIA LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN TACALA-DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA DE PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%

52	2105922	LIQUIDACIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS, HACIA LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN TACALA-DISTRITO DE CASTILLA PROVINCIA DE PIURA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
53	0	MEJORAMNTO REDES DE ALCANT.A NIVEL EPS GRAU	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
54	0	AMPL. SERV. ALCAN. CALLEJON SAN MARTIN	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
55	0	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALACNAT. EN LA CDRA 9 JR. COMERCIO, DISTRITO CATACAOS - PIURA.	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
56	0	REHABILITACION DE LA CAMARA IGNACIO MERINO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
57	0	REHAB. CALLE NARIHUALA CAM BOMELO MONTO SULLON CATACAOS	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
58	0	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE 24" A 28" DE LA AV.FELIX JARAMILLO-SULLANA-PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
59	0	EDIFICACIONES EN CURSO MEJ.SIST.EVAC.TRAT.Y DISP.A.SERV.DE SULL.Y BE COSTO ALC -	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
60	0	EDIFICACIONES EN CURSO MEJ.LAG.ESTAB.SS.EVAC.A.S.T.LAG.EL INDIO CAST COSTO ALC -	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
61	0	EDIFICACIONES EN CURSO REHAB.RED.DE ALC.AH.VICTOR RAUL HAYA DE LA T. COSTO ALC -	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
62	0	EDIFICACIONES EN CURSO INST.SIST.ALC.LA ESMERALDA SAN LUCAS DE C.COL COSTO ALC -	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
63	0	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION LORGIO GONZALES HACIA LA CAMARA DE BOMBEO DE CHULUCANAS	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
64	0	RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE LA EPS GRAU S.A.- DEPARTAMENTO DE PIU	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
65	0	N: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CUEVIN Y EL INDIO REHABILITADO" DISTRITO DE CASTILLA-PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
66	0	CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA CÁMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N° 01, 02 DISTRITO DE MANCORA PROV	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
67	0	RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO AA.HH.VILLA PERÚ CANADÁ DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
68	2513602	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL INGRESO A LA CÁMARA CENTRAL ENTRE LA AV. MIGUEL GRAU Y LA CALLE 400 DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
69	2534529	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN JIRÓN NARIHUALÁ ENTRE CALLE SAN LUIS A ESPALDAS DE JIRÓN COMERCIO DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
70	2533232	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA INTERSECCIÓN OVALO EL MUNDO ENTRE LA AV. TUPAC AMARU Y JR. ALMIRANTE GRAU DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
71	0	EDIFICACIONES EN CURSO RENOV DE RED DE ALCANT.BUZÓN Y CONEXIÓN DOMICIL DE ALCANT EN AV PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
72	0	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE MOQUEGUA INTERSECCIÓN CON AV. JUNIN DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
73	0	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL - DISTRITO DE AREN	-	0	NO ET	-	-	0.0%
74	0	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS EN EL SECTOR OPERATIVO DEL SECTOR 07 CASTILLA-PIURA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
75	0	REHABILITACIÓN COLECTORES EN PIURA, CASTILLA Y 26 DE OCTUBRE	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
76	0	REHABILITACIÓN COLECTORES EN CATACAOS	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
77	0	REHABILITACIÓN COLECTORES EN SULLANA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
78	0	MANTENIMIENTO DE COLECTORES AMOTAPE AGUA Y SANEAMEN	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
79	0	MANTENIMIENTO DE COLECTORES AMOTAPE-MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
80	2620553	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN : RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. RAMIRO PRIALE ENTRE JR. SANTA ROSA DE LIMA Y AV. LAS BEGONIAS DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA	-	DT	NO ET	779,386	124,457	16.0%
81	2645646	EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN: CONSTRUCCION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. GRAU HASTA LA EBAR 02 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	-	DT	NO ET	1,836,097	1,104,994	60.2%
82	2568681	RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA AV. RAMIRO PRIALE ENTRE LA CALLE ROSA CAMPUSANO Y CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA.	-	RDR	NO ET	128,136	128,136	100.0%
83	2436053	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H. LOS MEDANOS, A.H. LAS MERCEDES Y LOS ALMENDROS DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	-	DT	NO ET	119,362	6,750	5.7%
84	0	EJECUCIÓN : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H. LOS MEDANOS, A.H. LAS MERCEDES Y LOS ALMENDROS DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
85	0	EDIFICACIONES EN CURSO MEJ.GEST.P.SOST.OP.MNTO S.A.P.YALC.SC EP COSTO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
86	0	AMP.SS.ALC.CALL.JM.RAYGADA AH.SM.QUERECOTILLO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
87	0	EDIFICACIONES EN CURSO MEJ.REDES A.P.YALC.I,II,III,IVET.U.PIURA COSTO COMUNES -	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
88	0	EDIFICACIONES EN CURSO OBRAS REHAB.REPAR.MNTO.EMERG.EN LOCALIDA COSTO COMUNES -	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
89	0	EDIFICACIONES EN CURSO AMPLY MEJOMTO REDES A.P.Y ALC.AH.ENACE COSTO COMUNES -	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
90	0	MEJORAM. SERVICIO AGUA ELECTRIFICACION MEJOR POZO N5 CHULUCANAS	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
91	0	INS.SERVICIO AGUA POTABLE Y ALC. AAHH JESUS MARIA,VILLA PAZ,LOS OLIVOS-SULLANA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
92	2091417	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AAHH TACALA, PECUARIO NUEVO HORIZONTE, VALLE LA ESPERANZA Y TERESA DE CALCUTA DE CASTILLA-PIURA	-	DT	NO ET	35,401	-	0.0%
93	0	EDIFICACIONES EN CURSO CONST.CONEX.DOMIC.A.POT.Y ALC.AMP.REDES PAITA COSTO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
94	0	AMPL. DEL SIST. AGUA ALCAN. JOSE VITONETA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%

95	0	AMPL. DEL SIST. AGUA ALCAN. 28 ENERO ORGANOS	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
96	0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN UPIS MONTEERRICO EN EL DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA DPTO. DE PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
97	0	CONST. DE SISTEMA DE AP. Y ALC. URB NUEVO HORIZONTE E ISAIAS-SULLANASULLANA-PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
98	0	"AMPLIACION SERV. AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE PAITA EL TAMPO, VIVIATE - PAITA"	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
99	0	EDIFICACIONES EN CURSO MTO Y REH.SS.AP Y ALC.AV.J.DE LAMA SULLANA COSTO COMUNES -	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
100	0	EDIFICACIONES EN CURSO AMP.Y MEJ.SS.AP Y ALC.UPIS L.A.EGUGUREN PIUR COSTO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
101	0	EDIFICACIONES EN CURSO AMPL.Y MEJ.SIST.AP Y ALC.MARCAVELICA SULLANA COSTO COMUNES	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
102	0	A "INSTALACION SISTEMA DE ALCANT. EN CALLE JUAN BOSCO DE URB. SANTA ROSA DE SULLANA"	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
103	0	EDIFICACIONES EN CURSO AMP.Y MEJ.SIST.AP Y ALC.AH SAN MARTIN PIURA COSTO COMUNES	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
104	0	EDIFICACIONES EN CURSO REH.MEJ.AMP.SIS.AP Y ALC.LAS LOMAS PIURA COSTO COMUNES -	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
105	0	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOSFONDO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
106	0	EDIFICACIONES EN CURSO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AP Y ALCANTARILLADO E COSTO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
107	0	EDIFICACIONES EN CURSO ELABORACION EXPEDIENTES TECNICOS, EMERGENCIA,ETC. COSTO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
108	2310376	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR OPERATIVO EL CORTIJO, CASTILLA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
109	2701954	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE POZOS TUBULARES EN LAS LOCALIDADES DE PIURA, CASTILLA Y VEINTISEIS DE OCTUBRE EN LA PROVINCIA DE PIURA. DEPARTAMENTO DE PIURA. (IDEA).	-	RDR	ET	400,000	216,695	54.2%
110	2315071	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE MALLARITOS , DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
111	2560960	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ARENAL. , DISTRITO DE EL ARENAL, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	ET	137,340	38,150	27.8%
112	2618873	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TANGARARÁ, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA. (ESTUDIO DE PRE-INVERSION)	-	RDR	ET	43,000	43,000	100.0%
113	-	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	-	RDR	NO ET	298,970	27,351	9.1%
114	-	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL RÍO CHIRA Y SUS APORTANTES A TRAVÉS DE LA RESTAURACIÓN DE ZONAS RIBERENAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. (IDEA).	-	RDR	ET	-	-	0.0%
115	280939	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO LETICIA - SULLANA - PIURA - PNSU	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
116	0	EDIFICACIONES EN CURSO DERECHO DE CONTROL SUPERVISION Y COORDINACION DE OBRAS COSTO	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
117	0	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS	-	RDR	NO ET	491,049	5,153	1.0%
118	2175949	SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MICHAEL BASTIDAS I, II, III Y IV ETAPA EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	-	DT	NO ET	34,074	32,522	95.4%
119	2302072	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR A DEL A.H. SANTA JULIA EN EL DISTRITO DE 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", IDENTIFICADO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2302072	-	DT	NO ET	18,969	-	0.0%
120	0	RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE LA EPS GRAU S.A.- DEPARTAMENTO DE PIU	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
121	0	EDIFICACIONES EN CURSO REHABILITARSISTEMADEAPYALCANTARILLADOJR.TAMBOGRANDEYTARAPACAPIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
122	0	EDIFICACIONES EN CURSO CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO II A VII ETAPA HABI	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
123	0	MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. URBANIZACIÓN MIRAFLORES CASTILLA PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
124	0	MEJORAMIENTO DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA EPS GRAU SA DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
125	2428263	RENOVACIÓN DE TUBERÍA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
126	2428503	RENOVACIÓN DE TUBERÍA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
127	2428543	RENOVACIÓN DE TUBERÍA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
128	0	RENOVACIÓN DE TUBERÍA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO CATACAOS PROVINCIA DPTO PIUR	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
129	2428703	RENOVACIÓN DE TUBERÍA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
130	2428504	RENOVACIÓN DE TUBERÍA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
131	2430384	RENOVACIÓN DE TUBERÍA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SULLANA. PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
132	0	EDIFICACIONES EN CURSO INSTALACIONES TERMINADAS SIN LIQUIDAR-SALDOS ADICIO COSTO	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
133	2307711	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	-	DT	NO ET	705,663	-	0.0%
134	0	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SOL DE ORO DEL DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA* META: SANTIAGO APÓSTOL	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
135	2429799	RENOVACIÓN DE TUBERÍA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO Y BUZONES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
136	2434992	"CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA, BUZONES, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA)	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%

		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MZ "L" DE A.H. MÓNICA ZAPATA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"						
137	2589043	"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE ALFONSO ANCAJIMA DEL A.H JACOBO CRUZ Y PROL. JIRON SAN JOSÉ DEL A.H. AMPLIACIÓN VILLA HERMOSA DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA".	-	RDR	NO ET	24,448	23,277	95.2%
138	0	A MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. LA PRIMAVERA I, II, III, ETAPA URN . SAN ANTONIO , SAGRADO CORAZON DE JESUS, Y ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
139	0	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH EL INDIACASTILLA-PIURA"	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
140	2317546	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS DALIAS II Y III ETAPA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
141	2278597	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO OLLANTA HUMALA TASSO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
142	2241776	EDIFICACIONES EN CURSO MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LAS PALMERAS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA".	-	DT	NO ET	30,987	10,607	34.2%
143	2630108	EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN: RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN AV. TACNA CUADRA 8 INTERSECCIÓN CON CALLE JORGE CHÁVEZ DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	DT	NO ET	300,308	279,278	93.0%
144	2519473	EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN: RENOVACION DE TUBERIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	DT	NO ET	522,520	464,932	89.0%
145	2143323	EJECUCIÓN: REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN PEDRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	8,571,881	DT	NO ET	2,873,126	2,071,298	72.1%
146	2593620	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE UGARTE CDRA. DIEZ ENTRE LA CALLE CALLAO Y CALLE PIURA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA" , CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2593620.	-	DT	NO ET	412,251	327,511	79.4%
147	2609132	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CALLE MADRE DE DIOS DE CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2609132.	-	DT	NO ET	186,104	179,753	96.6%
148	2668668	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA: REPARACION DE PTAP; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PTAP CURUMUY DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	DT	NO ET	6,745,766	5,959,080	88.3%
149	2669142	EJECUCIÓN DE OBRA: REPARACIÓN DE POZO, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA.	-	DT	NO ET	599,767	599,766	100.0%
150	2669142	SUPERVISIÓN DE OBRA: REPARACIÓN DE POZO, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA.	-	DT	NO ET	5,429	-	0.0%
151	2669166	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA "REPARACIÓN DE POZO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO CORTUO DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA, PROVINCIA DE PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2669166.	-	DT	NO ET	607,437	543,834	89.5%
152	2669684	EJECUCIÓN DE OBRA: REPARACIÓN DE POZO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO MONTEVERDE DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA", CON CUI N° 2669684.	-	DT	NO ET	895,460	766,496	85.6%
153	2651576	FC-009-2024-GO 032: "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA Y RESERVO RÍO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS ÓRGANOS Y MÁNCORA DISTRITO DE MÁNCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PURA", CON CUI 2651576.	-	DT	NO ET	16,391,119	5,438,220	33.2%
154	2667253	EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN TIPO IOARR POR EMERGENCIA "REPARACIÓN DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA PLANICIE DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"	-	DT	NO ET	438,611	438,610	100.0%
155	2667253	SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN TIPO IOARR POR EMERGENCIA "REPARACIÓN DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA PLANICIE DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"	-	DT	NO ET	23,220	-	0.0%
156	2234976	SUPERVISIÓN DE OBRA : REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. ALMIRANTE MIGUEL GRAU I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA	-	DT	NO ET	450,468	382,199	84.8%
157	2328427	RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION POPULAR SAN JOSE EN EL DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA-PIURA	-	DT	NO ET	451,324	337,046	74.7%
158	2705267	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE Y ; ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES CENTRO VERANIEGO, ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES N° 01 Y N° 02 DISTRITO DE MANCORA DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	-	DT	NO ET	3,549,504	319,092	9.0%
159	2658408	EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACION DE TUBERIA Y BUZON; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENTRE AV. PIURA DESDE PASAJE LOS INCAS HASTA CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N°1 DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	641,467	182,818	28.5%
160	2435293	RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO, BUZÓN Y LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO UBICADO EN EL DREN 1308 A.H. LA PRIMAVERA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	-	RDR	NO ET	2,174,425	619,711	28.5%
161	-	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR OPERATIVO SANTA MARGARITA DISTRITO DE 26 DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	-	RDR	NO ET	15,000	9,492	63.3%
162	-	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR OPERATIVO BANCARIOS DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	-	RDR	NO ET	15,000	-	0.0%
163	-	ESTUDIOS PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE POZOS TUBULARES EN LAS LOCALIDADES DE PIURA, CASTILLA Y VEINTISÉIS DE OCTUBRE EN LA PROVINCIA DE PIURA. DEPARTAMENTO DE PIURA.	-	RDR	NO ET	42,800	-	0.0%
164	-	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	-	RDR	NO ET	4,853,406	99,402	2.0%

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2593289	REPOSICIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y DECANTACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	820,005	RDR	ET	-	-	0.0%
2	2593579	OPTIMIZACIÓN DE LA RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADOS EN EL PARQUE SANTA ROSA - DISTRITO DE HUARAZ-PROVINCIA DE HUARAZ- DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	82,511	RDR	ET	-	-	0.0%
3	2514908	OPTIMIZACIÓN RED AGUA POTABLE SECTOR PALMIRA-VICHAY HUARAZ	-	RDR	ET	-	-	0.0%
4	2538504	MEJORAMIENTO RED ASB. BATAN - NICRUPAMPA HUARAZ	1,919,194	RDR	ET	-	60,298	0.0%
5	0	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VALVULAS DEL RESERVOIRIO CARAZ	-	RDR	ET	-	-	0.0%
6	0	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VALVULAS DEL RESERVOIRIO AIJA	-	RDR	ET	-	40,540	0.0%
7	2579063	REHAB. INFRAEST. PROT. L.C. A.P. DESC. LLULLAN CARAZ	167,294.14	RDR	ET	-	-	0.0%
8	0	OPTIMIZACIÓN DE MACOMEDIDORES DE PALANTAS HZ, CZ, CHIQUIAN	-	RDR	ET	-	242,707	0.0%
9	COD 25	RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS (PC E IMPRESORAS) PARA LA EPS CHAVIN S.A	83,200	RDR	ET	-	-	0.0%
10	0	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
11	COD. 68,69,70,71	IMPLEMENTACIÓN DEL D.S. 010-2019 - VIVIENDA Y SU NORMATIVA, VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) EN LA SEDE HUARAZ, CARAZ, CHIQUIAN Y AIJA DE LA EPS CHAVIN S.A.	357,449	RDR	ET	-	-	0.0%
12	0	IMPLEMENTACION DEL D.S Y SU NORMATIVA	-	RDR	ET	-	-	0.0%
13	COD. 4	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	110,372	RDR	ET	-	5,905	0.0%
14	0	REMODEL. CASETA GUARD. PLANTA MARIAN	-	RDR	ET	-	36,465	0.0%
15	0	CONST. COBERT. TECHO PLANTA MARIAN	-	RDR	ET	-	75,683	0.0%
16	0	ADQ. EQ. HIDR. REP. VALV. PTAP PARIA	-	RDR	ET	-	69,217	0.0%
17	0	ADQ. EQ. HIDR. OPT. LINEA DE COND. PTAP PARIA	-	RDR	ET	-	1,833	0.0%
18	0	REMODELACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA PTAP MARIAN AL RESERVOIRIO SHANCAYAN-INDEPENDENCIA	-	RDR	ET	-	34,068	0.0%
19	0	ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE CONTROL EN LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VALVULAS DE LOS RESERVOIRIOS DE AP EN LA CIUDAD DE HUARAZ	-	RDR	ET	-	7,203	0.0%
20	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPO HIDRAULICO EN LA REPOSICIÓN DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA EN LA LC UNCHUS-BELLAVISTA DIST. INDEPENDENCIA	-	RDR	ET	-	2,542	0.0%
21	0	AD. INS. DATALOGERS MON. RED AP HZ. CZ. A. CH.	-	RDR	ET	-	69,231	0.0%
22	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPO HIDRAULICO EN LA REPOSICIÓN DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA EN HUARAZ	-	RDR	ET	-	2,535	0.0%
23	0	OPTIMIZACIÓN DE MEDIDORES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AP CARAZ	-	RDR	ET	-	1,420,886	0.0%
24	COD. 67A	INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE AIJA-AIJA-AIJA-AIJA	41,950	RDR	ET	-	-	0.0%
25	0	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
26	COD. 78	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE AIJA - CHIQUIAN	31,749	RDR	ET	-	-	0.0%
27	0	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
28	COD. 59	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DATALOGGERS PARA EL MONITOREO DE PRESIÓN Y CONTINUIDAD EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - DE LAS SEDES HUARAZ - CARAZ - AIJA Y CHIQUIAN	43,252	RDR	ET	-	-	0.0%
29	COD. 72	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS SEDES HUARAZ, CARAZ, CHIQUIAN Y AIJA	590,372	RDR	ET	-	-	0.0%
30	0	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
31	0	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
32	COD. 72	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS SEDES HUARAZ, CARAZ, CHIQUIAN Y AIJA	212,330	RDR	ET	-	-	0.0%
33	0	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
34	COD. 72	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS SEDES HUARAZ, CARAZ, CHIQUIAN Y AIJA	166,490	RDR	ET	-	-	0.0%
35	0	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
36	COD. 72	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS SEDES HUARAZ, CARAZ, CHIQUIAN Y AIJA	140,840	RDR	ET	-	-	0.0%
37	0	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO	-	RDR	ET	-	-	0.0%

EMAQ

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2423234	INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DIVERSOS DIÁMETROS EN EL SUB-SECTOR OPERACIONAL II-2 Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTIL PARA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES EN CAMPO	739,114	DT	ET	23,681	-	0.0%
2	2423353	IMPLEMENTACIÓN DE LA MACRO-SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUILLABAMBA PERTENECIENTE AL ÁMBITO DE LA EPS EMAQ SRL	234,204	DT	ET	81,149	-	0.0%
3	2434961	REHABILITACIÓN DE LA ACTUAL PTAP EPS EMAQ S.R.LTDA	3,015,041	DT	ET	29,213	-	0.0%
4	9999999	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO DE LA EPS EMAQ S.R.L. TDA	44,609	DT	ET	1	-	0.0%
5	0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VALVULAS PARA SECTORIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE QUILLABAMBA	77,923	RDR	ET	77,923	65,674	84.3%
6	0	INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE VALVULAS DE AIRE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUILLABAMBA	56,488	RDR	ET	56,488	41,240	73.0%
7	0	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE LA EPS EMAQ S.A.	11,242	RDR	ET	11,242	11,242	100.0%

REPORT DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES N°8

8	0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DATA LOGGERS PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN Y CONTINUIDAD EN LA LOCALIDAD DE QUILLABAMBA	106,399	RDR	ET	-	79,373	0.0%
9	0	INSTALACIÓN DE NUEVOS MEDIDORES POR CRECIMIENTO VEGETATIVO EN LA LOCALIDAD DE QUILLABAMBA	27,482	RDR	ET	-	30,782	0.0%
10	0	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL DE USUARIOS POR SECTORES Y ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	27,200	RDR	ET	57,200	57,439	100.4%
11	0	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO DE LA EPS EMAQ S.A.	41,600	RDR	ET	41,600	72,320	173.8%
12	0	RENOVACIÓN DE 2189 MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE QUILLABAMBA	109,990	RDR	ET	-	119,130	0.0%
13	0	RENOVACIÓN DE 2681 MICROMEDIDORES POR CUMPLIMIENTO DE VIDA ÚTIL EN EL PERÍODO REGULATORIO DE LA LOCALIDAD DE QUILLABAMBA	76,230	RDR	ET	-	76,230	0.0%
14	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS	70,500	RDR	ET	70,500	68,065	96.5%
15	0	REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	3,375	RDR	ET	73,500	83,041	113.0%

EMAPAB

Nro	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2090141	SUPERVISION DE SALDO DE OBRA	1,993,171	DT	NO ET	1,993,171	-	0.0%
2	2652853	REPARACION DEL MURO DE CONTENCIÓN CAMARA 6	263,162	RDR	ET	263,162	222,607	84.6%
3	2652853	SUPERVISION PARA LA REPARACION DEL MURO DE CONTENCIÓN CAMARA 6	15,736	RDR	ET	15,736	13,557	86.2%
4	SIN CODIGO SNIP	INSTALACION DE MEDIDORES NUEVOS	172,718	RDR	ET	172,718	115,461	66.8%
5	SIN CODIGO SNIP	REEMPLAZO DE MEDIDORES	48,745	RDR	ET	48,745	9,025	18.5%
6	SIN CODIGO SNIP	ESTUDIO DE PRE INVERSION PARA RECUPERACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	69,000	RDR	ET	69,000	73,225	106.1%
7	SIN CODIGO SNIP	SERVICIOS DE LABORATORIO PARA ELABORACION DEL PCC	68,530	RDR	ET	68,530	63,747	93.0%
8	2556270	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE EPS	1,180,347	DT	NO ET	1,180,347	-	0.0%
9	2556270	SUPERVISION CONT.CERCO PERIM-INCL.LIQUID	60,000	DT	NO ET	60,000	-	0.0%

BARRANCA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2541257	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CA. PAMPA DE LARA, CA. BELEN DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	749,020	RDR	ET	749,720	735,347	98.1%
2	2541120	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	1,035,377	RDR	ET	1,035,377	976,695	94.3%
3	2526736	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PJE. RAMOS DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	52,799	RDR	ET	52,799	17,491	33.1%
4	2541054	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PJE. TULIPAN, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	116,618	RDR	ET	116,618	24,055	20.6%
5	2461093	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO LA ATARJEA (FT-GO-02)	1,146,987	RDR	NO ET	1,146,987	281,122	24.5%
6	2493573	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AAHH PAMPAS DE ANTIVAL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	12,574	RDR	NO ET	12,574	12,574	100.0%
7	2483996	CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) LINEA DE ADUCCION R-2,100M3 A R-270M3 SECTOR ATARJEA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	6,138	RDR	NO ET	6,138	6,138	100.0%
8	2686058	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PASAJE TOMAS VELARDE NOLASCO DE LA CALLE SAN MARTÍN, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	112,744	RDR	ET	112,744	104,986	93.1%
9	2702780	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO Y ; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE PARAISO DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	77,759	RDR	ET	77,759	67,201	86.4%
10	2702783	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE ROSALES DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	89,806	RDR	ET	89,806	86,267	96.1%
11	2701933	RENOVACION DE PASE AEREO; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION VINTO - MOLINOS Y LINEA DE CONDUCCION VINTO - BUENA VISTA (TRAMO BOTADOR II) EN EL CENTRO POBLADO VINTO BAJO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	133,224	RDR	ET	133,224	127,950	96.0%
12	2425790	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN CONDUCCIÓN AGUA CRUDA (EMBALSE PAYCUÁN - PTAP LOS MOLINOS) Y LÍNEA CONDUCCIÓN GALERÍA FILTRANTE VINTO, BARRANCA - BARRANCA - LIMA FT-GO-P2-02	1,146,988	RDR	ET	159,958	80,454	50.3%
13	2462543	RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. TELLO VELARDE, BARRANCA.	146,988	RDR	NO ET	146,988	86,151	58.6%

EMAPICA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2333644	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PASAJES 2, 3, 5, 6, 9, 10 Y CALLES 1, 4 Y 8 ENTRE LAS MANZANAS O, N, J, I, E, D, K, Q, H, M, F, G, K Y L DE LA URB. ABRAHAM VALDELOMAR DEL SECTOR ACOMAYO, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	905,500	DT	NO ET	-	-	0.0%
2	2382201	REHABILITACION DEL POZO TARAPACA EN EL DISTRITO DE PARCONA	159	RDR	NO ET	-	-	0.0%
3	2382204	OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1500 MEDIDORES Y REHABILITACION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS EN LA ZONA PILOTO DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA	368,701	DT	NO ET	-	-	0.0%

4	2382205	REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN ZONAS CRITICAS DE LA LOCALIDAD DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	4,399	DT	NO ET	-	-	0.0%
5	2382209	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR CHIPIONA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	1,432,819	RDR	NO ET	5,949	-	0.0%
6	2382209	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR CHIPIONA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	-	RDR	NO ET	-	5,041	0.0%
7	2408319	REMODELACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	2,061,925	DT	NO ET	-	-	0.0%
8	2408319	REMODO CONEX DOM DE AG 3910 MEDIDORES- IC	1,685,520	DT	NO ET	-	-	0.0%
9	2444711	REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A. EN LA LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	2,199,464	DT	NO ET	-	-	0.0%
10	2503669	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	130,000	DT	NO ET	35,230	9,915	28.1%
11	2546337	COD 2546337 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA URB. LAS MERCEDES, URB. LA MODERNA, URB. RESIDENCIAL ICA Y OTROS EN EL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1,612,710	DT	NO ET	84,500	47,211	55.9%
12	2546995	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE ICA (CUADRANTE: AV. CUTERVO - AV. J.J. ELIAS - AV. ARENALES - AV. F. L. ARRECHUA - RIO ICA) DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	34,900	RDR	NO ET	-	-	0.0%
13	2546995	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE ICA (CUADRANTE: AV. CUTERVO - AV. J.J. ELIAS - AV. ARENALES - AV. F. L. ARRECHUA - RIO ICA) DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	2,316,602	DT	NO ET	539,645	341,534	63.3%
14	2552177	COD 2552177 REM CONEX DOMICILIARIAS PALPA	340,591	DT	NO ET	-	2,451	0.0%
15	2553054	CREACION DEL LABORATORIO PARA LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EPS EMAPICA S.A. DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1,677,438	RDR	NO ET	-	-	0.0%
16	2553054	CREACION DEL LABORATORIO PARA LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EPS EMAPICA S.A. DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	93,400	RDR	NO ET	-	-	0.0%
17	2553054	CREACION DEL LABORATORIO PARA LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EPS EMAPICA S.A. DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	34,500	RDR	NO ET	-	-	0.0%
18	2553270	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE 800MM DE LA AV. SIETE DISTRITO DE LOS AQUJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	2,262,190	DT	NO ET	2,177,198	633,270	29.1%
19	2553270	MEJ. Y AMP. DEL COLECTOR PRINCIPAL DE 800MM DE LA AV. SIETE, DISTRITO DE LOS AQUJES, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	-	RDR	NO ET	77,400	41,496	53.6%
20	2556742	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	150,270	RDR	ET	-	69,079	0.0%
21	2556742	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	2,886,999	RDR	ET	798,233	753,877	94.4%
22	2556742	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	2,886,999	DT	NO ET	1,347,021	668,098	49.6%
23	2562444	CREACION DE CASETA Y PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR EN LA ANGOSTURA LIMÓN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	39,200	RDR	ET	-	-	0.0%
24	2562444	CREACION DE CASETA Y PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR EN LA ANGOSTURA LIMÓN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA - EJECUCION	1,412,795	RDR	ET	1,213,370	-	0.0%
25	2562444	CREACION DE CASETA Y PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR EN LA ANGOSTURA LIMÓN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA - SUPERVISION	68,638	RDR	ET	63,862	-	0.0%
26	2567312	CREACION DE CASETA Y PERFORACION DE POZO TUBULAR EN LA CA. NATIVIDAD PACO, DISTRITO DE PARCONA PROVINCIA ICA DEPARTAMENTO DE ICA	2,007,600	RDR	ET	466,323	147,734	31.7%
27	2569074	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZACIÓN PUENTE BLANCO I ETAPA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	928,798	RDR	NO ET	845,678	439,261	51.9%
28	2569074	MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA URBANIZACIÓN PUENTE BLANCO I ETAPA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	41,186	RDR	NO ET	43,081	31,413	72.9%
29	2573069	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) CATASTRO COMERCIAL DE LA EPS EMAPICA S.A., DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	2,320,316	DT	NO ET	-	-	0.0%
30	2586835	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION, IMPRESORA PLOTTER, DISPOSITIVO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO GPS Y DETECTOR DE OBJETOS METALICOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CATASTRO TECNICO DE LA EPS EMAPICA S.A. DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	2,064,665	DT	NO ET	-	-	0.0%
31	2588454	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A., PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GERENCIA DE OBRAS EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	349,808	RDR	NO ET	305,262	216,989	71.1%
32	2589681	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) GALERIA FILTRANTE PROYECTADA HACIA RESERVORIO APOYADO TEPRO ECOLÓGICO DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	287,439	RDR	ET	-	11,744	0.0%
33	2592813	CONSTRUCCION DE ALMACEN O DEPOSITO; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A., PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	-	RDR	NO ET	-	103,863	0.0%
34	2631977	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) POZO SAN JORGE DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	-	RDR	NO ET	-	33,500	0.0%
35	2631979	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) POZO LAS PALMERAS DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	-	RDR	NO ET	-	30,203	0.0%
36	2631980	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) POZO LAS CASUARINAS DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	41,197	RDR	ET	-	-	0.0%
37	2631982	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) POZO CHACARILLA (DERRAMA MAGISTERIAL) DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	-	RDR	NO ET	-	48,374	0.0%
38	2645039	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL SECTOR DE LOS AQUJES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO, RESERVORIO EN EL DISTRITO DE LOS AQUJES DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	-	RDR	NO ET	-	255,390	0.0%
39	2646427	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SISTEMA DE LA CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS YUPANQUIS DISTRITO DE LOS AQUJES DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	39,500	RDR	ET	-	-	0.0%
40	2646427	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SISTEMA DE LA CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS YUPANQUIS DISTRITO DE LOS AQUJES DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	288,673	RDR	ET	-	-	0.0%

41	2646427	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SISTEMA DE LA CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS YUPANQUIS DISTRITO DE LOS AQUIJES DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	288,673	RDR	ET	-	-	0.0%
42	2648312	REMEDIACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A., MEDIANTE LA ANULACIÓN DE REDES ANTIGUAS EN LOS SECTORES OPERACIONALES N° 02, N° 03 Y N° 06, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	37,900	RDR	ET	-	-	0.0%
43	2648312	REMEDIACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A., MEDIANTE LA ANULACIÓN DE REDES ANTIGUAS EN LOS SECTORES OPERACIONALES N° 02, N° 03 Y N° 06, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	285,343	RDR	ET	618,203	-	0.0%
44	2648312	REMEDIACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A., MEDIANTE LA ANULACIÓN DE REDES ANTIGUAS EN LOS SECTORES OPERACIONALES N° 02, N° 03 Y N° 06, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	16,835	RDR	ET	32,537	-	0.0%
45	2648457	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; CONSTRUCCION DE CAMARA DE INGRESO (INCLUYE EL SISTEMA SCADA); EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A., PARA LAS ZONALES DE ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA; DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	40,500	RDR	ET	1,330,272	-	0.0%
46	2648457	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS; CONSTRUCCION DE CAMARA DE INGRESO (INCLUYE EL SISTEMA SCADA); EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A., PARA LAS ZONALES DE ICA, PARCONA, LOS AQUIJES Y PALPA; DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1,615,730	RDR	ET	76,526	1,312,150	1714.6%
47	2650383	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA CIUDAD DE PALPA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y PURGA EN EL DISTRITO DE PALPA, EN LA PROVINCIA DE PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	-	RDR	NO ET	241,571	31,695	13.1%
48	2652686	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA LOCALIDAD DE PARCONA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	35,187	RDR	ET	-	-	0.0%
49	2652687	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA LOCALIDAD DE ICA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	39,795	RDR	ET	-	-	0.0%
50	2606309	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL SECTOR DE VIRGEN DE CHAPI, MEDIANTE LA CREACIÓN DE CASETA Y PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR PROFUNDO DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	34,500	RDR	ET	-	-	0.0%
51	2706044	REMEDIACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; RENOVACION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) EPS EMAPICA S.A. (EJECUCIÓN EN 3 ETAPAS - INSTALACIÓN DE 25834 MEDIDORES) DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	-	RDR	NO ET	-	224,856	0.0%

EMPSSAPAL

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2516124	REHABILITACION DE LA CAPTACION MISKIUNO - HUANCANE Y LA LINEA DE CONDUCCION HUANCANE - MISKIUNO - PTAP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO.	1,817,535	DT	NO ET	1,775,226	-	0.0%
2	2516121	REHABILITACION DE LA PTAP MISKIUNO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	100,784	DT	NO ET	94,167	-	0.0%
3	2516739	REHABILITACION DEL RESERVOIRIO APOYADO MISKIUNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO.	121,830	DT	NO ET	116,214	-	0.0%
4	2516180	REHABILITACION DE RESERVOIRIO SONAQUE DE 150M3 DEL SITEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	113,886	DT	NO ET	106,282	-	0.0%
5	2516744	REHABILITACION DE LAS CAPTACIONES ANCCASCCOTA, PTAP TUCUIRE Y LA LINEA DE CONDUCCION TRAMO PASE AEREO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO.	130,873	DT	NO ET	124,379	-	0.0%
6	2516192	REHABILITACION DE LA CASETA DE CLORACION SONPHORUMI EN LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PTAP TUCUIRE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO.	80,412	DT	NO ET	75,053	-	0.0%
7	2516155	IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO.	301,071	DT	NO ET	301,071	-	0.0%
8	2456686	IMPLEMENTACION DE CATASTRO COMERCIAL Y OPTIMIZACION DE LA MEDICION DE AGUA MEDIANTE INSTALACION DE 1,227 MEDIDORES A USUARIOS ASIGNADOS Y RENOVACION DE 400 MEDIDORES POR ANTIGÜEDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DENTRO DEL AMBITO DE LA EPS EMPSSAPAL SA	608,135	DT	NO ET	458,884	-	0.0%
9	2516143	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DENTRO DE LA EPS EMPSSAPAL SA.	342,040	DT	NO ET	342,040	-	0.0%
10	2517720	SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA SALUBRIDAD EN LA IMPLEMENTACION DE CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SICUANI DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,281,895	DT	NO ET	632,216	-	0.0%
11	2423149	IMPLEMENTACION DE SECTORIZACION DE LA RED DE DIST. DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL AREA DE COBERTURA DE LOS RESV. PICHASANI ALTO Y PUERTO ARTURO Y SUTOC DE LA LOCALIDAD DE SICUANI	1,066,120	DT	NO ET	236,526	-	0.0%
12	0	PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI PE-P29	562,986	DT	NO ET	-	-	0.0%

SIERRA CENTRAL

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2540494	SERVICIO DE INSTALACION Y RENOVACION DE 2060 MICROMEDIDORE Y 1758 INSTALACIONES NUEVAS DE MICROMEDIDORES EN LA CIUDAD DE TARMA	601,979	DT	NO ET	601,979	162,909	27.1%
2	2424940	CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTACTO DE CLORO EN EL LA EPS SIERRA CENTRAL SRL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN	345,615	DT	NO ET	345,615	196,732	56.9%
3	2702700	"ADQUISICION DE MICROMEDIDORES - EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SIERRA CENTRAL SRL DISTRITO DE TARMA PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN"	20,632	RDR	ET	20,632	16,969	82.3%

4	2702702	ADQUISICION DE VALVULA DE CONTROL:EN EL (LA) EPS SIERRA CENTRAL SRL CIUDAD DE TARMA DISTRITO TARMA,PROVINCIA TARMA ,DEPARTAMENTO JUNIN	6,396	RDR	ET	6,396	4,788	74.9%
5	2702706	ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO:EN EL (LA) EPS SIERRA CENTRAL SRL TARMA DISTRITO DE TARMA,PROVINCIA TARMA,DEPARTAMENTO JUNIN	59,661	RDR	ET	59,661	38,983	65.3%
6	2702808	ADQUISICION E INSTALACION DE MACROMEDIDORES PARA LA CIUDAD DE TARMA DE LA EPS SIERRA CENTRAL ,PROVINCIA DE TARMA ,DEPARTAMENTO DE JUNIN	26,444	RDR	ET	26,444	21,800	82.4%
7	2702795	RENOVACION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURA:EN EL (LA) EPS SIERRA CENTRAL SRL EN EL CENTRO POBLADO TUCUHUAJANA,DISTRITO DE TARMA ,PROVINCIA DE TARMA,DEPARTAMENTO DE JUNIN	12,916	RDR	ET	12,916	6,595	51.1%
8	2706102	CONSTRUCCION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS:EN EL (LA) EPS SIERRA CENTRAL SRL DE LA CAPTACION DE MOYA II DEL DISTRITO DE TARMA,PROVINCIA TARMA,DEPARTAMENTO JUNIN	5,231	RDR	ET	5,231	4,071	77.8%
9	2708576	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD,EN EL (LA) EPS SIERRA CENTRAL SRL DEL DISTRITO DE TARMA,PROVINCIA TARMA DEPARTAMENTO JUNIN	44,500	RDR	ET	44,500	-	0.0%

NORPUNO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2128422	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE	5,026,616	DT	NO ET	2,052,146	2,003,337	97.6%
2	2461724	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO PEDRO VILCAPAZA DEL DISTRITO DE AZANGARO	112,195	DT	NO ET	15,415	4,195	27.2%

SEDA JULIACA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2012 / 189284	INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION DE AGUA POTABLE EN EL JR. SANTA CRUZ (CRA. 1) Y JR. AYACUCHO (CRA. 2) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	131,079	RDR	NO ET	131,079	-	0.0%
2	2009 / Sin SNIP	INDEPEND. LINEA DE BOMBEO 150 M SECT X RESERVOIRIO R6 URB INDEPENDENCIA	183,978	RDR	NO ET	183,978	-	0.0%
3	2014 / 292783	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES LOS INCAS, SAN LUIS, LOS ANGELES, SAN FELIPE, LOS ANDES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO.	2,648,604	RDR	NO ET	2,648,604	-	0.0%
4	2015 / 305842	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SEDIMENTADOR DE FINOS, INFRAESTRUCTURA BASICA Y CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AYABACAS DE LA EPS SEDA JULIACA S.A., DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNO	513,542	RDR	NO ET	513,542	-	0.0%
5	2015 / 297446	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL RESERVOIRIO SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -PUNO	614,822	RDR	NO ET	614,822	-	0.0%
6	2017 / 348571	AMPLIACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PTAP - AYABACAS DE LA EPS SEDA JULIACA S.A., CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	3,680,781	RDR	NO ET	3,680,781	-	0.0%
7	2021 / 39027	MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA — EPS SEDA JULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	35,226,135	DT	NO ET	31,922,081	-	0.0%
8	2053284	MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA — EPS SEDA JULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	7,550,530	DT	NO ET	7,550,530	-	0.0%
9	2053284	MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA — EPS SEDA JULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	77,618,355	DT	NO ET	77,618,355	7,483,334	9.6%
10	2053284	MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA — EPS SEDA JULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	-	DT	NO ET	3,304,055	540,028	16.3%
11	2019 / 2422349	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - AYABACAS DE LA EPS SEDA JULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	1,324,285	DT	NO ET	1,012,902	-	0.0%
12	2422474	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE GRUPO ELECTROGENO DE PISTA (APU); EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - AYABACAS DE LA EPS SEDA JULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	1,636,705	DT	NO ET	1,511,707	-	0.0%
13	2019 / 2422547	ADQUISICIÓN DE KITS DE VÁLVULAS; EN EL(LA) RESERVOIRIOS N° 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 DE LA EPS SEDA JULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	421,048	DT	NO ET	334,903	-	0.0%
14	2018 / 2422553	ADQUISICIÓN DE KITS DE VÁLVULAS Y EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LINEA DE FLUJO; EN EL(LA) RESERVOIRIOS N° 02, 03 Y 04 DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	342,392	DT	NO ET	265,496	-	0.0%
15	2019 / 2422583	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) RESERVOIRIOS N° 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	1,188,020	DT	NO ET	665,614	-	0.0%
16	2019 / 2422586	ADQUISICIÓN DE HIDRANTES; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	176,433	DT	NO ET	144,648	-	0.0%
17	2019 / 2422591	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL Y VÁLVULA DE AIRE; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	295,224	DT	NO ET	180,917	-	0.0%
18	2019 / 2422675	ADQUISICIÓN DE KITS DE MUESTREO Y PRUEBAS DEL AGUA; EN EL(LA) LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SALA DE CLORACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AYABACAS DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	231,498	DT	NO ET	231,498	-	0.0%

19	2019 / 2422703	ADQUISICIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE TUBERÍA; EN EL(LA) GALERÍA DE TUBERÍAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AYABACAS DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	256,760	DT	NO ET	200,543	-	0.0%
20	2019 / 2422709	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO, KITS DE VÁLVULAS Y ; EN EL(LA) SALA DE IMPULSIÓN N° 01 Y 02 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AYABACAS DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	1,466,846	DT	NO ET	1,362,321	-	0.0%
21	2009 / 51033	CONSTRUCCION CONCLUSION CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE N° 08 SAN SANTIAGO JULIACA SAN SANTIAGO, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	80,877	RDR	NO ET	80,877	-	0.0%
22	2002 / Sin SNIP	CAMARA DE BOMBEO N° 08 SAN SANTIAGO - OBRA POR TERCEROS	357,714	RDR	NO ET	357,714	-	0.0%
23	2025 / 2697022	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) REDES SECUNDARIAS DE LAS CUADRAS 2 Y 4 DEL JR. NICOLAS DE PIEROLA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	23,223	RDR	NO ET	13,964	8,305	59.5%
24	2007 / 24322	INSTALACION DE REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION AMPLIACION SAN SANTIAGO DE LA CIUDAD DE JULIACA	733,505	DT	NO ET	733,505	-	0.0%
25	2008 / 58710	INSTALACION DE REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION AEROPUERTO I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	564,739	DT	NO ET	564,739	-	0.0%
26	2008 / 58659	INSTALACION DE REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES LOS ROSALES Y VILLA SAN JACINTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	852,982	DT	NO ET	852,982	-	0.0%
27	2008 / 64125	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO DE LOS TRAMOS PRINCIPAL (JR. HUAYNA ROQUE A JR. MARIANO NUÑEZ), CABANA Y RAUL PORRAS, ADYACENTE AL CONDUCTO DE EVACUACION DEL RIO TOROCOCHA, EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	1,291,298	DT	NO ET	1,291,298	-	0.0%
28	2003 / Sin SNIP	CONVENIO INSTITUCIONAL CON PECT CONSTRUCCION CÁMARAS SECAS BOMBEO ALCANTARILLADO - GOB. REGIONAL PUNO	-	DT	NO ET	-	-	0.0%
29	2018 / 2422594	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DEL CAISSON CENTRAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	630,781	DT	NO ET	522,497	-	0.0%
30	2019 / 2422641	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO, KITS DE VÁLVULAS Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL; EN EL(LA) CÁMARA DE BOMBEO CENTRAL DE LA EPS SEDA JULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	1,482,813	DT	NO ET	1,369,845	-	0.0%
31	2019 / 2422673	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO; EN EL(LA) CÁMARAS DE BOMBEO AUXILIARES N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	2,196,480	DT	NO ET	1,971,845	-	0.0%
32	2422674	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE GRUPO ELECTROGENO DE PISTA (APU); EN EL(LA) CÁMARAS DE BOMBEO SECUNDARIAS Y EN LA CÁMARA DE BOMBEO CENTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	2,085,158	DT	NO ET	1,743,694	-	0.0%
33	2013 / 256726	REHABILITACION DEL EMISOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHILLA EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNO	791,009	RDR	NO ET	646,868	-	0.0%
34	2014 / 303710	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS SEDA JULIACA S.A., DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	294,016	RDR	NO ET	294,016	-	0.0%
35	2018 / 2422740	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) PARQUE DE MEDIDORES DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	968,331	DT	NO ET	690,900	-	0.0%
36	2422735	CONSTRUCCIÓN DE CAISSON O POZO DE CIMENTACIÓN; ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS Y DERECHO DE PASO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO - BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES A LA PTAR - CARACOTO (PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL DISTRITO DE CARACOTO A LA EPS SEDA JULIACA S.A.) EN LA LOCALIDAD CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	54,158	DT	NO ET	40,046	-	0.0%
37	2018 / 2422744	RENOVACIÓN DE RESERVORIOS; EN EL(LA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CARACOTO (POR PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL DISTRITO DE CARACOTO A LA EPS SEDA JULIACA S.A.) EN LA LOCALIDAD CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	78,990	DT	NO ET	27,568	-	0.0%
38	2018 / 2422746	ADQUISICIÓN DE KITS DE VÁLVULAS; REPARACIÓN DE BUZONES; CONSTRUCCIÓN DE BUZONES; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO (POR PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL DISTRITO DE CARACOTO A LA EPS SEDA JULIACA S.A.) EN LA LOCALIDAD CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	65,887	DT	NO ET	51,480	-	0.0%
39	2014 / 291083	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CATASTRO COMERCIAL EN LA EPS SEDA JULIACA S.A. DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	165,011	RDR	NO ET	168,371	-	0.0%
40	2016 / 356477	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL DE LAS CONEXIONES ACTIVAS Y POTENCIALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA EPS SEDA JULIACA S.A. EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO	335,330	RDR	NO ET	345,928	-	0.0%
41	2017 / 39027	MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA — EPS SEDA JULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	8,474,686	DT	NO ET	8,474,686	342,159	4.0%
42	2018 / sin snip	EJECUCIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CARACOTO — EPS SEDA JULIACA S.A.	30,341	DT	NO ET	30,341	-	0.0%
43	2018 / sin snip	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO". EPS SEDA JULIACA S.A.	298,000	DT	NO ET	298,000	-	0.0%
44	2018 / sin snip	IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO PUNO-EPS SEDA JULIACA S.A.	81,500	DT	NO ET	81,500	-	0.0%
45	2022 / 39027	MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA — EPS SEDA JULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,805,551	DT	NO ET	2,805,551	-	0.0%
46	2018 / 2422720	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS DONDE OPERAN LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO, COMO PARTE DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN A LA EPS SEDA JULIACA S.A.	58,409	DT	NO ET	58,409	-	0.0%
47	2025 / 2697098	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) EPS SEDA JULIACA S.A. PARA CATASTRO TÉCNICO, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO	448,754	RDR	ET	1,426,478	89,050	6.2%

EPS MANTARO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2651786	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) CAPTACIÓN YURACCUNYA, DE LA EPS MUNICIPAL MANTARO S.A ZONAL JAUJA , DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN	41,200	RDR	ET	41,200	-	0.0%
2	2651789	REPARACION DE PASE AEREO Y BOMBA DE AGUA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) LINEA DE IMPULSION Y CAPTACION DE JUNTAYSAMA DISTRITO DE PARCO, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN	51,540	RDR	ET	51,540	-	0.0%
3	2651777	RENOVACION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; ADQUISICION DE CASETA; EN EL(LA) DE DOSIFICADOR DE CLORO EN LAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE LA EPS MUNICIPAL MANTARO ZONAL JAUJA DISTRITO DE YAUYS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN	133,850	RDR	ET	133,850	13,255	9.9%
4	2624650	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLE CIRCUNVALACION; 1RO DE MAYO; LAS MALVINAS, PROLONG. TARAPACA DISTRITO DE YAUYS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN	163,749	RDR	ET	104,797	64,368	61.4%
5	2663992	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) C.A. PEDRO MONGE CORDOVA; PSJE MARIA ARGUEDAS , CA. ABRAHAM BALDELOMAR DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN	78,102	RDR	ET	78,102	60,645	77.6%
6	2656215	ADQUISICION DE EQUIPO PARA AUTOMATIZACION; EN EL(LA) MEDICION DE PRESIONES CON DATALOGGERS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA EPS MANTARO DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN	41,200	RDR	ET	41,200	-	0.0%
7	2699940	ADQUISICION DE LINEA DE CONDUCCION, VALVULA DE CONTROL Y CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) LA EPS MANTARO S.A ZONAL JAUJA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR YURACCUNYA DISTRITO DE PARCO, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN	383,373	RDR	ET	383,373	-	0.0%
8	2702363	ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN , SISTEMA DE BOMBEO Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) ESTACION DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA SERVIDA DE LA EPS MANTARO S.A ZONAL JAUJA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAUSA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN	77,871	RDR	ET	77,871	-	0.0%
9	0	MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS FACULTATIVAS DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16,406	RDR	ET	16,406	-	0.0%
10	GRD	ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL RESERVORIO R1, DISTRITO DE YAUYS JAUJA JUNIN	34,153	RDR	ET	34,153	-	0.0%
11	GRD	PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TRAMOS EROSIONADOS, DE LA CAPTACIÓN DE QUERO HASTA EL RESERVORIO 1 Y PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CON MURO ENROCADO, EN EL TRAMO DEL MANANTIAL JUNTAYSAMA A CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN 2, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	57,236	RDR	ET	57,236	-	0.0%
12	GRD	MEJORAMIENTO, PROTECCIÓN Y DRENAJE DE LA MASA DESLIZADA QUE AFECTA A LA CAPTACION YURACCUNYA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	75,056	RDR	ET	75,056	-	0.0%
13	MERESE	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL (REFORESTACIÓN E INSTALACIÓN NUEVAS QOCHAS Y CERCOS PERIMÉTRICOS) EN LA CUENCA YURACCUNYA -JAUJA	65,000	RDR	ET	65,000	-	0.0%
14	MERESE	CONTROL, VILANCIA, EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL MRSE CON LA COMUNIDAD DE YURACRUMI, EN LA EN LA CUANCA YURACCUNYA -JAUJA	12,000	RDR	ET	12,000	-	0.0%
15	MERESE	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO HIDROLÓGICO EN LA CUENCA YURACCUNYA - JAUJA	15,000	RDR	ET	15,000	-	0.0%
16	MERESE	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A CONTRIBUYENTES Y RETRIBUYENTES INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MRSE EN LA CUANCA YURACCUNYA Y PERSONAL PARA MRSE	24,825	RDR	ET	24,825	-	0.0%
17	2667530	RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) JR. ALFONSO UGARTE, JR. 07 DE JUNIO, JR. LOS LIBERTADORES, JR. SAUCES DEL SECTOR DE MILO ALMA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN	130,000	RDR	NO ET	130,000	81,181	62.4%
18	2689805	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO HIDRAULICO; EN EL(LA) REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE VÁLVULAS DE PURGA DE AIRE, EN EL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN	50,000	RDR	ET	50,000	444	0.9%
19	2689992	REMEDIACION DE EQUIPO HIDRAULICO; EN EL(LA) SALIDA DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE MACROMEDIDORES ELECTROMECANICOS, EN EL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN	99,772	RDR	ET	99,772	-	0.0%
20	2694571	RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE INSTALACION DE MICROMEDIDORES, EN EL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN	189,051	RDR	ET	189,051	-	0.0%
21	2666968	REPARACION DE COLECTOR SECUNDARIO, Y PASE AEREO, EN EL (LA) JR. CIRCUITO PLAYA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	153,857	RDR	ET	153,857	-	0.0%
22	2689981	PROYECTO "ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION EN EL CATASTRO COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA CHUPACA ,DEPARTAMENTO JUNIN "	40,000	RDR	ET	40,000	4,310	10.8%
23	2689821	PROYECTO "ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION EN EL (LA) CATASTRO TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA CHUPACA,DEPARATMENTO JUNIN ,DEPARTAMENTO JUNIN "	60,000	RDR	ET	60,000	65	0.1%
24	Plan de trabajo	ACTUALIZACION DINAMICA DEL CATASTRO COMERCIAL DE AGUA APOTABLE ALCANTARILLADO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
25	Plan de trabajo	MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS MANTARO, PROVINCIA DE CONCEPCION, DPTO JUNIN.	7,100	RDR	ET	7,100	7,100	100.0%
26	Plan de trabajo	AMPLIACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, PROVINCIA DE JUNIN, REGION JUNIN	244	RDR	ET	244	244	100.0%
27	Plan de trabajo	AMPLIACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, PROVINCIA DE JUNIN, REGION JUNIN	16,142	RDR	ET	16,142	16,142	100.0%
28	Plan de trabajo	AMPLIACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, PROVINCIA DE JUNIN, REGION JUNIN	21,143	RDR	ET	21,143	21,143	100.0%
29	Plan de trabajo	AMPLIACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, PROVINCIA DE JUNIN, REGION JUNIN	2,596	RDR	ET	2,596	2,596	100.0%
30	Plan de trabajo	RENOVACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN	5,384	RDR	ET	5,384	5,384	100.0%
31	Plan de trabajo	RENOVACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN	9,770	RDR	ET	9,770	9,770	100.0%
32	Plan de trabajo	RENOVACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN	244	RDR	ET	244	244	100.0%
33	0	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERCIAL DE LA EPS MANTARO SA EN ESCRITORIO Y PLATAFORMAS WEB	30,417	RDR	ET	30,417	30,417	100.0%
34	Plan de trabajo	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC), PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA (PAS).	1,396	RDR	NO ET	1,396	1,396	100.0%
35	Plan de trabajo	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC), PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA (PAS).	1,423	RDR	NO ET	1,423	1,423	100.0%

36	Plan de trabajo	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC), PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA (PAS).	1,594	RDR	NO ET	1,594	1,594	100.0%
37	Plan de trabajo	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC), PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA (PAS).	1,465	RDR	NO ET	1,465	1,465	100.0%
38	Plan de trabajo	IMPLEMENTACION DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	-	RDR	ET	-	-	0.0%
39	Plan de trabajo	REFACCION DE CUPULA Y CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL RESERVOIRIO DE ALAYO DE 100 M3	-	RDR	ET	-	-	0.0%

ABANCAY

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	NO APLICA	"PLAN DE INTERVENCION DEFINITIVO DEL MECANISMO DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA UNIDAD HIDROLOGICA DE RONTCCOCHA COMUNIDAD CAMPESINA DE ATUMPATA Y MICAELA BASTIDAS-ABANCAY-APURIMAC"	234,853	RDR	ET	1,854,208	224,458	12.1%
2	2495336	"CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES VALLE EL PISONAY, SAN ISIDRO, VILLA RENE, VILLA MARCA, HIROITO, SIMPE Y NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	950,250	RDR	NO ET	-	5,800	0.0%
3	2495336	"CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES VALLE EL PISONAY, SAN ISIDRO, VILLA RENE, VILLA MARCA, HIROITO, SIMPE Y NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	2,283,531	DT	NO ET	-	-	0.0%
4	2394369	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES MOLINOPATA BAJA, SANTA ROSA, VALLE REAL, RINCONCITO ABANQUINO Y AMANCAES DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	22,618,210	DT	NO ET	13,416,988	4,899,324	36.5%
5	2642729	IOARR RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO DEL AÑO V-2024, PERIODO III DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	882,458	RDR	ET	852,963	14,700	1.7%
6	2622000	IOARR "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) RENOVACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC"	1,802,405	DT	NO ET	110,360	1,374,794	1245.7%
7	2648346	IOARR "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL AÑO V-2024, PERIODO III DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	1,402,362	RDR	ET	807,572	231,284	28.6%
8	2645956	"ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC". SUMINSTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA RENOVAR EL PARQUE DE MEDIDORES.	507,764	RDR	ET	325,377	12,221	3.8%
9	0	"ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC". SUMINSTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN CONEXIONES VEGETATIVAS.	33,789	RDR	ET	21,847	488	2.2%
10	2661329	"RENOVACION DE RED SECUNDARIA EN EL (LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR.LOS NOGALES Y AV. CORONA DE CRISTO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	805,459	RDR	ET	329,099	98,073	29.8%
11	0	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONALES DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A 2025.	160,815	RDR	NO ET	-	145,780	0.0%
12	0	PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - EPS EMUSAP ABANCAY S.A	392,143	RDR	NO ET	-	170,770	0.0%
13	0	PROGRAMA "ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2025".	173,500	RDR	NO ET	-	154,192	0.0%
14	0	PLAN DE TRABAJO 2025 PARA LA IMPLEMENTACION DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES (VMA) EN LOS USUARIOS NO DOMESTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	93,002	RDR	ET	-	68,266	0.0%
15	0	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025 DEL AREA DE ASUNTOS AMBIENTALES RELACIONES COMUNITARIAS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A	133,497	RDR	NO ET	-	139,982	0.0%
16	0	PROGRAMA ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL CATASTRO TECNICO DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2025, EPS EMUSAP ABANCAY S.A DEL DISTRITO DE ABANCAY- PROVINCIA DE ABANCAY- REGION APURIMAC.	131,307	RDR	NO ET	-	76,672	0.0%
17	0	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE URBANIZACION VISTA ALEGRE, AFILANAPATA 2DA ETAPA Y SEÑOR DE LA EXALTACION DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	219,839	RDR	NO ET	-	2,166	0.0%
18	0	PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - EPS EMUSAP ABANCAY S.A	71,679	DT	NO ET	-	102,331	0.0%
19	0	PLAN DE TRABAJO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MEDIANTE CISTERNAS A 7 ZONAS VULNERABLES IDENTIFICADAS SIN ACCESO AL SERVICIO EN EL CASCO URBANO DE ABANCAY Y TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, REGION DE APURIMAC.	666,046	DT	NO ET	-	281,024	0.0%
20	2686824	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO, EN EL (LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR AYMAS DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	204,853	RDR	ET	-	134,312	0.0%
21	0	PROGRAMA DE INVERSION PARA LA ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL SEGÚN LA FICHA DEL PROYECTO DE INVERSION AL AÑO 4 Y 5 DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	141,322	RDR	ET	-	78,878	0.0%
22	0	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD DE ABANCAY - 2025	73,001	RDR	ET	-	88,914	0.0%
23	0	PROGRAMA: RECUPERACION DE CARTERA MOROSA DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 2025.	43,100	RDR	ET	-	31,399	0.0%
24	0	PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) 2025 DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	204,850	RDR	NO ET	-	63,898	0.0%
25	0	ACTIVIDAD "IMPLEMENTACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA CAPATCION DE AMARUYOC, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC".	91,240	RDR	ET	-	77,551	0.0%
26	2695649	RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL (LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL PASAJE SANTA LUCIA SECTOR DE PATIBAMBA BAJA Y LA NUEVA URBANIZACION VILLA EL PARAISO DE MARCAHUASI DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	128,553	RDR	ET	-	69,580	0.0%
27	2694030	CONTRUCCION DE RED SECUNADARIA EN EL (LA) DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANIZACION GENARO ARVIETO RIVAS, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	139,395	RDR	ET	-	83,917	0.0%
28	0	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ILLANYA Y PATIBAMBA BAJA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	109,852	RDR	NO ET	-	88,169	0.0%
29	2697189	CONTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL (LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ABDON TRUJILLO ENCALADA Y LA SOCIACION DE VIVIENDA LOS CARRIZALES DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	158,005	RDR	ET	-	108,854	0.0%

30	0	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA RED SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PASAJE N° 2,3,4 Y CALLE N° 4 DE LA URBANIZACION QUINTA ISABEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	119,439	RDR	NO ET	-	66,607	0.0%
31	0	PROGRAMA DE INSTALACION DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VIAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD DE ABANCAY 2025	108,112	RDR	NO ET	-	73,076	0.0%
32	0	ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA AMPLIAR EL PARQUE DE MEDIDORES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION DE APURIMAC	233,603	RDR	NO ET	-	204,374	0.0%
33	0	PLAN DE TOMA DE MUESTRAS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	115,000	RDR	NO ET	-	74,144	0.0%
34	2706346	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN URBANIZACIONES LOS PORTALES, SAN FAUSTINO Y PROLONGACION SINCHI ROCA DEL SECTOR PATIBAMBA BAJA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	698,407	RDR	ET	-	504,733	0.0%
35	2703229	CONSTRUCCION DE VERTEDERO Y CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CAPTACION CHANCCALLA DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC.	45,112	RDR	ET	-	29,757	0.0%
36	0	"RENOVACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE PASE SUBTERRANEO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL KM 8+180 DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL SECTOR DE RINCOMAYO LOCALIDAD DE ATUMPATA DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	108,251	RDR	ET	-	86,081	0.0%
37	2394369	1.RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. BRASIL, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC. 2.RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. CHILE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC. 3.RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. ARGENTINA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC. 4.RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	114,000	RDR	NO ET	-	86,913	0.0%
38	0	PLAN DE TRABAJO * RECATEGORIZACION DE CONEXIONES DE ACUERDO CON EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL PREDIO* (ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR - MOTOCICLETA LINEAL) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADA EN EL ESTUDIO TARIFARIO 2019-2024.	14,237	RDR	NO ET	-	9,915	0.0%
39	0	PLAN DE TRABAJO PARA "IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE" DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.	13,660	RDR	NO ET	-	13,653	0.0%
40	2702366	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION SANTA ROSA, LOS ANGELES, QUINTA VALVERDE, CONSTRUYENDO FUTURO, JUAN PABLO GUTIERREZ Y VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	930,931	RDR	ET	-	655,743	0.0%

EPS CHANKA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	S/C/S	CONST RED DISTRIBUCION AP CALLE CALICANTO Y SANTA ROSA-SALINAS	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
2	2562173	RENOVACION RED DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE AV LOS CHANKAS, CALLE LAS VIÑAS Y JR LAS AMERICAS 3RA CDRA DEL SERVICIO DE AP DE LA EPS EMSAP CHANKA SA ANDAHUAYLAS	63,986	RDR	NO ET	-	-	0.0%
3	2564904	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION COLEGIO DE INGENIEROS	121,064	RDR	NO ET	4,000	4,000	100.0%
4	2560787	CONSTR RED ALC Y CONEX DOM ALC-URB. PARIABAMBILLA Y ASOC DE COLEGIO DE INGENIEROS EN EL CCPP DE SALINAS	305,640	RDR	NO ET	4,000	4,000	100.0%
5	2562616	RENOV RED ALC. Y CONEX DOM DEL SERV DE ALC DE LA EPS EMSAP CHANK SA EN LAS CALLES VIÑAS Y JR LAS AMERICAS 3RA CUADRA CCPP SALINAS	61,045	RDR	NO ET	-	-	0.0%
6	2650610	RENOV RED ALCANTARILLADO; EN EL(LA) ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA URBANIZACION ALFREDO VASQUEZ Y PASAJE ZENOBIO TELLO DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	103,955	RDR	ET	4,000	4,000	100.0%
7	F-03	RENOVACION Y REPOSICION DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE ANDAHUAYLAS DE LA EPS EMSAP CHANKA S.A.	249,210	RDR	ET	18,496	18,496	100.0%
8	S/C/S	CATASTRO COMERCIAL	60,000	RDR	NO ET	-	-	0.0%
9	2536946	CONST RED ALC CALLE SANTA ROSA Y GODORNICES	165,493	RDR	NO ET	-	-	0.0%
10	2545203	RENOV RED DISTRIBUCION Y CONEX AP JOSE MARIA ARGUEDAS 4TA 5TA CUADRA	28,232	RDR	NO ET	-	-	0.0%
11	2650610	RENOV RED DIST AP URB ALFREDO VASQUEZ Y PSJ ZENOBIO TELLO	67,710	RDR	ET	-	-	0.0%
12	F-21	INSTALACION DE NUEVOS MEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE ANDAHUAYLAS DE EMSAP CHANKA S.A.	234,740	RDR	ET	27,400	27,400	100.0%
13	S/C/S	RENOVACION Y COMPLEMENTO RENOV D Y T	-	RDR	NO ET	-	-	0.0%
14	S/C/S	MECANISMOS DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS	37,000	RDR	ET	24,355	24,355	100.0%
15	F-01	AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION; SISTEMA DE CAPTACION Y ESTACION DE BOMBEO EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EMSAP CHANKA S.A. DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	743,750	RDR	ET	8,811	8,811	100.0%
16	S/N	INTERVENCIONES EN PCC Y PAS	25,000	RDR	ET	6,560	6,560	100.0%
17	2536083	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PASAJE LOS OLIVOS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	161,119	RDR	ET	170,787	170,787	100.0%
18	2613114	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON EN LA AV ANDAHUAYLAS AV PERU (1RA 2DA 3RA) JR JUAN ANTONIO RELLES 6TA Y 7MA	502,007	DT	NO ET	421,273	421,273	100.0%
19	S/N	SERVICIO DE ACTUALIZACION DINAMICA DE CATASTRO COMERCIAL DE EMSAP CHANKA S.A.	103,400	RDR	ET	33,000	33,000	100.0%

EPS MARAÑON

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	200741	SUPERVISION CONSTRUCCION LOCAL INSTITUCIONAL EPS	82,300	RDR	ET	-	-	0.0%

2	200741	CONSTRUCCION LOCAL INSTITUCIONAL EPS	2,339,413	DT	ET	-	-	0.0%
3	S/N	SUPERVISION AMPLIACIÓN SERV. AGUA POT. Y ALC. BELLAVISTA	428,700	DT	NO ET	278,047	218,917	78.7%
4	0	TRANSFERENCIA FINANCIERA DESTINADA A FINANCIAR LA DISTRIBUCION GRATUITA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA	363,073	DT	NO ET	363,073	198,695	54.7%
5	0	IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO EN LA CIUDAD DE JAÉN	387,733	RDR	ET	195,494	90,979	46.5%
6	0	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL EN LA CIUDAD DE JAÉN	278,448	RDR	ET	213,697	177,853	83.2%
7	0	ACTUALIZACIÓN CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL EN LA CIUDAD DE JAÉN	-	RDR	ET	79,600	39,352	49.4%
8	0	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y RENOVACIÓN DE EXISTENTES PARA ANÁLISIS DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	440,165	RDR	ET	87,910	45,180	51.4%
9	0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFOS CONTRA INCENDIO Y VÁLVULAS DE CONTROL TIPO COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	670,001	RDR	ET	-	-	0.0%
10	0	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE PROTECCIÓN PARA LOS RESERVIOS GUAYACÁN, MORRO SOLAR, EL PARRAL, MAGLLANAL Y MIRAFLORES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	690,490	RDR	ET	124,120	24,700	19.9%
11	0	INSTALACIÓN DE DOS VÁLVULAS DE CONTROL TIPO COMPUERTA EN LOS RAMALES QUE DISTRIBUYEN EL AGUA A LOS RESERVIOS EL PARRAL, MORRO SOLAR Y GUAYACÁN DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	36,635	RDR	ET	85,373	48,800	57.2%
12	0	RENOVACIÓN DE VÁLVULA DE ALTITUD EN LOS RESERVIOS MIRAFLORES Y MORRO SOLAR EN DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	38,868	RDR	ET	38,868	-	0.0%
13	0	ACONDICIONAMIENTO DE LA ALTURA DE LAS PAREDES DE LA CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "ANTIGUA"- SISTEMA JAÉN BELLAVISTA	31,412	RDR	ET	29,347	29,000	98.8%
14	0	REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN DE CLORO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE- SISTEMA JAÉN BELLAVISTA	16,121	RDR	ET	-	-	0.0%
15	0	RENOVACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE DE LAS 13 CÁMARAS REDUCTORAS DE PRESIÓN EN EL DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	12,152	RDR	ET	12,153	-	0.0%
16	0	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA EPS MARAÑON S.A.	1,515,520	RDR	ET	-	-	0.0%
17	0	ADQUISICIÓN DE DATALOGGERS Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JAÉN, SAN IGNACIO Y BELLAVISTA BAJO ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE LA EPS MARAÑON S.A.	1,005,839	RDR	ET	971,483	-	0.0%
18	0	ADQUISICIÓN DE DATALOGGERS Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JAÉN, SAN IGNACIO Y BELLAVISTA BAJO ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE LA EPS MARAÑON S.A.	-	RDR	ET	-	-	0.0%
19	0	ADQUISICIÓN DE DATALOGGERS Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JAÉN, SAN IGNACIO Y BELLAVISTA BAJO ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE LA EPS MARAÑON S.A.	-	RDR	ET	-	-	0.0%
20	0	REUBICACIÓN DE 349.95ML DE TUBERÍA UF DE 200 MM DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN GUAYACÁN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	125,219	RDR	ET	122,621	-	0.0%
21	0	RENOVACIÓN DE 10,786 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE JAÉN	3,418,470	RDR	ET	487,345	371,203	76.2%
22	0	INSTALACIÓN DE 594 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE JAÉN	249,480	RDR	ET	117,290	33,254	28.4%
23	0	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES PARA LAS LOCALIDADES BAJO ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE LA EPS MARAÑON S.A.	362,865	RDR	ET	-	-	0.0%
24	0	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE MEDIDORES	776,637	RDR	ET	-	-	0.0%
25	0	IMPLEMENTACIÓN CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA	94,385	RDR	ET	101,779	44,807	44.0%
26	0	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL EN LOCALIDAD DE BELLAVISTA	156,090	RDR	ET	96,733	81,653	84.4%
27	0	RENOVACIÓN DE VÁLVULA DE ALTITUD EN LOS RESERVIOS, SAMBIMERA, SANTA CRUZ, SHANANGO Y BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAÉN- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	77,736	RDR	ET	77,736	71,900	92.5%
28	0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEO MEMBRANA HDPE 2.00MM SOBRE GEO TEXTIL NO TEJIDO DE 270 GR, PARA LAS LAGUNAS ANAEROBIAS DE LAS PTAR DEL DISTRITO DE BELLAVISTA	747,843	RDR	ET	721,993	711,327	98.5%
29	0	RENOVACIÓN Y REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN JAÉN - BELLAVISTA DEL KM 00+00 AL KM 12+180.00, PTAP JAÉN CRUCE CHANANGO	1,313,228	RDR	ET	30,383	27,500	90.5%
30	0	RENOVACIÓN DE 1,797 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA	663,283	RDR	ET	-	-	0.0%
31	0	INSTALACIÓN DE 20 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA	8,800	RDR	ET	-	-	0.0%
32	0	IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO EN LA CIUDAD SAN IGNACIO	88,675	RDR	ET	76,147	58,900	77.4%
33	0	IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	339,702	RDR	ET	110,160	31,175	28.3%
34	0	IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO OPERACIONAL EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	-	RDR	ET	-	-	0.0%
35	0	CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LA PTAP NUEVA (SISTEMA SAN IGNACIO)	45,000	RDR	ET	45,000	-	0.0%
36	0	RENOVACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (INCLUYE LA INSTALACIÓN DE HIDRANTES, VÁLVULAS DE CONTROL Y VÁLVULAS DE AIRE)	1,975,561	RDR	ET	51,092	42,000	82.2%
37	0	CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SEH	1,100,723	RDR	ET	281,365	221,711	78.8%
38	0	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SEH	295,109	RDR	ET	93,822	35,130	37.4%
39	0	GENERACION DE INFORMACION EN SEH EN CUENCAS DE AMOJÚ Y BOTIJAS	218,000	RDR	ET	18,315	13,195	72.0%
40	0	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MRSE EN ÁMBITOS DE JAÉN Y SAN IGNACIO	365,000	RDR	ET	92,104	63,135	68.5%
41	0	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MRSE EN ÁMBITOS DE JAÉN Y SAN IGNACIO	-	RDR	ET	440	-	0.0%
42	0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	55,000	RDR	ET	-	-	0.0%
43	0	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DEL RIO AMOJÚ PARA PROTEGER ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN LA PELOTA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	203,637	RDR	ET	-	-	0.0%
44	0	CONSTRUCCIÓN DE UN PASE AÉREO DE 100 METROS DE LONGITUD PARA TUBERÍA DE DN 315 MM DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN IGNACIO	522,000	RDR	ET	-	-	0.0%
45	0	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACC	75,000	RDR	ET	-	-	0.0%
46	0	PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	115,000	RDR	ET	73,315	62,517	85.3%

47	0	PCC Y PASS - IMPLEMENTACION PCC S.I.	-	RDR	ET	-	-	0.0%
48	0	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO.	67,500	RDR	ET	-	-	0.0%
49	0	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE AIRE Y PURGA DE LA EPS MARAÑON.	79,194	RDR	ET	-	-	0.0%
50	0	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE LA EPS MARAÑON.	236,250	RDR	ET	42,796	42,796	100.0%
51	0	OPERACIÓN PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN PTAP EN SAN IGNACIO	360,000	RDR	ET	-	-	0.0%
52	0	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 DATTALOGGER EXISTENTES	162,250	RDR	ET	50,842	34,500	67.9%
53	0	OPER. Y MANT. - 04 DATTALOGGER - BELLA.	-	RDR	ET	-	-	0.0%
54	0	CONTINGENCIA PARA COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	216,801	RDR	ET	-	-	0.0%

SEDAM HUANCAYO

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2344695	AMPLIACION Y MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA AZAPAMPA DISTRITO DE CHILCA, PROV. HYO. COMPONENTE ACCION 1.1 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO APOYADO	4,176,681	RDR	ET	1,929,617	1,922,411	99.6%
2	2344695	AMPLIACION Y MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA AZAPAMPA DISTRITO DE CHILCA, PROV. HYO. COMPONENTE ACCION 1.1 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO APOYADO	138,843	RDR	ET	68,200	66,406	97.4%
3	2344695	AMPLIACION Y MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA AZAPAMPA DISTRITO DE CHILCA, PROV. HYO. COMPONENTE ACCION 1.1 CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO APOYADO	6,780	RDR	ET	-	6,780	0.0%
4	2607847	CONSTRUCCION DE LABORATORIO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROV. HUANCAYO I ETAPA	727,511	RDR	NO ET	146,488	747,761	510.5%
5	2607847	CONSTRUCCION DE LABORATORIO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROV. HUANCAYO I ETAPA	82,414	RDR	NO ET	-	79,092	0.0%
6	2045299	MEJ. SISTEMA AGUA POT. HYO. COMP. 1 CONSTRUCCION CAPTACION CHAMISERIA ESTRUCTURA CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO COMPUERTAS METALICAS PARA Q= 300 -1000 L/S	34,729	RDR	NO ET	-	34,729	0.0%
7	2045299	MEJ. SISTEMA AGUA POT. HYO. COMP. 1 CONSTRUCCION CAPTACION CHAMISERIA ESTRUCTURA CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO COMPUERTAS METALICAS PARA Q= 300 -1000 L/S	2,275,524	RDR	NO ET	-	1,797,028	0.0%
8	2045299	MEJ. SISTEMA AGUA POT. HYO. COMP. 1 CONSTRUCCION CAPTACION CHAMISERIA ESTRUCTURA CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO COMPUERTAS METALICAS PARA Q= 300 -1000 L/S	-	RDR	NO ET	-	66,635	0.0%
9	2616304	CONSTRUCCION DE POZO Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y EQUIPO HIDRAULICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO ORCOTUNA, DISTRITO DE ORCOTUNA, PROV. CONCEPCION	34,831	RDR	NO ET	-	34,831	0.0%
10	2616304	CONSTRUCCION DE POZO Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y EQUIPO HIDRAULICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO ORCOTUNA, DISTRITO DE ORCOTUNA, PROV. CONCEPCION	2,180,981	RDR	NO ET	-	972,427	0.0%
11	2616304	CONSTRUCCION DE POZO Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y EQUIPO HIDRAULICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO ORCOTUNA, DISTRITO DE ORCOTUNA, PROV. CONCEPCION	128,678	RDR	NO ET	-	74,390	0.0%
12	2613229	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HYO., PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,111,035	RDR	NO ET	-	717,837	0.0%
13	2611481	CONSTRUCCION DE POZO, ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAN, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2611481 DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,271	RDR	NO ET	-	1,670	0.0%
14	2611481	CONSTRUCCION DE POZO, ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAN, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2611481 DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	RDR	NO ET	-	25,424	0.0%
15	2611481	CONSTRUCCION DE POZO, ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAN, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2611481 DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	RDR	NO ET	-	719,264	0.0%
16	2611481	CONSTRUCCION DE POZO, ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAN, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2611481 DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	RDR	NO ET	-	29,326	0.0%
17	0	CONSTRUCCION RESERVOIRIO TORRE TORRE- PERFORACION Y CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA MERCED COMPONENTE: 19 RESERVOIRIO APOYADO TORRE TORRE V= 2000M3	-	RDR	NO ET	-	428,864	0.0%
18	0	CONSTRUCCION RESERVOIRIO TORRE TORRE- PERFORACION Y CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA MERCED COMPONENTE: 19 RESERVOIRIO APOYADO TORRE TORRE V= 2000M3	-	RDR	NO ET	-	23,305	0.0%
19	2313512	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO TRATAMIENTO AGUA POTABLE AREA METROPOLITANA PROV. HYO., TAMBO Y CHILCA - ADMINISTRACION SEDAM HUANCAYO S.A.	30,267,525	RDR	NO ET	-	10,622,370	0.0%
20	2313512	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO TRATAMIENTO AGUA POTABLE AREA METROPOLITANA PROV. HYO., TAMBO Y CHILCA - ADMINISTRACION SEDAM HUANCAYO S.A.	30,267,525	RDR	NO ET	-	27,940	0.0%
21	0	CONSTRUCCION DE LABORATORIO II SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO	-	DT	NO ET	-	81,526	0.0%
22	0	CONSTRUCCION DE LABORATORIO II SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO	-	RDR	NO ET	-	1,129,487	0.0%
23	0	CONSTRUCCION DE LABORATORIO II SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO	-	RDR	NO ET	-	60,508	0.0%
24	0	RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) JR. CUSCO(TRAMO: JR. HUANCAYO- JR. LA OROYA), JR. JAUJA (TRAMO: CUSCO CARRETERA CENTRAL), PJE. INDEPENDENCIA DEL SISTEMA DEL SECTOR 4 DE LA 3RA JUNTA VECINAL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI N° 2649574	-	RDR	NO ET	-	336,203	0.0%
25	0	RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) JR. CUSCO(TRAMO: JR. HUANCAYO- JR. LA OROYA), JR. JAUJA (TRAMO: CUSCO CARRETERA CENTRAL), PJE. INDEPENDENCIA DEL SISTEMA DEL SECTOR 4 DE LA 3RA JUNTA VECINAL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI N° 2649574	-	RDR	NO ET	-	15,237	0.0%

26	0	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LA RIVERA, DISTRITO DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI N° 2674512	-	RDR	NO ET	-	20,000	0.0%
27	0	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LA RIVERA, DISTRITO DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI N° 2674512	-	RDR	NO ET	-	413,097	0.0%
28	0	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LA RIVERA, DISTRITO DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI N° 2674512	-	RDR	NO ET	-	25,642	0.0%

CALCA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	0	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DATA LOGGERS PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN Y CONTINUIDAD EN LA LOCALIDAD DE CALCA	-	RDR	ET	50,333	48,765	96.9%
2	0	INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN CONEXIONES VEGETATIVAS (516)	-	RDR	ET	17,200	13,570	78.9%
3	0	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	-	RDR	ET	22,300	22,330	100.1%
4	0	ADQUISICIÓN EQUIPOS CELULARES PARA TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES.	-	RDR	ET	10,000	11,511	115.1%
5	0	ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC C-10 UF Ø 160 MM, A Ø 200 Y UNIÓN DE REPARACIÓN PVC, C-10 UF Ø 110 MM, Ø160 MM, Ø 200, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN Y EL RESERVOIRIO.	-	RDR	ET	3,000	-	0.0%
6	0	TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE TUBERÍAS	-	RDR	ET	1,000	-	0.0%
7	0	REPOSICIÓN DE REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	-	RDR	ET	2,828	-	0.0%

YAULI

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	0	MEJORAMIENTO DE LÍNEAS QUE CONDUCE AGUA CRUDA DE LA EPS. EMSAPA YAULI LA OROYA SRL.	39,115	RDR	ET	16,525	16,525	100.0%
2	0	MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE LA EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL.	51,256	RDR	ET	51,526	-	0.0%
3	0	RENOVACIÓN DE 1,081 MICROMEDIDORES DE 1/2" EN LA CIUDAD DE YAULI - LA OROYA. NO INCLUYE CAJAS, MARCOS Y TAPAS.	57,797	RDR	ET	57,797	31,461	54.4%
4	0	IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	67,126	RDR	ET	39,854	29,195	73.3%
5	0	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y PLAN DE ADECUACIÓN SANITARIA (PARTE INVERSIÓN)	48,000	RDR	ET	48,000	-	0.0%
6		RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LA CUENCA DE APOORTE	5,500	RDR	ET	5,500	-	0.0%
7		ADECUADA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS PROVEEDORES DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DE APOORTE	5,000	RDR	ET	5,000	-	0.0%
8		ADECUADA SENSIBILIZACIÓN EN LAS ÁREAS DE APOORTE A CONTRIBUYENTES DEL MRSE	1,000	RDR	ET	1,000	800	80.0%
9		ADECUADA SENSIBILIZACIÓN A RETRIBUYENTES DEL MRSE-H	1,000	RDR	ET	1,000	800	80.0%
10	0	ADECUADO SISTEMA DE MONITOREO HIDROLÓGICO Y DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	5,000	RDR	ET	5,000	2,708	54.2%
11		GESTIÓN DEL PROYECTO MRSE (RRHH, LOGÍSTICA. TÉCNICO EN CAMPO, ETC.)	2,000	RDR	ET	2,000	2,000	100.0%
12	0	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA PISHAJAPUQUIO EN TRAMOS CRÍTICOS	10,000	RDR	ET	5,100	4,900	96.1%

SEDAPAR RIOJA

Nro.	COD_PROY	NOM_PROY	COSTO	FUENTE	ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE	PIM	DEV	%
1	2300467	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE LETICIA, PERLAMAYO, NUEVO ORIENTE, SANTA CLARA, ALTO MICHUCO, BAJO MICHUCO, POLO PUNTA Y SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - RIOJA - SAN MARTIN	2,273,697	DT	NO ET	1,947,346	1,424,823	73.2%
2	2652190	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO ELECTRICIO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	631,524	DT	NO ET	631,524	626,897	99.3%
3	2643961	REMODELACION DE LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) RED DE UTILIZACIÓN TENSIÓN DE 20-22.9 KV, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	500,856	DT	ET	500,856	500,856	100.0%

